

	PROCEDURE OPERATIVE BASE HEMS FOLIGNO– LIAF Aeroporto Foligno-Spoleto “S.Ten.G.Franceschi MOVVM”	17/07/2024	Page 1
		Ed. 1 Rev. 0	

Lavori di realizzazione di eliporto a servizio dell’Elisoccorso regionale umbro

Committente:

Enac - Ente Nazionale per l’Aviazione Civile


Direzione Standardizzazione, Operatività e Sviluppo Aeroportualità Regionale

PROCEDURA OPERATIVA ATTIVITA’ ELICOTTERO Avincis BASE HEMS FOLIGNO – LIAF In vigenza dei lavori di costruzione

EDIZIONE 1 - REVISIONE 0


17/07/2024

Le opere previste consistono nella realizzazione di una FATO illuminata asservita da una TLOF e due bretelle di collegamento al piazzale principale e alla taxiway meglio descritto nell’immagine a seguire

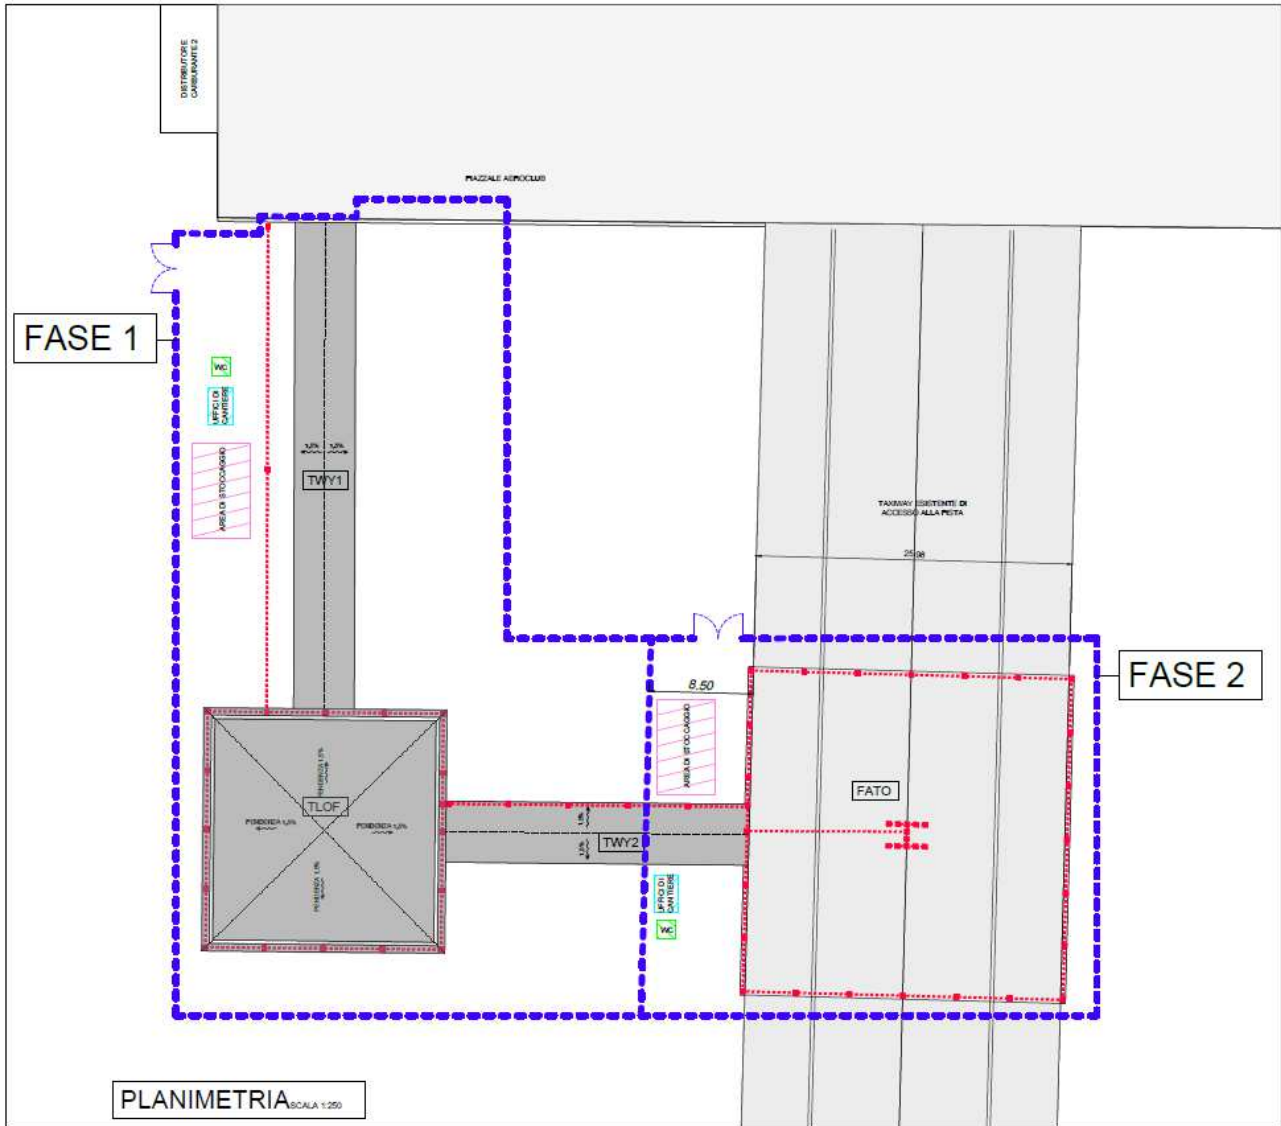

I lavori si effettueranno in n.2 fasi distinte e temporalmente susseguenti.

Le date di lavorazione saranno pubblicate per mezzo Notam

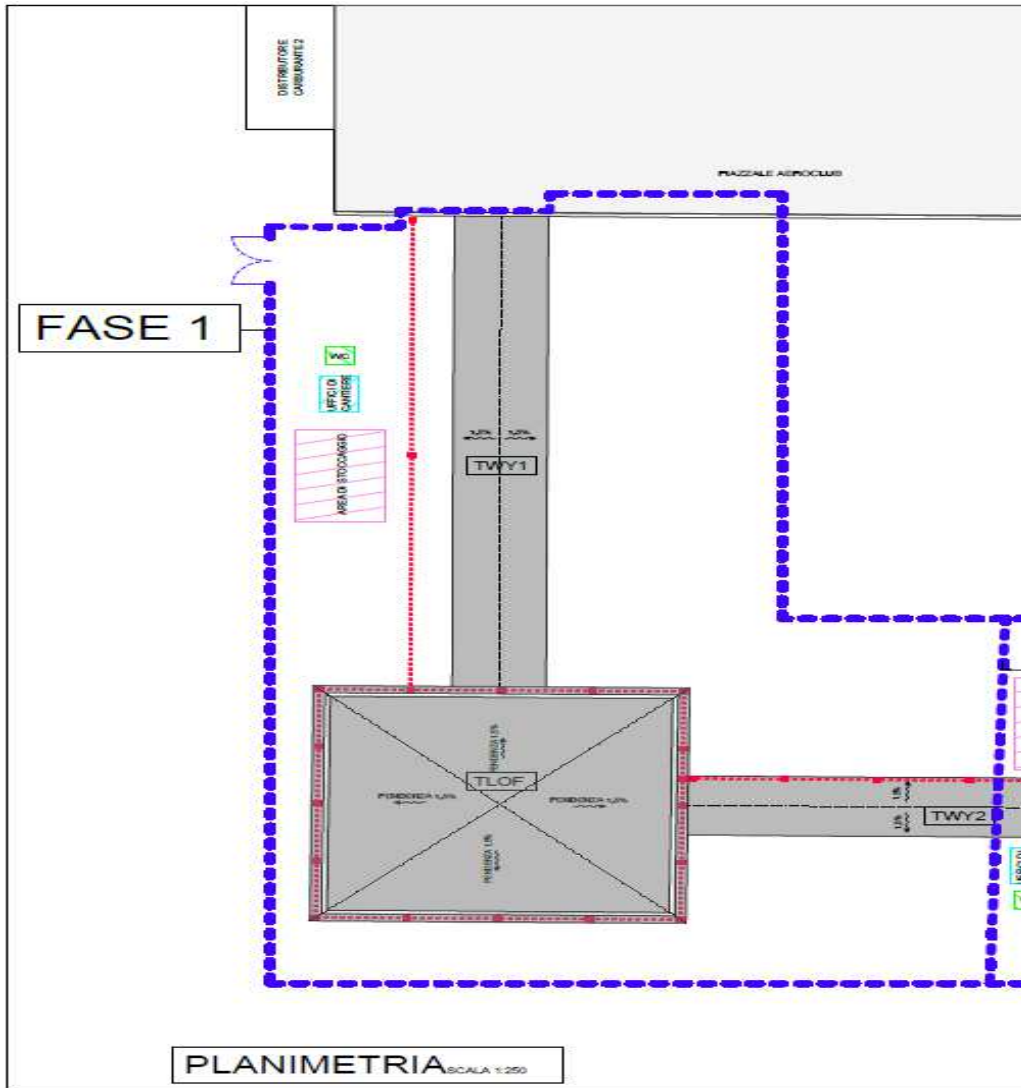

FASE 1

Gli interventi previsti nella Fase 1 consisteranno nella spelicciatura della porzione di terreno dell'area destinata alla TLOF e alle bretelle di collegamento e successiva realizzazione di pavimentazione in c.a.

L'area di cantiere sarà perimetrata con recinzione alta 1.10mt. secondo lo schema sopra rappresentato in colore blu tratteggiato.

La lavorazione comporterà la presenza di personale e mezzi che saranno strettamente confinati all'interno, l'eventuale ricorso a mezzi d'opera che con sviluppi in verticale saranno contenuti allo stretto necessario.

È fatta prescrizione a non abbandonare mai teli, plastiche, vestiario o altro che possa essere sollevato dai flussi del rotore.

	PROCEDURE OPERATIVE BASE HEMS FOLIGNO– LIAF Aeroporto Foligno-Spoleto “S.Ten.G.Franceschi MOVVM”	17/07/2024	Page 4
		Ed. 1 Rev. 0	

Azioni previste

- Il servizio Antincendio della Base Hems fornito da Avincis è incaricato di informare il personale di cantiere dei movimenti dell'elicottero HEMS.
- Il servizio Antincendio del Consorzio per l'Aeroporto di Foligno è incaricato di informare il personale di cantiere delle attività di aeromobili di base e/o di aeromobili esterni a loro conoscenza.
- È responsabilità di ciascun utente aeroportuale di cui al Regolamento di Scalo avvisare il personale di cantiere delle attività di volo proprie del loro istituto.
- Il personale di cantiere interromperà momentaneamente, nelle fasi di involo e atterraggio, ogni attività di scavo e movimentazione di mezzi anche all'interno della zona di cantiere e verificherà che non siano presenti parti leggere che possano essere sollevate dal flusso rotore.
- È prevista l'emissione di un Notam per indicare la presenza di lavori in corso e l'obbligo per aeromobili esterni di prendere visione della Ordinanza Enac 01/2024 e della presente procedura operativa per i lavori di realizzazione di eliporto a servizio dell'Elisoccorso regionale umbro
- È prevista la chiusura della taxiway in erba prospiciente il piazzale di Aviazione Generale e la rimozione dei relativi cinesini in quanto l'area potrebbe essere interessata dalla sosta in stand-by operativo dell'assetto HEMS. In tale area, bordata in giallo nella immagine seguente, è vietata la sosta di ogni altro aeromobile.



Specifiche raccomandazioni riguardanti i lavori di cui alla Fase 2 saranno emesse al termine della Fase 1
