

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

CRONOPROGRAMMA

PROGETTO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	GFMAMGLASOND	GFMAMGLASOND	GFMAMGLASOND	GFMAMGLASOND	GFMAMGLASOND	GFMAMGLASOND	GFMAMGLASOND
<b>INTERVENTI TERMINAL FIUMICINO SUD</b>							
3.1 RIPROTEZIONI PALAZZINE MU E DEMOLIZIONI							
3.2 AEROSTAZIONE T4 E CONNESSIONI T3 / T5							
3.3 T3 - RISTRUTTURAZIONE							
		Lavori Facciata T3	Ristrutt Arrivi T3	Op. prop.			
3.4 SISTEMA AEROSTAZIONI EST							
		Riprotezione CBC / L&F	CBC				
			L&F				
		Lotto 1		Molo e AVC			
					Adeguamenti interni T1		
		Lotto 2					
		Opere propedeutiche e di cucitura	Precond. P.li 200	Piazzali 300	Opere di cucitura		
3.5 CONNESSIONI HBS AREA EST / OVEST							
3.7 AREA DI IMBARCO F E AVANCORPO T3 (EX MOLO C)							
		Area di Imbarco F					
		Avancorpo T3					
		Impianto BHS Molo					
		Impianti di piazzale					
		Opere di completamento					
		Opere propedeutiche e di riprotezione					
		Collegamenti verticali Molo F Single Hub					
3.13 RICONFIGURAZIONE T5 ARRIVI E PARTENZE							
		Prima Fase					
			T1-T2				
		Seconda Fase					
<b>INTERVENTI TERMINAL FIUMICINO NORD</b>							
3.9 FIUMICINO NORD - AEROSTAZIONI PASSEGGERI							
<b>INTERVENTI LAND SIDE FIUMICINO SUD</b>							
4.1 OTTIMIZZAZIONE SISTEMI ED IMPIANTI TECNOLOGICI							
4.3 VIABILITA' - SVINCOLO AREA CARGO CITY							
4.4 PALAZZINA DIREZIONALE NUOVA SEDE ADR							
4.6 PEOPLE MOVER - GRTS							
<b>INTERVENTI LAND SIDE FIUMICINO NORD</b>							
4.8 FIUMICINO NORD - CENTRALI TECNOLOGICHE E UTILITIES							
4.13 FIUMICINO NORD - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE							
4.18 FIUMICINO NORD - OPERE URBANIZZAZIONE ED EDIFICI COMPLEMENTARI							
<b>INTERVENTI PARCHEGGI FIUMICINO SUD</b>							
5.1 PARCHEGGI A RASO AREA EST							
5.2 AREA CENTRALE - PARK MULTIPIANO MODULO F							
5.4 AREA EST - PARK MULTIPIANO MODULO G							
5.8 T5 - VIABILITA' E PARCHEGGI							
<b>ALTRI INTERVENTI</b>							
6.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PISTE DI VOLO NUOVA RETE ELETTRICA							
6.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CABINE AT/MT							
6.1 NUOVO CERIMONIALE DI STATO E RELATIVA VIABILITA'							
6.1 RIQUALIFICA PISTA 16R/34L							
6.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTI ELETTRICI							
6.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTI CONDIZIONAMENTO ED IDRAULICI							
6.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTI ELETTROMECCANICI							
6.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INFRASTRUTTURE CIVILI							
6.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTI SPECIALI E VARIE							
6.2 INTERVENTI PER L'ENERGY SAVING E FONTI ALTERNATIVE							
6.3 SVILUPPO SISTEMI OPERATIVI DI SCALO							
6.3 EVOLUZIONE E RINNOVO TECNOLOGICO INFRASTRUTTURE ICT							
6.3 SVILUPPO SISTEMI GESTIONALI							

= Progettazione
  = Approvazione
  = Appalto
  = Realizzazione
  = Collaudo
  = Espropri
  = Indagini archeologiche


  
 B



AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

CRONOPROGRAMMA

PROGETTO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	GFMAMGLASOND	GFMAMGLASOND	GFMAMGLASOND	GFMAMGLASOND	GFMAMGLASOND	GFMAMGLASOND	GFMAMGLASOND
<b>ATTIVITA' URBANISTICHE FIUMICINO NORD</b>							
1.1 OPERE PROPEDEUTICHE UTILIZZO AREE DI ESPANSIONE FIUMICINO - PRIMA FASE							
1.2 MASTERPLAN + STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE FIUMICINO NORD							
1.4 INDAGINI ARCHEOLOGICHE FIUMICINO NORD							
<b>INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO FIUMICINO SUD</b>							
2.1 AREA OVEST - ISOLA SERAM, NUOVO VARCO DOGANALE							
2.2 AREA OVEST - AMPLIAMENTO PIAZZALI SOSTA AEROMOBILI 1ª FASE							
2.2 AREA OVEST - AMPLIAMENTO PIAZZALI SOSTA AEROMOBILI 2ª FASE							
2.4 ESTENSIONE PIAZZALI ZONA CARGO							
2.5 COMPLETAMENTO RADDOPPIO TWY BRAVO							
	verifiche/autorizzazioni archeologia						
2.6 ESTENSIONE PIAZZALI EX AREA TECNICA AZ							
2.7 RIPROTEZIONE PIAZZOLA PROVA MOTORI							
2.11 ESTENSIONE PIAZZALI IN AREA EST							
2.12 ESTENSIONE PIAZZALI AA/MM IN AREA EX POSTE - QUADRANTE 200							
2.30 PIAZZOLE WIDE BODY IN ZONA 600							
2.31 OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO							
<b>INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO FIUMICINO NORD</b>							
2.23 4ª PISTA - VIA DI RULLAGGIO - RETI PRIMARIE							
2.15 FIUMICINO NORD - RETI IDRAULICHE E TRATTAMENTO ACQUE							
2.17 NUOVA IDROVORA DI FOCENE							

M  
P



AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA	OPERE PROPEDEUTICHE UTILIZZO AREE DI ESPANSIONE FIUMICINO - PRIMA FASE					N° 1.1
P.E.	P.M.	da definire		A.S.	da definire	

ATTIVITA'	2016				2017				2018				2019				2020				2021				2022																																														
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
PREVISTA PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO REALIZZAZIONE COLLAUDI																																																																							
	€ 0	€ 464.813				€ 0				€ 5.547.912				€ 0				€ 5.506.207																																																					

Legenda = Espropri = Progettazione = Approvazione = Appalto = Realizzazione = Collaudi = Indagini

B  
M

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA		MASTERPLAN + STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE FIUMICINO NORD						N° 1.2																																																																													
P.E.		P.M.		PAOLO CAMBULA		A.S.		da definire																																																																													
ATTIVITA'		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022																																																																							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
PREVISTA	PROGETTAZIONE	[Grid pattern]																																																																																			
	APPROVAZIONE													[Blue bar]																																																																							
	APPALTO																																																																																				
	REALIZZAZIONE																																																																																				
	COLLAUDI																																																																																				
		€ 1.300.000				€ 3.841.321				€ 5.579.939				€ 0				€ 0																																																																			

Legenda      [Green] = Espropri      [Grid] = Progettazione      [Blue] = Approvazione      [Yellow] = Appalto      [Red] = Realizzazione      [Vertical Lines] = Collaudi      [Orange] = Indagini

*Handwritten initials/signature*

*Handwritten signature*

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA		INDAGINI ARCHEOLOGICHE FIUMICINO NORD						N° 1.4																																																																											
P.E.		P.M.			da definire			A.S.			da definire																																																																								
ATTIVITA'	2016				2017				2018				2019				2020				2021				2022																																																										
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
PREVISTA	INDAGINI																																																																																		
	PROGETTAZIONE																																																																																		
	APPROVAZIONE																																																																																		
	APPALTO																																																																																		
	REALIZZAZIONE																																																																																		
	COLLAUDI																																																																																		
		€ 0				€ 1.000.000				€ 0				€ 1.684.832				€ 515.916				€ 2.304.081																																																													

Legenda

- = Espropri
- = Progettazione
- = Approvazione
- = Appalto
- = Realizzazione
- = Collaudi
- = Indagini

*Handwritten signature and initials*

*Handwritten signature and initials*

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<b>OPERA</b>		<b>AREA OVEST - ISOLA SERAM, NUOVO VARCO DOGANALE</b>						<b>N° 2.1</b>																																																																																									
<b>P.E.</b>		<b>P.M.</b>		<b>NUNZIO D'AURIA</b>		<b>A.S.</b>		<b>da definire</b>																																																																																									
<b>ATTIVITA'</b>		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022																																																																																			
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>PREVISTA</b>	PROGETTAZIONE	[Grid pattern]																																																																																															
	APPROVAZIONE	[Blue bar]																																																																																															
	APPALTO	[Yellow bar]																																																																																															
	REALIZZAZIONE	[Red bar]																																																																																															
	COLLAUDI	[Vertical lines]																																																																																															
		€ 4.275				€ 4.122.149				€ 5.060.433				€ 0				€ 0				€ 0																																																																											

Legenda    [Green] = Espropri    [Grid] = Progettazione    [Blue] = Approvazione    [Yellow] = Appalto    [Red] = Realizzazione    [Vertical lines] = Collaudi    [Pink] = Indagini

*Handwritten initials*

*Handwritten signature*





AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<b>OPERA</b>		<b>AREA OVEST - AMPLIAMENTO PIAZZALI AEROMOBILI 2<sup>A</sup> FASE</b>						<b>N° 2.2</b>																																																																													
<b>P.E.</b>		<b>P.M.</b>		<b>NUNZIO D'AURIA</b>		<b>A.S.</b>		<b>da definire</b>																																																																													
<b>ATTIVITA'</b>		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022																																																																							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>PREVISTA</b>	PROGETTAZIONE	[Grid pattern]																																																																																			
	APPROVAZIONE					[Blue bar]																																																																															
	APPALTO					[Yellow bar]																																																																															
	REALIZZAZIONE									[Red bar]																																																																											
	COLLAUDI													[Vertical lines]																																																																							
		€ 7.682				€ 6.226.457				€ 18.014.732				€ 0				€ 0				€ 0																																																															

Legenda    [Green] = Espropri    [Grid] = Progettazione    [Blue] = Approvazione    [Yellow] = Appalto    [Red] = Realizzazione    [Vertical lines] = Collaudi    [Pink] = Indagini

*Handwritten initials/signature*

*Handwritten signature*





AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA		COMPLETAMENTO RADDOPPIO BRAVO						N° 2.5																																																															
P.E.		P.M.		NUNZIO D'AURIA		A.S.		da definire																																																															
ATTIVITA'	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022																																																										
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
PREVISTA	PROGETTAZIONE	[Grid pattern]																																																																					
	APPROVAZIONE					[Blue bar]																																																																	
	APPALTO							[Yellow bar]																																																															
	REALIZZAZIONE									[Red bar]																																																													
	COLLAUDI													[Vertical bars]																																																									
INDAGINI	[Orange bar] verifiche/autorizzazioni archeologia																																																																						
		€ 1.689.908		€ 727.407		€ 0		€ 19.215.688		€ 39.965.640		€ 19.950.061																																																											

Legenda

[Green box] = Espropri

[Grid pattern] = Progettazione

[Blue bar] = Approvazione

[Yellow bar] = Appalto

[Red bar] = Realizzazione

[Vertical bars] = Collaudi

[Orange bar] = Indagini

*Handwritten initials*


*Handwritten signature*


AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA	ESTENSIONE PIAZZALI EX AREA TECNICA AZ			N° 2.6
P.E.	P.M.	NUNZIO D'AURIA	A.S.	da definire


ATTIVITA'	2016					2017					2018					2019					2020					2021					2022									
	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M
PROGETTAZIONE																																								
APPROVAZIONE																																								
APPALTO																																								
REALIZZAZIONE																																								
COLLAUDI																																								
INDAGINI																																								
	€ 360.000					€ 0					€ 270.933					€ 1.513.165					€ 6.481.922					€ 7.237.065														


Legenda


 = Espropri


 = Progettazione

 = Approvazione

 = Appalto

 = Realizzazione

 = Collaudi

 = Indagini

Handwritten initials: M, S

Handwritten signature and initials: S





AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA		ESTENSIONE PIAZZALI IN AREA EST						N° 2.11																																																															
P.E.		P.M.		NUNZIO D'AURIA		A.S.		da definire																																																															
ATTIVITA'	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022																																																										
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
PREVISTA	PROGETTAZIONE	[Grid pattern]																																																																					
	APPROVAZIONE													[Blue bar]																																																									
	APPALTO													[Yellow bar]																																																									
	REALIZZAZIONE																	[Red bar]																																																					
	COLLAUDI																	[Vertical lines]																																																					
INDAGINI													[Green bar]				[Orange bar]																																																						
ESPROPRI													[Green bar]																																																										
		€ 1.123.916				€ 432.950				€ 23.362.279				€ 6.931.828				€ 11.572.770				€ 17.260.514																																																	

Legenda

- [Green box] = Espropri
- [Grid pattern] = Progettazione
- [Blue box] = Approvazione
- [Yellow box] = Appalto
- [Red box] = Realizzazione
- [Vertical lines] = Collaudi
- [Orange box] = Indagini

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*





AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA		PIAZZOLE WIDE BODY IN ZONA 600					N° 2.30																																																																
P.E.		P.M.		NUNZIO D'AURIA			A.S.		da definire																																																														
ATTIVITA'	2016			2017			2018			2019			2020			2021			2022																																																				
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
PREVISTA	PROGETTAZIONE				██████████																																																																		
	APPROVAZIONE				██████████																																																																		
	APPALTO							██████████																																																															
	REALIZZAZIONE							██████████																																																															
	COLLAUDI										██████████																																																												
		€ 0			€ 380.000			€ 8.275.995			€ 0			€ 0			€ 0																																																						

Legenda

█ = Espropri

██████ = Progettazione

██████ = Approvazione

██████ = Appalto

██████ = Realizzazione

██████ = Collaudi

██████ = Indagini

*Handwritten initials/signature*

*Handwritten signature*



AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA		4 <sup>A</sup> PISTA - VIA DI RULLAGGIO - RETI PRIMARIE						N° 2.23																																																																													
P.E.		P.M.		PAOLO CAMBULA		A.S.		da definire																																																																													
ATTIVITA'		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022																																																																							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
PREVISTA	PROGETTAZIONE	█		█		█																																																																															
	APPROVAZIONE					█																																																																															
	APPALTO					█																																																																															
	REALIZZAZIONE							█		█		█		█																																																																							
	COLLAUDI																																																																																				
	INDAGINI			█																																																																																	
	ESPROPRI					█		█		█		█																																																																									
		€ 1.020.506		€ 7.617.737		€ 34.426.867		€ 117.864.636		€ 173.547.434		€ 175.031.427																																																																									

Legenda

█ = Espropri

█ = Progettazione

█ = Approvazione

█ = Appalto

█ = Realizzazione

█ = Collaudi

█ = Indagini

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*



AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA		FIUMICINO NORD - RETI IDRAULICHE E TRATTAMENTO ACQUE						N° 2.15																																																															
P.E.		P.M.	da definire			A.S.	da definire																																																																
ATTIVITA'	2016			2017			2018			2019			2020			2021			2022																																																				
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																						
	APPROVAZIONE																																																																						
	APPALTO																																																																						
	REALIZZAZIONE																																																																						
	COLLAUDI																																																																						
	€ 0	€ 0			€ 1.616.800			€ 2.042.221			€ 5.640.900			€ 7.346.677																																																									

Legenda = Espropri = Progettazione = Approvazione = Appalto = Realizzazione = Collaudi = Indagini



AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<b>OPERA</b>		<b>RIPROTEZIONE PALAZZINE MU E DEMOLIZIONI</b>												<b>N° 3.1</b>																																																									
<b>P.E.</b>		<b>P.M.</b>				<b>MARCO IOVACCHINI</b>				<b>A.S.</b>		<b>da definire</b>																																																											
<b>ATTIVITA'</b>	2016			2017			2018			2019			2020			2021			2022																																																				
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
<b>PREVISTA</b>	PROGETTAZIONE																																																																						
	APPROVAZIONE																																																																						
	APPALTO																																																																						
	REALIZZAZIONE																																																																						
	COLLAUDI																																																																						
	€ 0			€ 106.716			€ 751.197			€ 444.513			€ 126.912			€ 7.486.171																																																							

Legenda

= Espropri

= Progettazione

= Approvazione

= Appalto

= Realizzazione

= Collaudi

= Indagini

*to M R*

*Q*

*P*



AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<b>OPERA</b>		<b>AEROSTAZIONE T4 E CONNESSIONI T3 / T5</b>																								<b>N° 3.2</b>																																																									
<b>P.E.</b>		<b>P.M.</b>												<b>MARCO IOVACCHINI</b>						<b>A.S.</b>						<b>da definire</b>																																																									
<b>ATTIVITA'</b>	2016				2017				2018				2019				2020				2021				2022																																																										
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
<b>PREVISTA</b>	PROGETTAZIONE																																																																																		
	APPROVAZIONE																																																																																		
APPALTO																																																																																			
REALIZZAZIONE																																																																																			
COLLAUDI																																																																																			
	€ 0				€ 0				€ 0				€ 856.264				€ 2.023.874				€ 0																																																														

Legenda

= Espropri

= Progettazione

= Approvazione

= Appalto

= Realizzazione

= Collaudi

= Indagini

*Handwritten initials/signature*

*Handwritten signature*

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<b>OPERA</b>		<b>T3 - RISTRUTTURAZIONE</b>						<b>N° 3.3</b>																																																																													
<b>P.E.</b>		<b>P.M.</b>		<b>MARCO IOVACCHINI</b>		<b>A.S.</b>		<b>da definire</b>																																																																													
<b>ATTIVITA'</b>	2016												2017												2018												2019												2020												2021												2022												
	G F M A M G L A S O N D												G F M A M G L A S O N D												G F M A M G L A S O N D												G F M A M G L A S O N D												G F M A M G L A S O N D												G F M A M G L A S O N D												G F M A M G L A S O N D												
<b>PREVISTA</b>	PROGETTAZIONE													[Grid Pattern]																																																																							
	APPROVAZIONE																									[Blue Bar]																																																											
	APPALTO																																					[Yellow Bars]																																															
	REALIZZAZIONE	[Red Bar: Lavori Fasciata T3]												[Red Bar: Ristrutt. Armi T3]																								[Red Bar: Op. proped.]												[Red Bar]																																			
	COLLAUDI																																					[Vertical Lines]																																															
		€ 10.215.380												€ 8.097.354												€ 12.881.319												€ 10.739.574												€ 10.933.327												€ 10.993.336																							

Legenda

[Green Box] = Espropri

[Grid Pattern] = Progettazione

[Blue Bar] = Approvazione

[Yellow Bars] = Appalto

[Red Bar] = Realizzazione

[Vertical Lines] = Collaudi


[Orange Box] = Indagini

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA	SISTEMA AEROSTAZIONI EST				N° 3.4
P.E.	P.M.	MARCO IOVACCHINI	A.S.	da definire	

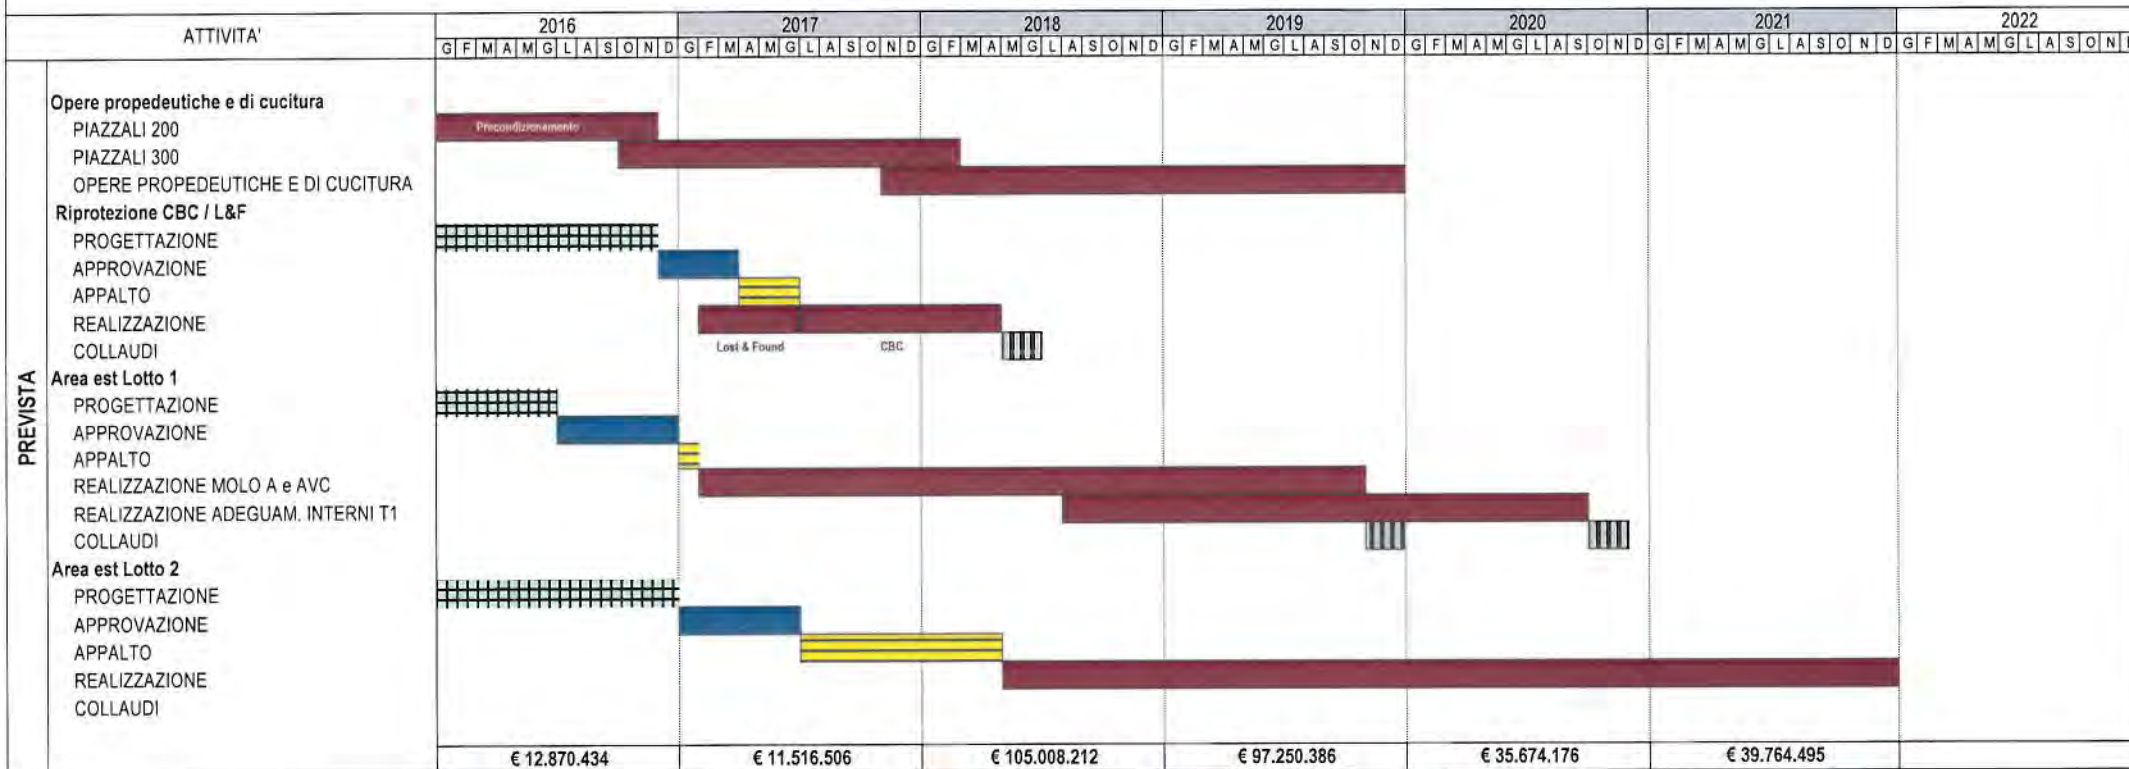

Legenda: [Green] = Espropri, [Grid] = Progettazione, [Blue] = Approvazione, [Yellow] = Appalto, [Red] = Realizzazione, [Vertical Lines] = Collaudi, [Orange] = Indagini

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA		CONNESSIONI HBS AREA EST / OVEST					N° 3.5																																																																												
P.E.		P.M.		GIUSEPPE CUCCHIARI		A.S.		da definire																																																																											
ATTIVITA'	2016			2017			2018			2019			2020			2021			2022																																																																
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																																		
	APPROVAZIONE																																																																																		
	APPALTO																																																																																		
	REALIZZAZIONE																																																																																		
	COLLAUDI																																																																																		
	€ 0	€ 0			€ 0			€ 102.111			€ 738.992			€ 1.369.989																																																																					

Legenda      ■ = Espropri      ■ = Progettazione      ■ = Approvazione      ■ = Appalto      ■ = Realizzazione      ■ = Collaudi      ■ = Indagini

*Handwritten initials/signature*

*Handwritten signature*

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<b>OPERA</b>		<b>AREA IMBARCO F E AVANCORPO T3 (escluse opere minori)</b>						<b>N° 3.7-3.8</b>																																																																													
<b>P.E.</b>		<b>P.M.</b>		<b>MARCO IOVACCHINI</b>		<b>A.S.</b>		<b>DOMENICO MELE</b>																																																																													
<b>ATTIVITA'</b>		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022																																																																							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>PREVISTA</b>	PROGETTAZIONE																																																																																				
	APPROVAZIONE																																																																																				
	APPALTO																																																																																				
	Area Imbarco F	█																																																																																			
	Avancorpo T3	█																																																																																			
	Impianto BHS Molo	█																																																																																			
	COLLAUDI	▣▣▣▣▣▣▣▣																																																																																			
		€ 127.761.144				€ 19.590.532				€ 0				€ 0				€ 0				€ 0																																																															


Legenda      █ = Espropri      ▣▣▣▣ = Progettazione      █ = Approvazione      █ = Appalto      █ = Realizzazione      ▣▣▣▣ = Collaudi      █ = Indagini

*M* *g*

*[Signature]*

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<b>OPERA</b>	<b>AREA IMBARCO F E AVANCORPO T3 - OPERE MINORI</b>				<b>N° 3.7</b>
<b>P.E.</b>	<b>P.M.</b>	<b>M. IOVACCHINI / G. CUCCHIARI</b>	<b>A.S.</b>	<b>DOMENICO MELE</b>	

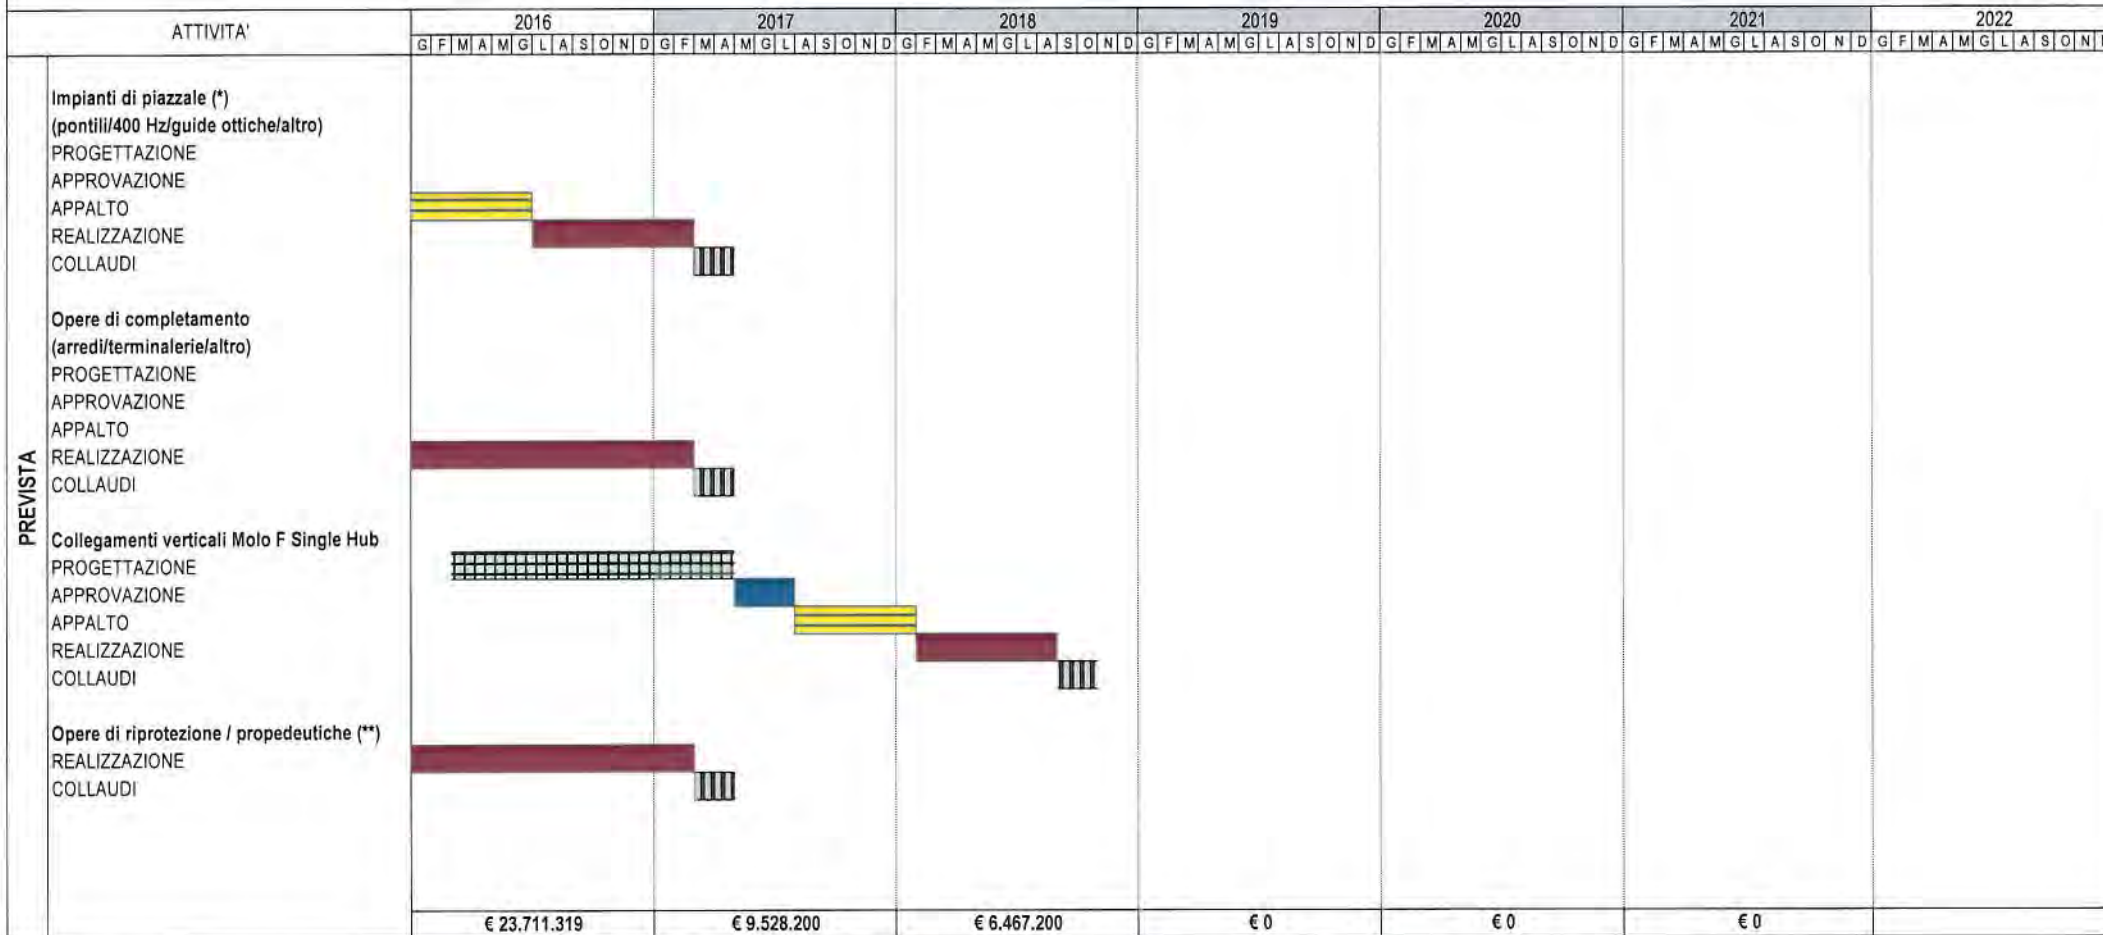

(\*) Il P.M. relativo agli impianti di piazzale è Giuseppe Cucchiari  
(\*\*) Trattasi di interventi da definire in funzione delle esigenze di cantiere

Legenda

[Green box] = Espropri

[Grid pattern] = Progettazione

[Blue box] = Approvazione

[Yellow box] = Appalto

[Red box] = Realizzazione


[Vertical lines] = Collaudi

[Pink box] = Indagini



AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA	RICONFIGURAZIONE T5 ARRIVI E PARTENZE			N° 3.13
P.E.	P.M.	MARCO IOVACCHINI	A.S.	da definire

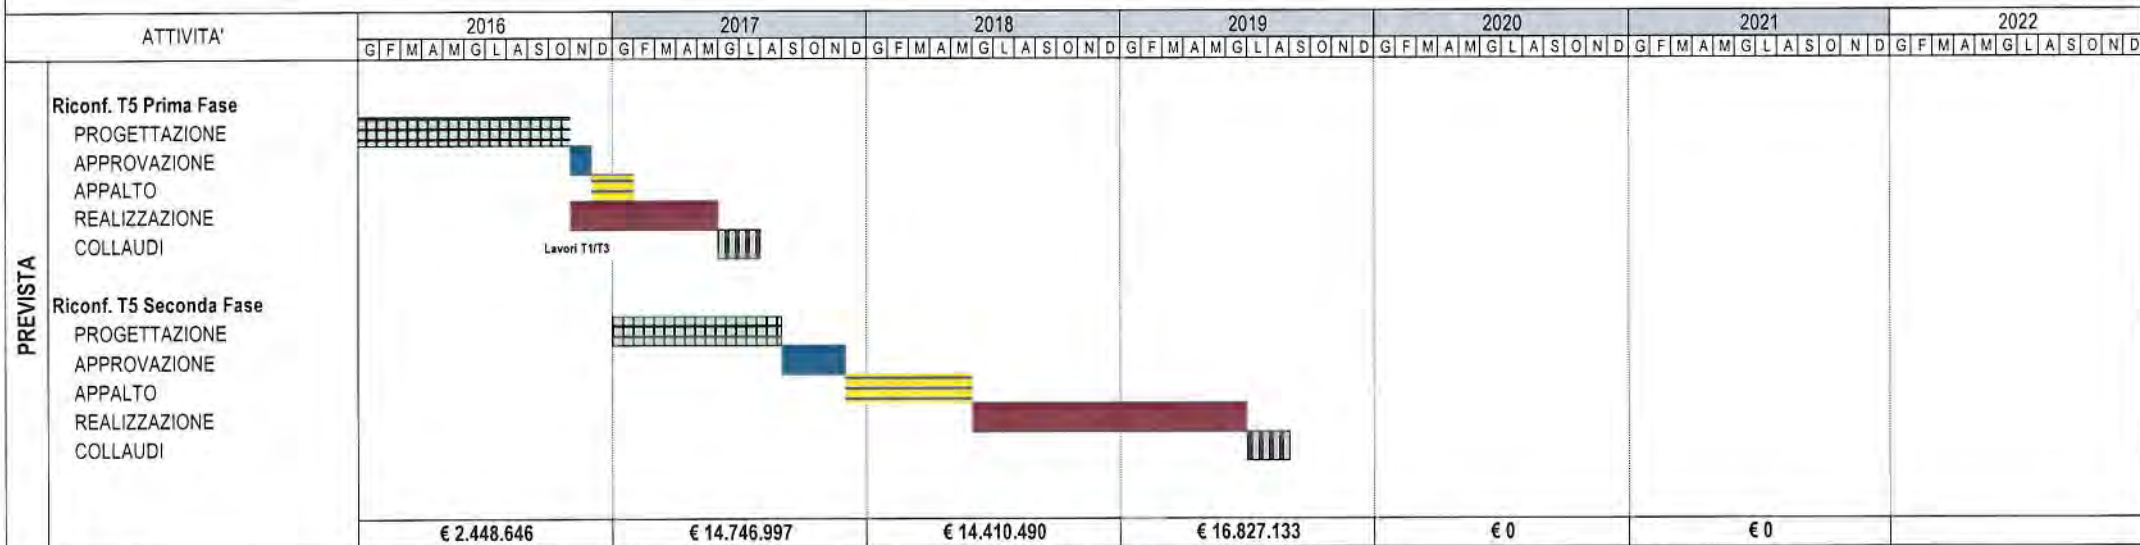

Legenda

- = Espropri
- = Progettazione
- = Approvazione
- = Appalto
- = Realizzazione
- = Collaudi
- = Indagini

*Handwritten initials/signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA	OTTIMIZZAZIONE SISTEMI ED IMPIANTI TECNOLOGICI				N° 4.1
P.E.	P.M.	GIUSEPPE CUCCHIARI	A.S.	da definire	

ATTIVITA'	2016				2017				2018				2019				2020				2021				2022																																														
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
PREVISTA PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO REALIZZAZIONE COLLAUDI																																																																							
	€ 77.244				€ 301.801				€ 1.301.601				€ 0				€ 70.680				€ 1.705.543																																																		

Legenda      = Espropri      = Progettazione      = Approvazione      = Appalto      = Realizzazione      = Collaudi      = Indagini

*B*  
*Lu*

*Lu*



AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA		VIABILITA' - SVINCOLO AREA CARGO CITY					N° 4.3																																																																														
P.E.		P.M.		NUNZIO D'AURIA		A.S.		da definire																																																																													
ATTIVITA'		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022																																																																							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
PREVISTA	PROGETTAZIONE	[Gantt bar: grid pattern from Jan 2016 to Dec 2016]												Il tempo di progettazione è soggetto alle eventuali modifiche che può richiedere il MIT nell'ambito dell'istruttoria ai sensi del DLgs 35/11																																																																							
	APPROVAZIONE	[Gantt bar: blue from Jan 2017 to Mar 2017]																																																																																			
	APPALTO	[Gantt bar: yellow from Apr 2017 to Jun 2017]																																																																																			
	REALIZZAZIONE	[Gantt bar: red from Jul 2017 to Dec 2018]																																																																																			
	COLLAUDI	[Gantt bar: vertical lines from Dec 2018 to Dec 2018]																																																																																			
	INDAGINI	[Gantt bar: orange from Jan 2017 to Mar 2017]																																																																																			
	ESPROPRI	[Gantt bar: green from Jan 2017 to Mar 2017]												Le attività di esproprio potranno subire eventuali scostamenti in funzione della data di stipula della Convenzione MIT/ANAS/ADRENAC																																																																							
		€ 334.854		€ 4.056.529		€ 16.207.886		€ 0		€ 0		€ 0																																																																									

Legenda      [Green Box] = Espropri      [Grid Box] = Progettazione      [Blue Box] = Approvazione      [Yellow Box] = Appalto      [Red Box] = Realizzazione      [Vertical Lines Box] = Collaudi      [Orange Box] = Indagini









AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA	FIUMICINO NORD - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE					N° 4.13
P.E.	P.M.	da definire		A.S.	da definire	

ATTIVITA'	2016			2017			2018			2019			2020			2021			2022																																																				
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
PREVISTA PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO REALIZZAZIONE COLLAUDI																																																																							
	€ 0			€ 240.000			€ 2.455.515			€ 2.787.631			€ 2.141.744			€ 2.163.236																																																							

Legenda

= Espropri

= Progettazione

= Approvazione

= Appalto

= Realizzazione

= Collaudi

= Indagini



AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA		PARCHEGGI A RASO AREA EST												N° 5.1																																																																																			
P.E.		P.M.				NUNZIO D'AURIA				A.S.		da definire																																																																																					
ATTIVITA'		2016			2017			2018			2019			2020			2021			2022																																																																													
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																																																
	APPROVAZIONE																																																																																																
	APPALTO																																																																																																
	REALIZZAZIONE																																																																																																
	COLLAUDI																																																																																																
		€ 0			€ 1.689.863			€ 2.187.871			€ 0			€ 0			€ 0																																																																																

Legenda

= Espropri

= Progettazione

= Approvazione

= Appalto

= Realizzazione

= Collaudi

= Indagini

*Handwritten initials*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<b>OPERA</b>		<b>AREA CENTRALE - PARK MULTIPIANO MODULO "F"</b>												<b>N° 5.2</b>																																													
<b>P.E.</b>		<b>P.M.</b>				<b>ALESSANDRO POLIDORI</b>				<b>A.S.</b>				<b>da definire</b>																																													
<b>ATTIVITA'</b>	2016				2017				2018				2019				2020				2021				2022																																		
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
<b>PREVISTA</b>	PROGETTAZIONE	■				■																																																					
	APPROVAZIONE					■																																																					
	APPALTO					■																																																					
	REALIZZAZIONE									■																																																	
	COLLAUDI													■																																													
INDAGINI					■																																																						
	€ 50.232				€ 221.983				€ 7.341.138				€ 13.509.927				€ 0				€ 0																																						

\* La progettazione potrà subire degli aggiornamenti a causa del potenziamento della stazione RFI

Legenda      ■ = Espropri      ■ = Progettazione      ■ = Approvazione      ■ = Appalto      ■ = Realizzazione      ■ = Collaudi      ■ = Indagini



AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA		AREA CENTRALE - PARK MULTIPIANO MODULO "G"						N° 5.4																																																																											
P.E.		P.M.			ALESSANDRO POLIDORI			A.S.			da definire																																																																								
ATTIVITA'	2016				2017				2018				2019				2020				2021				2022																																																										
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
PREVISTA	PROGETTAZIONE																	■■■■■																																																																	
	APPROVAZIONE																					■■■■■																																																													
	APPALTO																									■■■■■																																																									
	REALIZZAZIONE																									■■■■■																																																									
	COLLAUDI																																																																																		
	INDAGINI																	■■■■■																																																																	
		€ 0				€ 0				€ 0				€ 0				€ 1.381.623				€ 378.734																																																													

Legenda

■ = Espropri

■■■■■ = Progettazione

■■■■■ = Approvazione

■■■■■ = Appalto

■■■■■ = Realizzazione

■■■■■ = Collaudi

■■■■■ = Indagini

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA		MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PISTE DI VOLO NUOVA RETE ELETTRICA						N° 6.1																																																																											
P.E.		P.M.		GIUSEPPE CUCCHIARI		A.S.		EUGENIO DI MARO																																																																											
ATTIVITA'	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022																																																																						
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																																		
	APPROVAZIONE																																																																																		
	APPALTO																																																																																		
	REALIZZAZIONE																																																																																		
	COLLAUDI																																																																																		
		€ 9.005.435		€ 11.385.032		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0																																																																							

Legenda      = Espropri      = Progettazione      = Approvazione      = Appalto      = Realizzazione      = Collaudi      = Indagini

*Handwritten initials*

*Handwritten signature and initials*

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA		MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CABINA AT/MT						N° 6.1																																																																											
P.E.		P.M.		GIUSEPPE CUCCHIARI		A.S.		DANIELE DI CORI																																																																											
ATTIVITA'	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022																																																																						
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																																		
	APPROVAZIONE	■																																																																																	
	APPALTO																																																																																		
	REALIZZAZIONE	■																		▤																																																															
	COLLAUDI																																																																																		
		€ 2.219.508		€ 10.731.796		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0																																																																							

Legenda

■ = Espropri

▤ = Progettazione

■ = Approvazione

▨ = Appalto

■ = Realizzazione

▤ = Collaudi

■ = Indagini

*Handwritten initials/signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<b>OPERA</b>		<b>NUOVO CERIMONIALE DI STATO E RELATIVA VIABILITA'</b>						<b>N° 6.1</b>																																																																																									
<b>P.E.</b>		<b>P.M.</b>		<b>MARCO IOVACCHINI</b>		<b>A.S.</b>		<b>da definire</b>																																																																																									
<b>ATTIVITA'</b>		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022																																																																																			
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>PREVISTA</b>	PROGETTAZIONE																																																																																																
	APPROVAZIONE APPALTO REALIZZAZIONE COLLAUDI																																																																																																
		€ 0		€ 0		€ 0		€ 61.267		€ 528.298		€ 0																																																																																					

Legenda = Espropri = Progettazione = Approvazione = Appalto = Realizzazione = Collaudi = Indagini

*Handwritten initials/signature*

*Handwritten signature*

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA		RIQUALIFICA PISTA 16R/34L												N° 6.1																																																																					
P.E.		P.M.				NUNZIO D'AURIA				A.S.		da definire																																																																							
ATTIVITA'	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022																																																																						
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																																		
	APPROVAZIONE																																																																																		
	APPALTO																																																																																		
	REALIZZAZIONE																																																																																		
	COLLAUDI																																																																																		
		€ 337.000				€ 9.650.000				€ 0		€ 0		€ 0		€ 0																																																																			

Legenda

= Espropri

= Progettazione

= Approvazione

= Appalto

= Realizzazione

= Collaudi

= Indagini


ts  
4 Af

9


AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA


OPERA		MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTI ELETTRICI																																																												N° 6.2																																	
P.E.		P.M.															GIUSEPPE LIISTRO															A.S.															da definire																																																
ATTIVITA'		2016												2017												2018												2019												2020												2021												2022																					
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																																														
	APPROVAZIONE																																																																																														
	APPALTO																																																																																														
	REALIZZAZIONE																																																																																														
	COLLAUDI																																																																																														
		€ 16.860.466												€ 8.034.288												€ 6.924.943												€ 9.605.074												€ 6.163.684												€ 2.618.273																																	


Legenda


 = Espropri


 = Progettazione

 = Approvazione

 = Appalto

 = Realizzazione

 = Collaudi

 = Indagini

*Handwritten initials in blue ink: "M" and "R".*

*Handwritten signature in black ink with a large flourish and the letter "A" below it.*

PIANIFICAZIONE 2017-2021  
SECONDO SOTTOPERIODO REGOLATORIO


Scheda C


AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA


OPERA		MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTI CONDIZIONAMENTO ED IDRAULICI						N° 6.2																																																															
P.E.		P.M.		GIUSEPPE LIISTRO		A.S.		da definire																																																															
ATTIVITA'	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022																																																										
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																						
	APPROVAZIONE																																																																						
	APPALTO																																																																						
	REALIZZAZIONE																																																																						
	COLLAUDI																																																																						
		€ 6.336.431		€ 5.433.153		€ 3.809.900		€ 2.533.162		€ 3.783.853		€ 4.157.818																																																											


Legenda


 = Espropri


 = Progettazione

 = Approvazione

 = Appalto

 = Realizzazione

 = Collaudi

 = Indagini

M  
13  
Rf



11



AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTI ELETTROMECCANICI				N° 6.2
P.E.	P.M.	GIUSEPPE LIISTRO	A.S.	da definire	

ATTIVITA'	2016					2017					2018					2019					2020					2021					2022														
	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M					
PREVISTA PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO REALIZZAZIONE COLLAUDI																																													
	€ 16.766.938					€ 9.416.926					€ 9.333.176					€ 9.507.762					€ 9.615.461					€ 9.137.774																			

Legenda       = Espropri       = Progettazione       = Approvazione       = Appalto       = Realizzazione       = Collaudi       = Indagini

*Handwritten initials/signature*

*Handwritten signature*

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA		MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INFRASTRUTTURE CIVILI						N° 6.2																																																															
P.E.		P.M.		GIUSEPPE LIISTRO		A.S.		da definire																																																															
ATTIVITA'	2016			2017			2018			2019			2020			2021			2022																																																				
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																						
	APPROVAZIONE																																																																						
	APPALTO																																																																						
	REALIZZAZIONE																																																																						
	COLLAUDI																																																																						
		€ 26.863.625			€ 18.963.577			€ 12.531.788			€ 8.949.497			€ 7.895.990			€ 9.614.300																																																						

Legenda       = Espropri       = Progettazione       = Approvazione       = Appalto       = Realizzazione       = Collaudi       = Indagini

*Handwritten initials/signature*

*Handwritten signature*

PIANIFICAZIONE 2017-2021  
SECONDO SOTTOPERIODO REGOLATORIO


Scheda C


AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA


<b>OPERA</b>		<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTI SPECIALI E VARIE</b>						<b>N° 6.2</b>																																																																																									
<b>P.E.</b>		<b>P.M.</b>		<b>GIUSEPPE LIISTRO</b>		<b>A.S.</b>		<b>da definire</b>																																																																																									
<b>ATTIVITA'</b>		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022																																																																																			
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>PREVISTA</b>	PROGETTAZIONE																																																																																																
	APPROVAZIONE																																																																																																
	APPALTO																																																																																																
	REALIZZAZIONE																																																																																																
	COLLAUDI																																																																																																
		€ 3.832.641		€ 4.074.405		€ 2.023.539		€ 6.034.762		€ 4.153.123		€ 4.293.968																																																																																					


Legenda


 = Espropri


 = Progettazione

 = Approvazione

 = Appalto

 = Realizzazione

 = Collaudi

 = Indagini

tb  
M




1


AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA


<b>OPERA</b>		INTERVENTI PER L'ENERGY SAVING E FONTI ALTERNATIVE						N° 6.2																																																																																									
<b>P.E.</b>		<b>P.M.</b>		GIUSEPPE LIISTRO		<b>A.S.</b>		da definire																																																																																									
<b>ATTIVITA'</b>		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022																																																																																			
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>PREVISTA</b>	PROGETTAZIONE																																																																																																
	APPROVAZIONE																																																																																																
	APPALTO																																																																																																
	REALIZZAZIONE																																																																																																
	COLLAUDI																																																																																																
		€ 1.514.199		€ 2.520.386		€ 2.216.071		€ 2.025.516		€ 2.232.884		€ 2.408.812																																																																																					


Legenda


 = Espropri


 = Progettazione

 = Approvazione

 = Appalto

 = Realizzazione

 = Collaudi

 = Indagini

*Handwritten initials*

*Handwritten signature*


*Handwritten mark*





AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA


<b>OPERA</b>		SVILUPPO SISTEMI OPERATIVI DI SCALO: a) e-gates; b) Common self check-in; c) e-passport; d) Sistemi informativi al passeggero (orario voli, tempi consegna bagaglio...)												N° 6.3																																																																							
<b>P.E.</b>		<b>P.M.</b>		ANDREA PONTECORVO				<b>A.S.</b>		da definire																																																																											
<b>ATTIVITA'</b>		2016			2017			2018			2019			2020			2021			2022																																																																	
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>PREVISTA</b>	PROGETTAZIONE																																																																																				
	APPROVAZIONE																																																																																				
	APPALTO																																																																																				
	REALIZZAZIONE																																																																																				
	COLLAUDI																																																																																				
		€ 4.986.993			€ 2.231.490			€ 5.206.035			€ 4.267.922			€ 4.354.464			€ 4.577.886																																																																				


Legenda


 = Espropri


 = Progettazione

 = Approvazione

 = Appalto

 = Realizzazione

 = Collaudi

 = Indagini

*Handwritten initials*


*Handwritten signature*


*Handwritten mark*

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA


<b>OPERA</b>		EVOLUZIONE E RINNOVO TECNOLOGICO INFRASTRUTTURE ICT (reti TLC/Ced/Licenze): a) Contol room ICT; b) Sicurezza informatica; c) Infrastruttura CED c/o Nuova sede ADR; d) Business Continuity												<b>N° 6.3</b>																																																																							
<b>P.E.</b>		<b>P.M.</b>				ANDREA PONTECORVO				<b>A.S.</b>		da definire																																																																									
<b>ATTIVITA'</b>		2016			2017			2018			2019			2020			2021			2022																																																																	
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>PREVISTA</b>	PROGETTAZIONE																																																																																				
	APPROVAZIONE																																																																																				
	APPALTO																																																																																				
	REALIZZAZIONE																																																																																				
	COLLAUDI																																																																																				
		€ 2.412.497			€ 5.218.609			€ 3.334.650			€ 2.026.174			€ 1.527.626			€ 1.625.983																																																																				


Legenda


 = Espropri


 = Progettazione

 = Approvazione

 = Appalto

 = Realizzazione

 = Collaudi

 = Indagini

*M*  
*R*

*Q*

*A*

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<b>OPERA</b>		SVILUPPO SISTEMI GESTIONALI: a) Integrazione e revisione sistemi a supporto dei processi; b) Asset Management; c) Implementazione BIM												N° 6.3																																																																							
<b>P.E.</b>		<b>P.M.</b>				ANDREA PONTECORVO				<b>A.S.</b>		da definire																																																																									
<b>ATTIVITA'</b>		2016			2017			2018			2019			2020			2021			2022																																																																	
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>PREVISTA</b>	PROGETTAZIONE																																																																																				
	APPROVAZIONE																																																																																				
	APPALTO																																																																																				
	REALIZZAZIONE																																																																																				
	COLLAUDI																																																																																				
		€ 2.891.774			€ 2.044.198			€ 252.625			€ 879.911			€ 779.599			€ 841.330																																																																				

Legenda  = Espropri  = Progettazione  = Approvazione  = Appalto  = Realizzazione  = Collaudi  = Indagini

M  
B

h



**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

<b>OPERA:</b>	<b>OPERE PROPEDEUTICHE UTILIZZO AREE DI ESPANSIONE FIUMICINO</b>	<b>N° 1.1</b>
---------------	--	---------------

P.E.		P.M.	da definire	A.S.	da definire
------	--	------	-------------	------	-------------

**SCHEDA PROGETTO**

	DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	Entro il 31/07/2018	Entro il 01/03/2019		Entro il 31/12/2020	Attività prevista per fasi Le date sono riferite alla prima fase
	PRE	DEF	ES		
DATI DI AVANZAMENTO					

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

<b>STANZIAMENTO PREVISTO €</b> <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>37.884.385</b>
---	-------------------

<b>STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €</b>	
--	--

<b>IMPORTO APPALTATO (Lavori)</b>	
-----------------------------------	--

<b>IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)</b>	
--------------------------------------	--

B. M.



**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

**OPERA:**

**MASTERPLAN + STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE FIUMICINO NORD**

**N° 1.2**

P.E.		P.M.	PAOLO CAMBULA		A.S.	da definire	
<b>SCHEDA PROGETTO</b>							
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 30/06/2018	n.a.		n.a.		
	PRE	DEF	ES				
DATI DI AVANZAMENTO							

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

<b>STANZIAMENTO PREVISTO €</b> <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>10.971.260</b>
---	-------------------

<b>STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €</b>	
--	--

<b>IMPORTO APPALTATO (Lavori)</b>	
-----------------------------------	--

<b>IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)</b>	
--------------------------------------	--

B  
 W  
 19



W

**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

<b>OPERA:</b>		<b>INDAGINI ARCHEOLOGICHE FIUMICINO NORD</b>				<b>N° 1.4</b>	
<b>P.E.</b>		<b>P.M.</b>	<b>da definire</b>		<b>A.S.</b>	<b>da definire</b>	
<b>SCHEMA PROGETTO</b>							
		<b>DATA APPROVAZIONE PROGETTO</b>	<b>DATA CONSEGNA LAVORI</b>	<b>AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)</b>	<b>DATA PREV. ULTIMAZIONE</b>	<b>NOTE</b>	
<b>DATI DI PROGETTO (PREVISTI)</b>		<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>		<b>n.a.</b>		
	<b>PRE</b>	<b>DEF</b>	<b>ES</b>				
<b>DATI DI AVANZAMENTO</b>							

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

<b>STANZIAMENTO PREVISTO €</b> <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>10.069.698</b>
---	-------------------

<b>STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €</b>	
--	--

<b>IMPORTO APPALTATO (Lavori)</b>	
-----------------------------------	--

<b>IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)</b>	
--------------------------------------	--

B N<sub>1</sub> P<sub>1</sub>

**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

<b>OPERA:</b>	<b>AREA OVEST - ISOLA SERAM, NUOVO VARCO DOGANALE</b>	<b>N° 2.1</b>
---------------	---	---------------

<b>P.E.</b>		<b>P.M.</b>	<b>NUNZIO D'AURIA</b>	<b>A.S.</b>	<b>da definire</b>
-------------	--	-------------	-----------------------	-------------	--------------------

**SCHEDA PROGETTO**

				<b>DATA APPROVAZIONE PROGETTO</b>	<b>DATA CONSEGNA LAVORI</b>	<b>AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)</b>	<b>DATA PREV. ULTIMAZIONE</b>	<b>NOTE</b>
<b>DATI DI PROGETTO (PREVISTI)</b>				<b>Entro il 31/05/2017</b>	<b>Entro il 01/07/2017</b>		<b>Entro il 30/06/2018</b>	
	<b>PRE</b>	<b>DEF</b>	<b>ES</b>					
<b>DATI DI AVANZAMENTO</b>								

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

<b>STANZIAMENTO PREVISTO €</b> <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>9.690.802</b>
---	------------------

<b>STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €</b>	
--	--

<b>IMPORTO APPALTATO (Lavori)</b>	
-----------------------------------	--

<b>IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)</b>	
--------------------------------------	--



**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

<b>OPERA:</b>	<b>AREA OVEST - AMPLIAMENTO PIAZZALI SOSTA AEROMOBILI 1<sup>A</sup> FASE</b>	<b>N° 2.2</b>
---------------	--	---------------

<b>P.E.</b>		<b>P.M.</b>	<b>NUNZIO D'AURIA</b>	<b>A.S.</b>	<b>da definire</b>
-------------	--	-------------	-----------------------	-------------	--------------------

**SCHEDA PROGETTO**

				<b>DATA APPROVAZIONE PROGETTO</b>	<b>DATA CONSEGNA LAVORI</b>	<b>AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)</b>	<b>DATA PREV. ULTIMAZIONE</b>	<b>NOTE</b>
<b>DATI DI PROGETTO (PREVISTI)</b>				02/12/2015	17/02/2016	31%	Entro il 31/12/2017	
	<b>PRE</b>	<b>DEF</b>	<b>ES</b>					
<b>DATI DI AVANZAMENTO</b>								

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

<b>STANZIAMENTO PREVISTO €</b> <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>30.614.876</b>
---	-------------------

<b>STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €</b>	<b>35.182.313</b>
--	-------------------

<b>IMPORTO APPALTATO (Lavori)</b>	<b>26.033.000</b>
-----------------------------------	-------------------

<b>IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)</b>	<b>PAVIMENTAL</b>
--------------------------------------	-------------------

*Handwritten initials/signature*

*Handwritten signature*



**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

<b>OPERA:</b>	<b>AREA OVEST - AMPLIAMENTO PIAZZALI SOSTA AEROMOBILI 2^ FASE</b>	<b>N° 2.2</b>
---------------	---	---------------

<b>P.E.</b>		<b>P.M.</b>	<b>NUNZIO D'AURIA</b>	<b>A.S.</b>	<b>da definire</b>
-------------	--	-------------	-----------------------	-------------	--------------------

**SCHEDA PROGETTO**

				<b>DATA APPROVAZIONE PROGETTO</b>	<b>DATA CONSEGNA LAVORI</b>	<b>AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)</b>	<b>DATA PREV. ULTIMAZIONE</b>	<b>NOTE</b>
<b>DATI DI PROGETTO (PREVISTI)</b>				Entro il 31/05/2017	Entro il 01/07/2017		Entro il 30/06/2018	
	<b>PRE</b>	<b>DEF</b>	<b>ES</b>					
<b>DATI DI AVANZAMENTO</b>								

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

<b>STANZIAMENTO PREVISTO €</b> <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>26.000.589</b>
---	-------------------

<b>STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €</b>	
--	--

<b>IMPORTO APPALTATO (Lavori)</b>	
-----------------------------------	--

<b>IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)</b>	
--------------------------------------	--

*Handwritten initials/signature*

*Handwritten signature*

**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

<b>OPERA:</b>		<b>ESTENSIONE PIAZZALI ZONA CARGO</b>				<b>N° 2.4</b>	
<b>P.E.</b>		<b>P.M.</b>	<b>NUNZIO D'AURIA</b>		<b>A.S.</b>	<b>da definire</b>	
<b>SCHEDA PROGETTO</b>							
		<b>DATA APPROVAZIONE PROGETTO</b>	<b>DATA CONSEGNA LAVORI</b>	<b>AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)</b>	<b>DATA PREV. ULTIMAZIONE</b>	<b>NOTE</b>	
<b>DATI DI PROGETTO (PREVISTI)</b>		<b>Entro il 31/12/2019</b>	<b>Entro il 01/02/2020</b>		<b>Entro il 30/06/2022</b>		
	<b>PRE</b>	<b>DEF</b>	<b>ES</b>				
<b>DATI DI AVANZAMENTO</b>							

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

<b>STANZIAMENTO PREVISTO €</b> <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>10.570.588</b>
---	-------------------

<b>STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €</b>	
--	--

<b>IMPORTO APPALTATO (Lavori)</b>	
-----------------------------------	--

<b>IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)</b>	
--------------------------------------	--

*Handwritten initials/signature*

*Handwritten signature*

**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

**OPERA:**

**COMPLETAMENTO RADDOPPIO BRAVO**

**N° 2.5**

P.E.		P.M.	NUNZIO D'AURIA		A.S.	da definire	
<b>SCHEDA PROGETTO</b>							
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 30/09/2017	Entro il 01/07/2019		Entro il 30/06/2021		
	PRE	DEF	ES				
DATI DI AVANZAMENTO							

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

<b>STANZIAMENTO PREVISTO €</b> <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>84.590.251</b>
---	-------------------

<b>STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €</b>	
--	--

<b>IMPORTO APPALTATO (Lavori)</b>	
-----------------------------------	--

<b>IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)</b>	
--------------------------------------	--

*Handwritten initials/signature*

*Handwritten signature*



**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

**OPERA:**

**ESTENSIONE PIAZZALI EX AREA TECNICA AZ**

**N° 2.6**

P.E.		P.M.	NUNZIO D'AURIA		A.S.	da definire	
<b>SCHEDA PROGETTO</b>							
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)			DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
			Entro il 30/04/2020	Entro il 01/06/2020		Entro il 31/12/2022	
	PRE	DEF	ES				
DATI DI AVANZAMENTO							

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

<b>STANZIAMENTO PREVISTO €</b> <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>31.444.706</b>
---	-------------------

<b>STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €</b>	
--	--

<b>IMPORTO APPALTATO (Lavori)</b>	
-----------------------------------	--

<b>IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)</b>	
--------------------------------------	--



**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

<b>OPERA:</b>	<b>RIPROTEZIONE PIAZZOLA PROVA MOTORI</b>	<b>N° 2.7</b>
---------------	---	---------------

<b>P.E.</b>		<b>P.M.</b>	<b>NUNZIO D'AURIA</b>	<b>A.S.</b>	<b>da definire</b>
-------------	--	-------------	-----------------------	-------------	--------------------

**SCHEDA PROGETTO**

				<b>DATA APPROVAZIONE PROGETTO</b>	<b>DATA CONSEGNA LAVORI</b>	<b>AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)</b>	<b>DATA PREV. ULTIMAZIONE</b>	<b>NOTE</b>
<b>DATI DI PROGETTO (PREVISTI)</b>				<b>Entro il 30/11/2017</b>	<b>Entro il 01/01/2018</b>		<b>Entro il 31/07/2018</b>	
	<b>PRE</b>	<b>DEF</b>	<b>ES</b>					
<b>DATI DI AVANZAMENTO</b>								

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

<b>STANZIAMENTO PREVISTO €</b> <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>2.029.331</b>
---	------------------

<b>STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €</b>	
--	--

<b>IMPORTO APPALTATO (Lavori)</b>	
-----------------------------------	--

<b>IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)</b>	
--------------------------------------	--

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

<b>OPERA:</b>		<b>ESTENSIONE PIAZZALI IN AREA EST</b>				<b>N° 2.11</b>	
<b>P.E.</b>		<b>P.M.</b>	<b>NUNZIO D'AURIA</b>		<b>A.S.</b>	<b>da definire</b>	
<b>SCHEDA PROGETTO</b>							
		<b>DATA APPROVAZIONE PROGETTO</b>	<b>DATA CONSEGNA LAVORI</b>	<b>AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)</b>	<b>DATA PREV. ULTIMAZIONE</b>	<b>NOTE</b>	
<b>DATI DI PROGETTO (PREVISTI)</b>		<b>Entro il 31/01/2019</b>	<b>Entro il 01/05/2019</b>		<b>Entro il 31/12/2022</b>		
	<b>PRE</b>	<b>DEF</b>	<b>ES</b>				
<b>DATI DI AVANZAMENTO</b>							

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

<b>STANZIAMENTO PREVISTO €</b> <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>100.207.382</b>
---	--------------------

<b>STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €</b>	
--	--

<b>IMPORTO APPALTATO (Lavori)</b>	
-----------------------------------	--

<b>IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)</b>	
--------------------------------------	--

**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

**OPERA:**

**ESTENSIONE PIAZZALI AA/MM IN AREA EX POSTE - QUADRANTE 200**

**N° 2.12**

P.E.		P.M.	NUNZIO D'AURIA		A.S.	da definire	
<b>SCHEDA PROGETTO</b>							
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)			DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
			Entro il 30/11/2019	Entro il 01/01/2020		Entro il 31/10/2021	
	PRE	DEF	ES				
DATI DI AVANZAMENTO							

(\* ) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

<b>STANZIAMENTO PREVISTO €</b> <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>13.386.924</b>
---	-------------------

<b>STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €</b>	
--	--

<b>IMPORTO APPALTATO (Lavori)</b>	
-----------------------------------	--

<b>IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)</b>	
--------------------------------------	--



**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

<b>OPERA:</b>	<b>PIAZZOLE WIDE BODY IN ZONA 600</b>	<b>N° 2.30</b>
---------------	---------------------------------------	----------------

<b>P.E.</b>		<b>P.M.</b>	<b>NUNZIO D'AURIA</b>	<b>A.S.</b>	<b>da definire</b>
-------------	--	-------------	-----------------------	-------------	--------------------

**SCHEDA PROGETTO**

				<b>DATA APPROVAZIONE PROGETTO</b>	<b>DATA CONSEGNA LAVORI</b>	<b>AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)</b>	<b>DATA PREV. ULTIMAZIONE</b>	<b>NOTE</b>
<b>DATI DI PROGETTO (PREVISTI)</b>				<b>Entro il 31/03/2018</b>	<b>Entro il 01/05/2018</b>		<b>Entro il 31/10/2018</b>	
	<b>PRE</b>	<b>DEF</b>	<b>ES</b>					
<b>DATI DI AVANZAMENTO</b>								

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

<b>STANZIAMENTO PREVISTO €</b> <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>8.655.995</b>
---	------------------

<b>STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €</b>	
--	--

<b>IMPORTO APPALTATO (Lavori)</b>	
-----------------------------------	--

<b>IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)</b>	
--------------------------------------	--



**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

**OPERA:**

**OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO**

**N° 2.31**

P.E.		P.M.	NUNZIO D'AURIA		A.S.	da definire	
<b>SCHEDA PROGETTO</b>							
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)			DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
			Entro il 31/11/2016	Entro il 01/01/2017		Entro il 30/09/2018	
	PRE	DEF	ES				
DATI DI AVANZAMENTO							

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

<b>STANZIAMENTO PREVISTO €</b> <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>24.943.866</b>
<b>STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €</b>	
<b>IMPORTO APPALTATO (Lavori)</b>	
<b>IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)</b>	

**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

**OPERA:**

**4<sup>A</sup> PISTA - VIA DI RULLAGGIO - RETI PRIMARIE**

**N° 2.23**

P.E.		P.M.	PAOLO CAMBULA		A.S.	da definire	
<b>SCHEDA PROGETTO</b>							
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 31/08/2018	Entro il 01/10/2018		Entro il 31/12/2021		
	PRE	DEF	ES				
DATI DI AVANZAMENTO							

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...).

<b>STANZIAMENTO PREVISTO €</b> <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>516.583.454</b>
---	--------------------

<b>STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €</b>	
--	--

<b>IMPORTO APPALTATO (Lavori)</b>	
-----------------------------------	--

<b>IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)</b>	
--------------------------------------	--

**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

<b>OPERA:</b>	<b>FIUMICINO NORD - RETI IDRAULICHE E TRATTAMENTO ACQUE</b>	<b>N° 2.15</b>
---------------	---	----------------

P.E.		P.M.	da definire	A.S.	da definire
------	--	------	-------------	------	-------------

**SCHEDA PROGETTO**

	DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	Entro il 31/12/2019	Entro il 01/08/2020		Entro il 31/10/2026	
	PRE	DEF	ES		
DATI DI AVANZAMENTO					

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

<b>STANZIAMENTO PREVISTO €</b> <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>93.532.130</b>
---	-------------------

<b>STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €</b>	
--	--

<b>IMPORTO APPALTATO (Lavori)</b>	
-----------------------------------	--

<b>IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)</b>	
--------------------------------------	--

*Handwritten initials/signature*

*Handwritten signature*



**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

**OPERA:**

**NUOVA IDROVORA DI FOCENE**

**N° 2.17**

P.E.		P.M.	da definire	A.S.	da definire	
<b>SCHEMA PROGETTO</b>						
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
		Entro il 31/05/2019	Entro il 01/12/2019		Entro il 28/02/2021	
	PRE	DEF	ES			
DATI DI AVANZAMENTO						

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

<b>STANZIAMENTO PREVISTO €</b> <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>6.897.993</b>
---	------------------

<b>STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €</b>	
--	--

<b>IMPORTO APPALTATO (Lavori)</b>	
-----------------------------------	--

<b>IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)</b>	
--------------------------------------	--

*Handwritten initials/signature*

*Handwritten signature*



**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

<b>OPERA:</b>	<b>RIPROTEZIONE PALAZZINE MU E DEMOLIZIONI</b>	<b>N° 3.1</b>
---------------	--	---------------

P.E.		P.M.	MARCO IOVACCHINI	A.S.	da definire
------	--	------	------------------	------	-------------

**SCHEDA PROGETTO**

	DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	Entro il 31/12/2019	Entro il 01/01/2021		Entro il 31/03/2023	
	PRE	DEF	ES		
DATI DI AVANZAMENTO					

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

<b>STANZIAMENTO PREVISTO €</b> <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>26.424.952</b>
---	-------------------

<b>STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €</b>	
--	--

<b>IMPORTO APPALTATO (Lavori)</b>	
-----------------------------------	--

<b>IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)</b>	
--------------------------------------	--

**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

<b>OPERA:</b>	<b>AEROSTAZIONE T4 E CONNESSIONI T3 / T5</b>	<b>N° 3.2</b>
---------------	--	---------------

<b>P.E.</b>		<b>P.M.</b>	<b>MARCO IOVACCHINI</b>	<b>A.S.</b>	<b>da definire</b>
-------------	--	-------------	-------------------------	-------------	--------------------

**SCHEDA PROGETTO**

				<b>DATA APPROVAZIONE PROGETTO</b>	<b>DATA CONSEGNA LAVORI</b>	<b>AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)</b>	<b>DATA PREV. ULTIMAZIONE</b>	<b>NOTE</b>
<b>DATI DI PROGETTO (PREVISTI)</b>				<b>Entro il 30/06/2021</b>	<b>Entro il 01/07/2022</b>		<b>Entro il 31/10/2026</b>	
	<b>PRE</b>	<b>DEF</b>	<b>ES</b>					
<b>DATI DI AVANZAMENTO</b>								

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

<b>STANZIAMENTO PREVISTO €</b> <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>74.151.113</b>
---	-------------------

<b>STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €</b>	
--	--

<b>IMPORTO APPALTATO (Lavori)</b>	
-----------------------------------	--

<b>IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)</b>	
--------------------------------------	--

*h*  
*h*  
*h*

*R*  
*14*

**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

**OPERA:**

**T3 - RISTRUTTURAZIONE**

**N° 3.3**

P.E.		P.M.	MARCO IOVACCHINI		A.S.	da definire	
<b>SCHEDA PROGETTO</b>							
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 31/03/2019	Entro il 01/10/2019		Entro il 31/12/2022		
	PRE	DEF	ES				
DATI DI AVANZAMENTO							

(\* ) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

<b>STANZIAMENTO PREVISTO €</b> <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>96.036.854</b>
---	-------------------

<b>STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €</b>	
--	--

<b>IMPORTO APPALTATO (Lavori)</b>	
-----------------------------------	--

<b>IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)</b>	
--------------------------------------	--



**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

SISTEMA AEROSTAZIONI EST

N° 3.4

<b>OPERA:</b>	SISTEMA AEROSTAZIONI EST			
P.E.	P.M.	MARCO IOVACCHINI	A.S.	da definire

**SCHEDA PROGETTO**

Piazzali 300	DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stim. al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
	Entro il 18/07/2016	Entro il 06/10/2016	4%	Entro il 28/02/2018	
	DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				
PRE	DEF	ES			
DATI DI AVANZAMENTO					

Riprotezione CBC / L&F	DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stim. al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
	Entro il 31/01/2017	Entro il 01/02/2017		Entro il 30/04/2018	
	DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				
PRE	DEF	ES			
DATI DI AVANZAMENTO					

Area est Lotto 1	DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stim. al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
	Entro il 31/12/2016	Entro il 01/02/2017		Entro il 31/03/2019 Entro il 30/09/2020	Molo A ed Avanzamento Adeguamenti Interni al T1
	DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				
PRE	DEF	ES			
DATI DI AVANZAMENTO					

Area est Lotto 2	DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stim. al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
	Entro il 30/06/2017	Entro il 01/09/2018		Entro il 31/10/2022	
	DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				
PRE	DEF	ES			
DATI DI AVANZAMENTO					

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

**STANZIAMENTO PREVISTO €** 383.983.547 (Include oneri per l'estensione del Piazzale 200, intervento concluso nel primo sottoperiodo regolatorio)

STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €	
IMPORTO APPALTIATO (Lavori)	
IMPRESA APPALTRICE (Lavori)	

15  
Lr

*[Handwritten signature]*



**PIANIFICAZIONE 2017-2021**
**Scheda D**

SECONDO SOTTOPERIODO REGOLATORIO

**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

<b>OPERA:</b>		<b>CONNESSIONI HBS AREA EST / OVEST</b>			<b>N° 3.5</b>
<b>P.E.</b>		<b>P.M.</b>	<b>GIUSEPPE CUCCHIARI</b>	<b>A.S.</b>	<b>da definire</b>

**SCHEDA PROGETTO**

				<b>DATA APPROVAZIONE PROGETTO</b>	<b>DATA CONSEGNA LAVORI</b>	<b>AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)</b>	<b>DATA PREV. ULTIMAZIONE</b>	<b>NOTE</b>
<b>DATI DI PROGETTO (PREVISTI)</b>				<b>Entro il 31/12/2020</b>	<b>Entro il 01/07/2021</b>		<b>Entro il 30/11/2022</b>	
	<b>PRE</b>	<b>DEF</b>	<b>ES</b>					
<b>DATI DI AVANZAMENTO</b>								

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

<b>STANZIAMENTO PREVISTO €</b> <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>20.679.609</b>
--	-------------------

<b>STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €</b>	
--	--

<b>IMPORTO APPALTATO (Lavori)</b>	
-----------------------------------	--

<b>IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)</b>	
--------------------------------------	--

**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

<b>OPERA:</b>	<b>AREA IMBARCO F E AVANCORPO T3</b>	<b>N° 3.7-3.8</b>
---------------	--------------------------------------	-------------------

<b>P.E.</b>		<b>P.M.</b>	<b>MARCO IOVACCHINI</b>	<b>A.S.</b>	<b>DOMENICO MELE</b>
-------------	--	-------------	-------------------------	-------------	----------------------

**SCHEDA PROGETTO**

DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				DATA APPROVAZIONE PROGETTO (Ultima Fase) (*)	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (**) (stima al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
	PRE	DEF	ES	06/08/2015	12/03/2008	95%	Entro il 31/12/2016 Entro il 28/02/2017	La prima data si riferisce all'Avancorpo ed al BHS La seconda data si riferisce all'Area di Imbarco F
DATI DI AVANZAMENTO								

(\*) La data di approvazione dell'ultima fase di progettazione fa riferimento alla Perizia n° 3 Fase 3-4. La Perizia n° 4 è stata inviata ad ENAC in data 16-06-2016  
 (\*\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)  
 (\*\*\*) L'importo fa riferimento allo stanziamento autorizzato con dispositivo ENAC 85010/CIA del 6/8/15, relativo alla Perizia 3 fase 3-4, al netto di 14.200.000 € di oneri per anticipata esecuzione dei lavori  
 (\*\*\*\*) L'importo appaltato è riferito alla Perizia 4 trasmessa ad ENAC in data 15-09-2016.

<b>STANZIAMENTO PREVISTO €</b> <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>389.835.799</b>
<b>STANZIAMENTO AUTORIZZATO (***) (Lavori) €</b>	<b>284.980.001</b>
<b>IMPORTO APPALTATO (****) (Appalto principale - Lavori)</b>	<b>307.294.245</b>
<b>IMPRESA APPALTATRICE (Appalto principale - Lavori)</b>	<b>ATI Cimolai</b>

*h2 h4 70* *h2*

**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

<b>OPERA:</b>	<b>RICONFIGURAZIONE T5 ARRIVI E PARTENZE</b>	<b>N° 3.13</b>
---------------	--	----------------

<b>P.E.</b>		<b>P.M.</b>	<b>MARCO IOVACCHINI</b>	<b>A.S.</b>	<b>da definire</b>
-------------	--	-------------	-------------------------	-------------	--------------------

**SCHEDA PROGETTO**

				<b>DATA APPROVAZIONE PROGETTO</b>	<b>DATA CONSEGNA LAVORI</b>	<b>AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)</b>	<b>DATA PREV. ULTIMAZIONE</b>	<b>NOTE</b>
<b>DATI DI PROGETTO (PREVISTI)</b>				Entro il 30/11/2016 Entro il 30/11/2017	Entro il 01/02/2017 Entro il 01/06/2018		Entro il 31/05/2017 Entro il 30/06/2019	Prima fase (riqualifica per voli P2P) Seconda fase (ampliamento)
	<b>PRE</b>	<b>DEF</b>	<b>ES</b>					
<b>DATI DI AVANZAMENTO</b>								

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

<b>STANZIAMENTO PREVISTO €</b> <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>49.174.973</b>
---	-------------------

<b>STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €</b>	
--	--

<b>IMPORTO APPALTATO (Lavori)</b>	
-----------------------------------	--

<b>IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)</b>	
--------------------------------------	--

13 M AN

M



**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

<b>OPERA:</b>	<b>FIUMICINO NORD - AEROSTAZIONI PASSEGGERI</b>	<b>N° 3.9</b>
---------------	---	---------------

P.E.		P.M.	da definire	A.S.	da definire
------	--	------	-------------	------	-------------

**SCHEDA PROGETTO**

	DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	Entro il 31/12/2020 Entro il 30/06/2028	Entro il 01/01/2022 Entro il 01/07/2029		Entro il 31/03/2028 Entro il 31/03/2035	Prima Fase Seconda Fase
	PRE	DEF	ES		
DATI DI AVANZAMENTO					

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

<b>STANZIAMENTO PREVISTO €</b> <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>1.940.318.130</b>
---	----------------------

<b>STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €</b>	
--	--

<b>IMPORTO APPALTATO (Lavori)</b>	
-----------------------------------	--

<b>IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)</b>	
--------------------------------------	--

B *M* *Ag*

*M*

**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

**OPERA:**

**OTTIMIZZAZIONE SISTEMI ED IMPIANTI TECNOLOGICI**

**N° 4.1**

P.E.		P.M.	GIUSEPPE CUCCHIARI	A.S.	da definire
------	--	------	--------------------	------	-------------

**SCHEDA PROGETTO**

DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
				Entro il 31/07/2017	Entro il 01/11/2017		Entro il 31/07/2018	Attività prevista per fasi Le date sono riferite alla prima fase
	PRE	DEF	ES					
DATI DI AVANZAMENTO								

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

<b>STANZIAMENTO PREVISTO €</b> <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>10.481.091</b>
---	-------------------

<b>STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €</b>	
--	--

<b>IMPORTO APPALTATO (Lavori)</b>	
-----------------------------------	--

<b>IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)</b>	
--------------------------------------	--

*h m p*

*Q*

**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

OPERA:

**VIABILITA' - SVINCOLO AREA CARGO CITY**

**N° 4.3**

P.E.		P.M.	NUNZIO D'AURIA		A.S.	da definire	
<b>SCHEDA PROGETTO</b>							
			DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)			Entro il 30/04/2017	Entro il 01/08/2017		Entro il 31/07/2018	
	PRE	DEF	ES				
DATI DI AVANZAMENTO							

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

<b>STANZIAMENTO PREVISTO €</b> <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>21.546.094</b>
---	-------------------

<b>STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €</b>	
--	--

<b>IMPORTO APPALTATO (Lavori)</b>	
-----------------------------------	--

<b>IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)</b>	
--------------------------------------	--

h  
M 9



**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

**OPERA:**

**PALAZZINA DIREZIONALE - NUOVA SEDE ADR**

**N° 4.4**

P.E.

P.M.

ALESSANDRO POLIDORI

A.S.

EZIO MADDALON

**SCHEDA PROGETTO**

DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
				30/06/2015	22/10/2015	60%	Entro il 31/03/2017	
	PRE	DEF	ES					
DATI DI AVANZAMENTO								

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

<b>STANZIAMENTO PREVISTO €</b> <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>14.249.757</b>
---	-------------------

<b>STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €</b>	<b>12.236.914</b>
--	-------------------

<b>IMPORTO APPALTATO (Lavori)</b>	<b>9.450.505</b>
-----------------------------------	------------------

<b>IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)</b>	<b>Sertech</b>
--------------------------------------	----------------

13

**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

**OPERA:**

**PEOPLE MOVER**

**N° 4.6**

P.E.		P.M.	GIUSEPPE CUCCHIARI		A.S.	da definire	
<b>SCHEDA PROGETTO</b>							
			DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)			Entro il 31/07/2024	Entro il 01/09/2024		Entro il 31/05/2028	
	PRE	DEF	ES				
DATI DI AVANZAMENTO							

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

STANZIAMENTO PREVISTO € <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>627.574.519</b>
--	--------------------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €	
-------------------------------------	--

IMPORTO APPALTATO (Lavori)	
----------------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)	
-------------------------------	--

13

**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

**OPERA:**

**FIUMICINO NORD - CENTRALI TECNOLOGICHE E UTILITIES**

**N° 4.8**

P.E.		P.M.	da definire	A.S.	da definire	
<b>SCHEDA PROGETTO</b>						
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 31/07/2021	Entro il 01/03/2022		Entro il 31/12/2024	Attività prevista per fasi Le date sono riferite alla prima fase
	PRE	DEF	ES			
DATI DI AVANZAMENTO						

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

**STANZIAMENTO PREVISTO €**  
(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)

**391.037.708**

**STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €**

**IMPORTO APPALTATO (Lavori)**

**IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)**

B M AT

A



**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

**OPERA:**

**FIUMICINO NORD - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE**

**N° 4.13**

P.E.		P.M.	da definire	A.S.	da definire	
<b>SCHEDA PROGETTO</b>						
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
		Entro il 30/08/2019	Entro il 01/01/2020		Entro il 31/12/2030	
	PRE	DEF	ES			
DATI DI AVANZAMENTO						

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

<b>STANZIAMENTO PREVISTO €</b> <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>145.342.109</b>
---	--------------------

<b>STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €</b>	
--	--

<b>IMPORTO APPALTATO (Lavori)</b>	
-----------------------------------	--

<b>IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)</b>	
--------------------------------------	--

ts  
M  
MP

n

**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

**OPERA: FIUMICINO NORD - OPERE URBANIZZAZIONE ED EDIFICI COMPLEMENTARI**

**N° 4.18**

P.E.		P.M.	da definire	A.S.	da definire	
<b>SCHEDA PROGETTO</b>						
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 31/07/2022	Entro il 01/03/2022		Entro il 31/12/2026	Attività prevista per fasi Le date sono riferite alla prima fase
	PRE	DEF	ES			
DATI DI AVANZAMENTO						

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

<b>STANZIAMENTO PREVISTO €</b> <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>197.259.397</b>
---	--------------------

<b>STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €</b>	
--	--

<b>IMPORTO APPALTATO (Lavori)</b>	
-----------------------------------	--

<b>IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)</b>	
--------------------------------------	--

13

A

**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

**OPERA:**

**PARCHEGGI A RASO AREA EST**

**N° 5.1**

P.E.

P.M.

NUNZIO D'AURIA

A.S.

da definire

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il 31/07/2017	Entro il 01/09/2017		Entro il 31/05/2018	
	PRE	DEF	ES					
DATI DI AVANZAMENTO								

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

**STANZIAMENTO PREVISTO €**  
(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)

**4.641.161**

**STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €**

**IMPORTO APPALTATO (Lavori)**

**IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)**

ks  
 L  
 gr

A



**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

<b>OPERA:</b>	<b>AREA CENTRALE - PARK MULTIPIANO MODULO "F"</b>	<b>N° 5.2</b>
---------------	---	---------------

<b>P.E.</b>		<b>P.M.</b>	<b>ALESSANDRO POLIDORI</b>	<b>A.S.</b>	<b>da definire</b>
-------------	--	-------------	----------------------------	-------------	--------------------

**SCHEDA PROGETTO**

				<b>DATA APPROVAZIONE PROGETTO</b>	<b>DATA CONSEGNA LAVORI</b>	<b>AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)</b>	<b>DATA PREV. ULTIMAZIONE</b>	<b>NOTE</b>
<b>DATI DI PROGETTO (PREVISTI)</b>				<b>Entro il 30/06/2017</b>	<b>Entro il 01/01/2018</b>		<b>Entro il 30/09/2019</b>	
	<b>PRE</b>	<b>DEF</b>	<b>ES</b>					
<b>DATI DI AVANZAMENTO</b>								

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

<b>STANZIAMENTO PREVISTO €</b> <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>21.969.037</b>
---	-------------------

<b>STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €</b>	
--	--

<b>IMPORTO APPALTATO (Lavori)</b>	
-----------------------------------	--

<b>IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)</b>	
--------------------------------------	--

*Handwritten initials/signature*

*Handwritten signature*

**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

**OPERA:**

**AREA CENTRALE - PARK MULTIPIANO MODULO "G"**

**N° 5.4**

P.E.		P.M.	ALESSANDRO POLIDORI		A.S.	da definire
<b>SCHEDA PROGETTO</b>						
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
		Entro il 30/06/2021	Entro il 01/12/2021		Entro il 30/09/2023	
	PRE	DEF	ES			
DATI DI AVANZAMENTO						

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

<b>STANZIAMENTO PREVISTO €</b> <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>17.585.177</b>
---	-------------------

<b>STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €</b>	
--	--

<b>IMPORTO APPALTATO (Lavori)</b>	
-----------------------------------	--

<b>IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)</b>	
--------------------------------------	--

13  
M  
FD



**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

**OPERA:**

**T5 - VIABILITA' E PARCHEGGI**

**N° 5.8**

P.E.		P.M.	da definire	A.S.	da definire	
<b>SCHEDA PROGETTO</b>						
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 28/02/2018	Entro il 01/09/2018		Entro il 31/05/2019	
	PRE	DEF	ES			
DATI DI AVANZAMENTO						

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

STANZIAMENTO PREVISTO € <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>8.253.738</b>
--	------------------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €	
-------------------------------------	--

IMPORTO APPALTATO (Lavori)	
----------------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)	
-------------------------------	--

ts M 





**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

**OPERA:** **MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PISTE DI VOLO NUOVA RETE ELETTRICA** **N° 6.1**

**P.E.** **P.M.** **GIUSEPPE CUCCHIARI** **A.S.** **EUGENIO DI MARO**

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				28/11/2014	06/09/2015	45%	Entro il 31/10/2017	
	PRE	DEF	ES					
DATI DI AVANZAMENTO								

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

<b>STANZIAMENTO PREVISTO €</b> <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>22.018.076</b>
---	-------------------

<b>STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €</b>	<b>30.030.000</b>
--	-------------------

<b>IMPORTO APPALTATO (Lavori)</b>	<b>18.809.021</b>
-----------------------------------	-------------------

<b>IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)</b>	<b>GEMMO</b>
--------------------------------------	--------------

*Handwritten initials*

*Handwritten signature*

**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

**OPERA:**

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CABINA AT/MT**

**N° 6.1**

P.E.

P.M.

GIUSEPPE CUCCHIARI

A.S.

DANIELE DI CORI

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				19/01/2016	22/01/2016	19%	Entro il 30/09/2017	Appalto integrato
	PRE	DEF	ES					
DATI DI AVANZAMENTO								

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

<b>STANZIAMENTO PREVISTO €</b> <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>13.370.737</b>
---	-------------------

<b>STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €</b>	<b>12.078.458</b>
--	-------------------

<b>IMPORTO APPALTATO (Lavori)</b>	<b>12.078.458</b>
-----------------------------------	-------------------

<b>IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)</b>	<b>CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI</b>
--------------------------------------	---

**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

<b>OPERA:</b>	<b>NUOVO CERIMONIALE DI STATO E RELATIVA VIABILITA'</b>	<b>N° 6.1</b>
---------------	---	---------------

P.E.		P.M.	MARCO IOVACCHINI	A.S.	da definire
------	--	------	------------------	------	-------------

**SCHEDA PROGETTO**

	DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	Entro il 31/03/2021	Entro il 01/04/2022		Entro il 31/12/2024	
	PRE	DEF	ES		
DATI DI AVANZAMENTO					

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

STANZIAMENTO PREVISTO € <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>9.687.402</b>
--	------------------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €	
-------------------------------------	--

IMPORTO APPALTATO (Lavori)	
----------------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)	
-------------------------------	--






**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

<b>OPERA:</b>		<b>RIQUALIFICA PISTA 16R/34L</b>				<b>N° 6.1</b>
<b>P.E.</b>		<b>P.M.</b>	<b>NUNZIO D'AURIA</b>		<b>A.S.</b>	<b>da definire</b>
<b>SCHEDA PROGETTO</b>						
		<b>DATA APPROVAZIONE PROGETTO</b>	<b>DATA CONSEGNA LAVORI</b>	<b>AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)</b>	<b>DATA PREV. ULTIMAZIONE</b>	<b>NOTE</b>
<b>DATI DI PROGETTO (PREVISTI)</b>		<b>Entro il 30/11/2016</b>	<b>Entro il 15/01/2017</b>		<b>Entro il 28/02/2017</b>	
	<b>PRE</b>	<b>DEF</b>	<b>ES</b>			
<b>DATI DI AVANZAMENTO</b>						

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

<b>STANZIAMENTO PREVISTO €</b> <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>9.987.000</b>
---	------------------

<b>STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €</b>	
--	--

<b>IMPORTO APPALTATO (Lavori)</b>	
-----------------------------------	--

<b>IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)</b>	
--------------------------------------	--

*M*

*[Signature]*

*M*

**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

**OPERA:**

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTI ELETTRICI**

**N° 6.2**

P.E.		P.M.	GIUSEPPE LIISTRO		A.S.	da definire	
<b>SCHEDA PROGETTO</b>							
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		n.a.	n.a.		n.a.	Il piano di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e relative reti prevede principalmente la sostituzione di tutte quelle parti di impianto strategiche a garantire una adeguata affidabilità ed efficienza del sistema elettrico aeroportuale.	
	PRE	DEF	ES				
DATI DI AVANZAMENTO							

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

<b>STANZIAMENTO PREVISTO 2017-2021 €</b> <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>33.346.262</b>
---	-------------------

<b>STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €</b>	
--	--

<b>IMPORTO APPALTATO (Lavori)</b>	
-----------------------------------	--

<b>IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)</b>	
--------------------------------------	--

μ

B m m

**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

<b>OPERA:</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTI CONDIZIONAMENTO ED IDRAULICI</b>	<b>N° 6.2</b>
---------------	---	---------------

<b>P.E.</b>		<b>P.M.</b>	<b>GIUSEPPE LIISTRO</b>	<b>A.S.</b>	<b>da definire</b>
-------------	--	-------------	-------------------------	-------------	--------------------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				n.a.	n.a.		n.a.	Manutenzione straordinaria e nuove realizzazioni sulle varie reti idrauliche atte a migliorare la qualità e disponibilità dell'acqua industriale e potabile, antincendio e scarichi; manutenzioni e ristrutturazioni degli impianti di condizionamento per migliorare il comfort ambientale dei clienti aeroportuali.
	PRE	DEF	ES					
DATI DI AVANZAMENTO								

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

<b>STANZIAMENTO PREVISTO 2017-2021 €</b> <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>19.717.885</b>
---	-------------------

<b>STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €</b>	
--	--

<b>IMPORTO APPALTATO (Lavori)</b>	
-----------------------------------	--

<b>IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)</b>	
--------------------------------------	--

B3 An

A



**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

**OPERA:**

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTI ELETTROMECCANICI**

**N° 6.2**

P.E.		P.M.	GIUSEPPE LIISTRO	A.S.	da definire
------	--	------	------------------	------	-------------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				n.a.	n.a.		n.a.	Interventi di modifica e sostituzione di impianti quali: trattamento dei bagagli, pontili d'imbarco, scale e tappeti mobili, elevatori, rulliere motorizzate, portoni, barriere automatiche; questo al fine di ottimizzare il servizio ai passeggeri ed alle compagnie aeree.
				PRE	DEF	ES		
DATI DI AVANZAMENTO								

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

<b>STANZIAMENTO PREVISTO 2017-2021 €</b> <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>47.011.100</b>
---	-------------------

<b>STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €</b>	
--	--

<b>IMPORTO APPALTATO (Lavori)</b>	
-----------------------------------	--

<b>IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)</b>	
--------------------------------------	--

13 M AP

1

**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

<b>OPERA:</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INFRASTRUTTURE CIVILI</b>	<b>N° 6.2</b>
---------------	---	---------------

<b>P.E.</b>		<b>P.M.</b>	<b>GIUSEPPE LIISTRO</b>	<b>A.S.</b>	<b>da definire</b>
-------------	--	-------------	-------------------------	-------------	--------------------

**SCHEDA PROGETTO**

				<b>DATA APPROVAZIONE PROGETTO</b>	<b>DATA CONSEGNA LAVORI</b>	<b>AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)</b>	<b>DATA PREV. ULTIMAZIONE</b>	<b>NOTE</b>
<b>DATI DI PROGETTO (PREVISTI)</b>				n.a.	n.a.		n.a.	Ristrutturazioni architettoniche e riqualifica di natura civile degli edifici, al fine di rendere gli ambienti più gradevoli per i passeggeri e per gli utenti; interventi mirati a ridurre drasticamente i fenomeni di infiltrazioni da acqua piovana.
	<b>PRE</b>	<b>DEF</b>	<b>ES</b>					
<b>DATI DI AVANZAMENTO</b>								

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

<b>STANZIAMENTO PREVISTO 2017-2021 €</b> <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>57.955.153</b>
---	-------------------

<b>STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €</b>	
--	--

<b>IMPORTO APPALTATO (Lavori)</b>	
-----------------------------------	--

<b>IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)</b>	
--------------------------------------	--

*h* *M* *sp*

*11*

**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

**OPERA:**

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTI SPECIALI E VARIE**

**N° 6.2**

P.E.		P.M.	GIUSEPPE LIISTRO		A.S.	da definire
<b>SCHEDA PROGETTO</b>						
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
		n.a.	n.a.		n.a.	Iniziativa mirata alla manutenzione straordinaria degli impianti speciali quali: sistema controllo accessi, TVCC, sistemi antincendio, volte a garantire la continuità di esercizio di un'infrastruttura tecnologicamente robusta e solida con elevati livelli di servizio, di sicurezza ed efficacia operativa.
		PRE	DEF	ES		
DATI DI AVANZAMENTO						


(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

<b>STANZIAMENTO PREVISTO 2017-2021 €</b> <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>20.579.797</b>
---	-------------------

<b>STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €</b>	
--	--

<b>IMPORTO APPALTATO (Lavori)</b>	
-----------------------------------	--

<b>IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)</b>	
--------------------------------------	--

13 



12



**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

<b>OPERA:</b>	<b>INTERVENTI PER L'ENERGY SAVING E FONTI ALTERNATIVE</b>	<b>N° 6.2</b>
---------------	---	---------------

P.E.		P.M.	GIUSEPPE LIISTRO	A.S.	da definire
------	--	------	------------------	------	-------------

**SCHEDA PROGETTO**

	DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	n.a.	n.a.		n.a.	Adozione di sistemi di risparmio energetico e realizzazione di fonti di energia alterantiva al fine di diminuire gli impatti ambientali.
	PRE	DEF	ES		
DATI DI AVANZAMENTO					

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

<b>STANZIAMENTO PREVISTO 2017-2021 €</b> <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>11.403.670</b>
---	-------------------

<b>STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €</b>	
--	--

<b>IMPORTO APPALTATO (Lavori)</b>	
-----------------------------------	--

<b>IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)</b>	
--------------------------------------	--

73 M MP

M

**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

<b>OPERA:</b>		<b>SVILUPPO SISTEMI OPERATIVI DI SCALO</b>				<b>N° 6.3</b>
P.E.		P.M.	ANDREA PONTECORVO		A.S.	da definire
<b>SCHEDA PROGETTO</b>						
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		n.a.	n.a.		n.a.	
	PRE	DEF	ES			
DATI DI AVANZAMENTO						

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

<b>STANZIAMENTO PREVISTO 2017-2021 €</b> <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>20.637.797</b>
---	-------------------

<b>STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €</b>	
--	--

<b>IMPORTO APPALTATO (Lavori)</b>	
-----------------------------------	--

<b>IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)</b>	
--------------------------------------	--

TS M SP

  
 14

**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

<b>OPERA:</b>		<b>EVOLUZIONE E RINNOVO TECNOLOGICO INFRASTRUTTURE ICT</b>				<b>N° 6.3</b>
P.E.		P.M.	ANDREA PONTECORVO	A.S.	da definire	
<b>SCHEDA PROGETTO</b>						
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		n.a.	n.a.		n.a.	
	PRE	DEF	ES			
DATI DI AVANZAMENTO						

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

<b>STANZIAMENTO PREVISTO 2017-2021 €</b> <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>13.733.042</b>
---	-------------------

<b>STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €</b>	
--	--

<b>IMPORTO APPALTATO (Lavori)</b>	
-----------------------------------	--

<b>IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)</b>	
--------------------------------------	--

73 m 100

u



**AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA**

**OPERA:**

**SVILUPPO SISTEMI GESTIONALI**

**N° 6.3**

P.E.

P.M.

ANDREA PONTECORVO

A.S.

da definire

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				n.a.	n.a.		n.a.	
	PRE	DEF	ES					
DATI DI AVANZAMENTO								

(\*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

<b>STANZIAMENTO PREVISTO 2017-2021 €</b> <small>(PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)</small>	<b>4.797.663</b>
---	------------------

<b>STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €</b>	
--	--

<b>IMPORTO APPALTATO (Lavori)</b>	
-----------------------------------	--

<b>IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)</b>	
--------------------------------------	--

→ M A



A
