

Scheda e

## AEROPORTO DI BOLOGNA

OPERA		Nuovo molo partenze																																																N. 1																																			
Resp. Proc.		Ing. Davide Serrau																D.L.																A.S.																---																																			
		- Progett.												- Appalto Prog.												- Appalto Integ.												- Appalto Lavor.												- Esecuzione												- Sospensione												- Interruzione											
ATTIVITA'		CONSUNTIVO 2014												2015												2016												2017												2018												2019																							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																																				
	APPALTO																																																																																				
	REALIZZAZIONE																																																																																				
	COLLAUDI																																																																																				
		150.000												228.000												2.250.000												4.030.000												4.030.000																																			
		10.688.000																																																																																			
EFFETTIVA	AVANZAMENTO																																																																																				
	PROGETTAZIONE																																																																																				
	COLLAUDI																																																																																				
		214.800																																																																																			

PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2016-2019

SCHEDA C

AEROPORTO DI BOLOGNA

OPERA

Riqualifica Aerostazione Esistente

N. 2

Resp . Proc.

Ing. Davide Serrau



D.L.

One Works

A.S.

Mangiapane-Riccobono

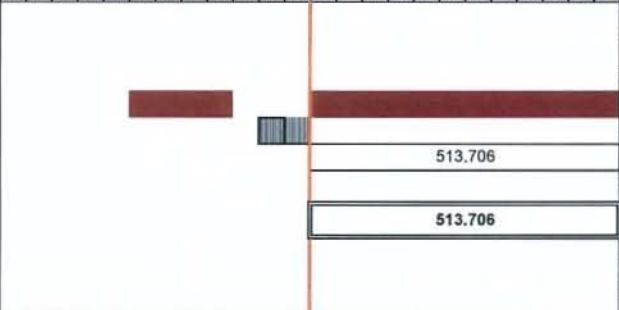

ATTIVITA'	CONSUNTIVO 2014												2015												2016												2017												2018												2019											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
PREVISTA																																																																								
													513.706																																																											
												513.706																																																												
EFFETTIVA																																																																								
	1.553.835																																																																							



PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2016-2019

SCHEDA C

AEROPORTO DI BOLOGNA

OPERA

Pontili di Imbarco Aerostazione Esistente

N. 3

Resp. Proc.

Ing. Domenico Terra

D.L.

Daive Gentilini

A.S.

E. Di Maro

- Progett.  
  - Appalto Prog.  
  - Appalto Integ.  
  - Appalto Lavori  
  - Esecuzione  
  - Sospensione  
  - Collaudi

ATTIVITA'	CONSUNTIVO 2014												2015												2016												2017												2018												2019																							
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D												
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																																			
	APPALTO																																																																																			
	REALIZZAZIONE	[Bar chart showing execution in 2014 and 2015]												[Bar chart showing execution in 2015 and 2016]																																																																						
	COLLAUDI																									[Bar chart showing collauding in 2016]																																																										
													700.000												839.856																																																											
																									1.539.856																																																											
EFFETTIVA	AVANZAMENTO																																																																																			
	PROGETTAZIONE																																																																																			
	APPALTO																																																																																			
	REALIZZAZIONE	[Bar chart showing execution in 2014]																																																																																		
	434.385																																																																																			

PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2016-2019

SCHEDA C

AEROPORTO DI BOLOGNA

<b>OPERA</b>		<b>Ampliamento Uffici SAB</b>															<b>N. 4</b>																																
<b>Resp . Proc.</b>		<b>Ing. Davide Serrau</b>		<b>D.L.</b>													<b>A.S.</b>	<b>---</b>																															
		<p> <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> - Progett.            <span style="background-color: #c0c000; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> - Appalto Prog.            <span style="background-color: #c0c000; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> - Appalto Inter.            <span style="background-color: #c0c000; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> - Appalto Lanzi            <span style="background-color: #800000; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> - Esecuzione            <span style="background-color: #008000; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> - Sospensione            <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> - Collaudi       </p>																																															
ATTIVITA'	CONSUNTIVO 2014				2015				2016				2017				2018				2019																												
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																
	APPALTO																																																
	REALIZZAZIONE																																																
	COLLAUDI																																																
		50.000												300.000																																			
		350.000																																															
EFFETTIVA	AVANZAMENTO																																																
	PROGETTAZIONE																																																
	APPALTO																																																
	REALIZZAZIONE																																																
	COLLAUDI																																																

PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2016-2019

SCHEDA C

AEROPORTO DI BOLOGNA

OPERA

Interventi su terminal esistente

N. 5

Resp. Proc.

---

D.L.

---

A.S.

---

- Progett.
  - Appalto Progett.
  - Appalto Integraz.
  - Appalto Lavori
  - Esecuzione
  - Soppressione
  - Collaudi

ATTIVITA'	CONSUNTIVO 2014												2015												2016												2017												2018												2019											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
PREVISTA	PROGETTAZIONE													[Gantt bar: 2015-2016]												[Gantt bar: 2016-2017]																																														
	APPALTO																									[Gantt bar: 2016]																																														
	REALIZZAZIONE																																					[Gantt bar: 2017-2019]																																		
	COLLAUDI																																																																							
	200.000												370.000												3.610.000												6.550.000												6.550.000																							
<b>17.280.000</b>																																																																								
EFFETTIVA	AVANZAMENTO																																																																							
	PROGETTAZIONE																																																																							
	APPALTO																																																																							
	REALIZZAZIONE																																																																							
COLLAUDI																																																																								



PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2016-2019

SCHEDA **C**

AEROPORTO DI BOLOGNA

OPERA

Ristrutturazione Parcheggio Express Park

N. 6

Resp . Proc.

---

D.L.

---

A.S.

---

- Progett.  
  - Appalto Prog.  
  - Appalto Integ.  
  - Appalto Lavori  
  - Esecuzione  
  - Sospensione  
  - Collaudi

ATTIVITA'	CONSUNTIVO 2014					2015					2016					2017					2018					2019																					
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																														
	APPALTO																																														
	REALIZZAZIONE																																														
	COLLAUDI																																														
	30.000					1.170.000					766.746																																				
	1.966.746																																														
EFFETTIVA	AVANZAMENTO																																														
	PROGETTAZIONE																																														
	APPALTO																																														
	REALIZZAZIONE																																														
	COLLAUDI																																														

PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2016-2019

SCHEDA C

AEROPORTO DI BOLOGNA

OPERA

Parcheggio Area Autostrade

N. 7

Resp. Proc.

Ing. Davide Serrau

D.L.

---

A.S.

---

- Progett.  
  - Appalto Prog.  
  - Appalto Integri.  
  - Appalto Lavori  
  - Esecuzione  
  - Soppressione  
  - Collaudi

ATTIVITA'	CONSUNTIVO 2014												2015												2016												2017												2018												2019											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
PREVISTA																																																																								
													335.675												200.000																																															
													535.675																																																											
EFFETTIVA																																																																								

*Handwritten signature and date*

PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2016-2019

SCHEDA C

AEROPORTO DI BOLOGNA

OPERA

Sistemazione Viabilità Area Est

N. 8

Resp . Proc.

Ing. Davide Serrau

D.L.

Ing. Mirko Marseglia

A.S.

---

- Progett. 
  - Appalto Prog. 
  - Appalto Integ. 
  - Appalto Lavori 
  - Esecuzione 
  - Sospensione 
  - Collaudi

ATTIVITA'	CONSUNTIVO 2014				2015				2016				2017				2018				2019														
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																		
	APPALTO																																		
REALIZZAZIONE																																			
COLLAUDI																																			
					549.580																														
					549.580																														
EFFETTIVA	AVANZAMENTO																																		
	PROGETTAZIONE																																		
APPALTO																																			
REALIZZAZIONE																																			
COLLAUDI																																			
					567.374																														



PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2016-2019

SCHEDA **C**

AEROPORTO DI BOLOGNA

OPERA

People Mover (Passerella pedonale)

N. 9

Resp . Proc.

Ing. Davide Serrau

D.L.

---

A.S.

---

- Progett.  
  - Appalto Prog.  
  - Appalto Integri.  
  - Appalto Lavori  
  - Esecuzione  
  - Sospensione  
  - Collaudi

ATTIVITA'	CONSUNTIVO 2014					2015					2016					2017					2018					2019								
	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A
PREVISTA																																		
											223.866																							
EFFETTIVA											223.866																							

Handwritten mark

PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2016-2019

SCHEDA C

AEROPORTO DI BOLOGNA

ERA

People Mover (solo finanziamento Stazione)

OP



PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2016-2019

SCHEDA **C**

AEROPORTO DI BOLOGNA

**CONCLUSO**

**OPERA**

**Centrale di Cogenerazione/Impianti Tecnologici**

**N. 10**

**Resp . Proc.**

**Ing. Paolo Sgroppo**

**D.L.**

**Ing. Marco Rossetto**

**A.S.**

---

- Progett.  
  - Appalto Prog.  
  - Appalto Integ.  
  - Appalto Lavori  
  - Esecuzioni  
  - Supervision  
  - Collaudi

ATTIVITA'	CONSUNTIVO 2014												2015												2016												2017												2018												2019												
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																								
	APPALTO																																																																								
	REALIZZAZIONE	■																																																																							
	COLLAUDI																																																																								
EFFETTIVA	AVANZAMENTO																																																																								
	PROGETTAZIONE																																																																								
	APPALTO																																																																								
	REALIZZAZIONE	■																																																																							
COLLAUDI																																																																									
		1.105.777																																																																							

PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2016-2019

SCHEDA C

AEROPORTO DI BOLOGNA

OPERA

Ampliamento piazzale aa/mm I lotto

N. 11

Resp . Proc.

---


D.L.

---

A.S.

---



ATTIVITA'	CONSUNTIVO 2014				2015				2016				2017				2018				2019																																						
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
PREVISTA PROGETTAZIONE APPALTO REALIZZAZIONE COLLAUDI																																																											
	20.000												1.776.971												372.000																																		
	2.168.971																																																										
EFFETTIVA AVANZAMENTO PROGETTAZIONE APPALTO REALIZZAZIONE COLLAUDI																																																											

PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2016-2019

SCHEDA **C**

AEROPORTO DI BOLOGNA

**OPERA**

**Riqualifica Piazzale Aeroclub**

**N. 12**

**Resp . Proc.**

**Ing. Domenico Terra**

**D.L.**

**Davide Gentilini**

**A.S.**

**---**

= Progett.  
  = Appalto Prog.  
  = Appalto Integr.  
  = Appalto Lavori  
  = Esecuzione  
  = Sospensione  
  = Collaudi

ATTIVITA'	CONSUNTIVO 2014												2015												2016												2017												2018												2019											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>PREVISTA</b>	PROGETTAZIONE																																																																							
	APPALTO																																																																							
	REALIZZAZIONE																																																																							
	COLLAUDI																																																																							
	200.000																								4.213.313																																															
	4.413.313																																																																							
<b>EFFETTIVA</b>	AVANZAMENTO PROGETTAZIONE																																																																							
	APPALTO REALIZZAZIONE COLLAUDI																																																																							
	24.502																																																																							



PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2016-2019

SCHEDA C

AEROPORTO DI BOLOGNA

CONCLUSO

OPERA

Edificio per B.H.S.

N. 14

Resp . Proc.

Ing. Domenico Terra

D.L.

Ing. Domenico Terra

A.S.

M. Grilletti

ATTIVITA'	CONSUNTIVO 2014												2015												2016												2017												2018												2019											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
PREVISTA																																																																								
EFFETTIVA	7.707																																																																							

Spese di Certificazione Energetica dell'Edificio



PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2016-2019

SCHEDA C

AEROPORTO DI BOLOGNA

OPERA

B.H.S.

N. 15

Resp . Proc.

Ing. Davide Serrau

D.L.

Ing. Paolo Sgroppo

A.S.

M. Grilletti

- Progett. - Appalto Prog. - Appalto LAVORI - Esecuzione - Spese - Collaudi

ATTIVITA'	CONSUNTIVO 2014												2015												2016												2017												2018												2019											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
PREVISTA	PROGETTAZIONE APPALTO REALIZZAZIONE COLLAUDI																																																																							
EFFETTIVA	AVANZAMENTO PROGETTAZIONE APPALTO REALIZZAZIONE COLLAUDI																																																																							
	86.033																																																																							



PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2016-2019

SCHEDA C

AEROPORTO DI BOLOGNA

OPERA

Nuova Viabilità Perimetrale

N. 16

Resp. Proc.

---

D.L.

---

A.S.

---

- Progett.
  - Appalto Progett.
  - Appalto Integri.
  - Appalto Lavori
  - Esecuzione
  - Sospensione
  - Collaudi

ATTIVITA'	CONSUNTIVO 2014												2015												2016												2017												2018												2019																							
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D												
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																																			
	APPALTO																																																																																			
	REALIZZAZIONE																																																																																			
	COLLAUDI																																																																																			
																																																	200.000												275.313												85.313											
																																																	560.626																																			
EFFETTIVA	AVANZAMENTO																																																																																			
	PROGETTAZIONE																																																																																			
	APPALTO																																																																																			
	REALIZZAZIONE																																																																																			
	COLLAUDI																																																																																			



PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2016-2019

SCHEDA C

AEROPORTO DI BOLOGNA

OPERA

Nuova Caserma VVFF

N. 17

Resp . Proc.

---

D.L.

---

A.S.

---

- Progett.  
  - Appalto Prog.  
  - Appalto Integ.  
  - Appalto Lavori  
  - Esecuzione  
  - Sospensione  
  - Collaudi

ATTIVITA'	CONSUNTIVO 2014					2015					2016					2017					2018					2019								
	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A
PREVISTA																																		
	40,000					42,539					1,161,211					1,511,250					1,876,250													
	4.631.250																																	
EFFETTIVA																																		

PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2016-2019

SCHEDA C

AEROPORTO DI BOLOGNA

OPERA

Nuova Base Elicotteristi VVFF

N. 18

Resp . Proc.

---

D.L.

---

A.S.

---

- Progett.
  - Appalto Proj.
  - Appalto Integ.
  - Appalto Lavori
  - Esecuzione
  - Soppressione
  - Collaudi

ATTIVITA'	CONSUNTIVO 2014												2015												2016												2017												2018												2019																								
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D													
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																																				
	APPALTO																																																																																				
	REALIZZAZIONE																																																																																				
	COLLAUDI																																																																																				
													65.000												50.555												1.225.695												2.827.500												2.280.875																								
																																					6.449.625																																																
EFFETTIVA	AVANZAMENTO																																																																																				
	PROGETTAZIONE																																																																																				
	APPALTO																																																																																				
	REALIZZAZIONE																																																																																				
COLLAUDI																																																																																					

PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2016-2019

SCHEDA C

AEROPORTO DI BOLOGNA

OPERA

Nuova Base Elicotteristi PS

N. 19

Resp . Proc.

---

D.L.

---

A.S.

---

= Progett.  
  = Appalto Prog.  
  = Appalto Integ.  
  = Appalto Lavori  
  = Esecuzione  
  = Sospensione  
  = Collaudi

ATTIVITA'	CONSUNTIVO 2014												2015												2016												2017												2018												2019											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																							
	APPALTO																																																																							
	REALIZZAZIONE																																																																							
	COLLAUDI																																																																							
	70.000												70.826												2.145.000												3.558.750												2.613.239																							
	8.457.815																																																																							
EFFETTIVA	AVANZAMENTO																																																																							
	PROGETTAZIONE																																																																							
	APPALTO																																																																							
	REALIZZAZIONE																																																																							
COLLAUDI																																																																								

PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2016-2019

SCHEDA **C**

AEROPORTO DI BOLOGNA

OPERA		Viabilità e Parcheggi VVFF					N. 20																																																						
Resp. Proc.	---			D.L.	---		A.S.	---																																																					
		■ - Progetto   ■ - Appalto Prog.   ■ - Appalto Integri.   ■ - Appalto Lavori   ■ - Esecuzione   ■ - Sospensione   ■ - Collaudi																																																											
ATTIVITA'		CONSUNTIVO 2014			2015			2016			2017			2018			2019																																												
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																												
	APPALTO																																																												
	REALIZZAZIONE																																																												
	COLLAUDI																																																												
									24.762			487.500			458.250			443.238																																											
		1.413.750																																																											
EFFETTIVA	AVANZAMENTO																																																												
	PROGETTAZIONE																																																												
	APPALTO																																																												
	REALIZZAZIONE																																																												
	COLLAUDI																																																												

**PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2016-2019**

**SCHEDA C**

**AEROPORTO DI BOLOGNA**

<b>OPERA</b>	<b>Riprotezione Aeroclub</b>												<b>N. 21</b>																																		
<b>Resp . Proc.</b>	<b>Ing. Domenico Terra</b>			<b>D.L.</b>	<b>Ing. Leonardo Marchi</b>						<b>A.S.</b>	---																																			
ATTIVITA'	CONSUNTIVO 2014					2015					2016					2017					2018					2019																					
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
<b>PREVISTA</b>	PROGETTAZIONE																																														
	APPALTO																																														
REALIZZAZIONE																																															
COLLAUDI																																															
														23.978																																	
														23.978																																	
<b>EFFETTIVA</b>	AVANZAMENTO																																														
	PROGETTAZIONE																																														
APPALTO																																															
REALIZZAZIONE																																															
COLLAUDI																																															
435.049																																															

PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2016-2019

SCHEDA C

AEROPORTO DI BOLOGNA

OPERA

Piazzola Deicing ed Edificio

N. 22

Resp . Proc.

Ing. Domenico Terra

D.L.

---

A.S.

---

- Progett.  
  - Appalto Prog.  
  - Appalto Integ.  
  - Appalto Lavori  
  - Esecuzione  
  - Sospensione  
  - Collaudi

ATTIVITA'	CONSUNTIVO 2014												2015												2016												2017												2018												2019											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																							
	APPALTO																																																																							
	REALIZZAZIONE																																																																							
	COLLAUDI																																																																							
													100.000												3.500.000												1.739.709																																			
													5.339.709																																																											
EFFETTIVA	AVANZAMENTO																																																																							
	PROGETTAZIONE																																																																							
	APPALTO																																																																							
	COLLAUDI																																																																							
	22.426																																																																							

PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2016-2019

SCHEDA C

AEROPORTO DI BOLOGNA

CONCLUSO

OPERA

Nuova Recinzione Perimetrale

N. 23

Resp . Proc.

Ing. Davide Serrau

D.L.

Carmelo Spataro

A.S.

---

ATTIVITA'	CONSUNTIVO 2014												2015												2016												2017												2018												2019												
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																								
	APPALTO																																																																								
	REALIZZAZIONE																																																																								
	COLLAUDI																																																																								
EFFETTIVA	AVANZAMENTO																																																																								
	PROGETTAZIONE																																																																								
	APPALTO																																																																								
	REALIZZAZIONE																																																																								
COLLAUDI																																																																									
		145.652																																																																							



PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2016-2019

SCHEDA C

AEROPORTO DI BOLOGNA

OPERA

Riprotezione Aree ENAV

N. 24

Resp . Proc.

Ing. Davide Serrau




D.L.

---

A.S.

---



ATTIVITA'	CONSUNTIVO 2014												2015												2016												2017												2018												2019																																		
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D																							
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																																														
	APPALTO																																																																																														
	REALIZZAZIONE																																																																																														
COLLAUDI																																																																																															
												234.269												700.000																																																																							
												934.269																																																																																			
EFFETTIVA	AVANZAMENTO																																																																																														
	PROGETTAZIONE																																																																																														
APPALTO																																																																																															
REALIZZAZIONE																																																																																															
COLLAUDI																																																																																															
												7.502																																																																																			



PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2016-2019

SCHEDA C

AEROPORTO DI BOLOGNA

OPERA

Disoleatori Fosso Canocchia

N. 25

Resp . Proc. Ing. Domenico Terra

D.L.

---

A.S.

---

- Progett.
  - Appalto Prog.
  - Appalto Integ.
  - Appalto Lavori
  - Esecuzione
  - Sospensione
  - Collaudi

ATTIVITA'	CONSUNTIVO 2014												2015												2016												2017												2018												2019											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
PREVISTA																																																																								
																									307.520																																															
																								307.520																																																
EFFETTIVA																																																																								
	12.480																																																																							

PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2016-2019

SCHEDA C

AEROPORTO DI BOLOGNA

OPERA

Nuove piazzole elicotteristi

N. 26

Resp . Proc.

---

D.L.

---

A.S.

---

- Progett. 
  - Appalto Prog. 
  - Appalto Integ. 
  - Appalto Lavori 
  - Esecuzione 
  - Sospensione 
  - Collaudi

ATTIVITA'	CONSUNTIVO 2014					2015					2016					2017					2018					2019																			
	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M										
PREVISTA																																													
	190.000															370.500															492.500														
	1.053.000																																												
EFFETTIVA																																													



PIANO QUADRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2016-2019

SCHEDA C

AEROPORTO DI BOLOGNA

OPERA

Edificio Cargo I modulo

N. 28

Resp . Proc.

Ing. Davide Serrau

D.L.

---

A.S.

---

- Progett. 
  - Appalto Prog. 
  - Appalto Integri. 
  - Appalto Lavori 
  - Esecuzione 
  - Sospensione 
  - Collaudo

ATTIVITA'	CONSUNTIVO 2014												2015												2016												2017												2018												2019												
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																								
	APPALTO																																																																								
	REALIZZAZIONE																																																																								
	COLLAUDI																																																																								
													50.000												200.000												2.000.000												3.000.000												2.062.500												
													<b>7.312.500</b>																																																												
EFFETTIVA	AVANZAMENTO																																																																								
	PROGETTAZIONE																																																																								
	APPALTO																																																																								
	REALIZZAZIONE																																																																								
COLLAUDI																																																																									

