

Allegato 8

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

1. I cronogrammi di cui al presente allegato 2 sono stati redatti alla data del 31/10/2011.
2. Essi diverranno vincolanti a decorrere dalla data di efficacia del contratto di programma indicata all'art. 52 della Convenzione ENAC-ADR; pertanto la scansione temporale degli investimenti andrà posticipata in ragione dell'arco temporale intercorrente tra la data di redazione dei cronogrammi di cui al punto 1 e quella di efficacia del Contratto di programma di cui al presente punto, anche per effetto di quanto previsto all'art. 9 comma 1 bis della Convenzione.
3. La Concessionaria ha l'obbligo di presentare all'ENAC, entro 60 giorni dalla data di efficacia del contratto di programma, i cronogrammi aggiornati in ragione di quanto previsto al precedente punto.

PROGETTO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D
ATTIVITA' URBANISTICHE FIUMICINO NORD							
1.1							
OPERE PROPEDEUTICHE UTILIZZO AREE DI ESPANSIONE FCO							
1.2							
MASTER PLAN + STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE							
1.3							
ESPROPRI PER L'ESPANSIONE DI FIUMICINO							
INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO FIUMICINO SUD							
2.1							
AREA OVEST - ISOLA SERAM, NUOVO VARCO DOGANALE							
2.2							
AREA OVEST - AMPLIAMENTO PIAZZALI SOSTA AEROMOBILI 1ª FASE							
Demolizioni							
Piazzali							
2.2							
AREA OVEST - AMPLIAMENTO PIAZZALI SOSTA AEROMOBILI 2ª FASE							
2.3							
4ª PISTA-VIA DI RULLAGGIO-PERIMETRALE							
2.3							
4ª PISTA-RETI PRIMARIE							
2.4							
ESTENSIONE PIAZZALI ZONA CARGO							
2.5							
COMPLETAMENTO RADDOPPIO TWY BRAVO							
2.6							
ESTENSIONE PIAZZALI EX AREA TECNICA AZ							

PROGETTO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D
2.7 RIPROTEZIONE PIAZZOLA PROVA MOTORI						█	█
2.8 PISTA 2/TWY INDIA - RIQUALIFICA E NORMATIVA	█	█					
2.9 RIQUALIFICA TWY CHARLIE	█	█	█				
2.10 RIQUALIFICA PISTA 3	█	█	█	█	█		
2.11 NUOVI PIAZZALI IN AREA PIANABELLA						█	█
2.12 ESTENSIONE PIAZZALI AA/MM IN AREA EX POSTE - QUADRANTE 200					█	█	█
2.13 ADEGUAMENTO STRIP 16C/34C		█	█	█			
INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO FIUMICINO NORD							
2.17 NUOVA IDROVORA DI FOCENE						█	█
INTERVENTI TERMINAL FIUMICINO SUD							
3.1 RIPROTEZIONI PALAZZINE MU E DEMOLIZIONI						█	█
3.2 AEROSTAZIONE T4 E AREA DI IMBARCO J					█	█	█
3.3 TERMINAL 3 - AMPLIAMENTO ZONA ARRIVI E RICONSEGNA BAGAGLI					█	█	█

PROGETTO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D
3.4 HUB EST - AREA DI IMBARCO A, AMPLIAMENTO E AVANCORPO T1, ESTENSIONE PIAZZALI 200							
3.4 HUB EST - ESTENSIONE PIAZZALI 200							
3.4 HUB EST - AEROSTAZIONE							
3.4 HUB EST - RIPROTEZIONE CBC AZ							
3.4 HUB EST - OPERE PROPEDEUTICHE							
3.6 SISTEMA BAGAGLI HBS BHS EX CARGO AZ							
3.7 AREA DI IMBARCO F E AVANCORPO T3 (EX MOLO C)							
3.8 AREA DI IMBARCO F (QUOTA FINANZIATA)							
INTERVENTI TERMINAL FIUMICINO NORD							
3.9 FIUMICINO NORD - AEROSTAZIONI PASSEGGERI							
INTERVENTI LAND SIDE FIUMICINO SUD							
4.2 INTERVENTI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO SEDIME							
4.3 VIABILITA' - SVINCOLO AREA CARGO CITY							
4.4 PALAZZINA DIREZIONALE NUOVA SEDE ADR							
4.5 AMPLIAMENTO PARK A RASO PER ADDETTI AREA CENTRALE							

PROGETTO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D
4.6 PEOPLE MOVER - GRTS							
INTERVENTI LAND SIDE FIUMICINO SUD							
5.1 PARCHEGGI A RASO AREA EST							
5.2 AREA CENTRALE - PARK MULTIPIANO MODULO F							
ALTRI INTERVENTI							
6.2 P.LI QUADRANTE 700/800							
6.2 RIQUALIFICA RULLAGGIO A							
6.2 RIQUALIFICA RULLAGGIO BRAVO E DELTA							
6.1/6.2 T3 - ADEGUAMENTI INTERNI AEROSTAZIONE							
6.1/6.2 T1 E T3 - RISTRUTTURAZIONI SERVIZI IGIENICI E AREE COMUNI							
6.1 REALIZZAZIONE PRESA DI ACQUA INDUSTRIALE DA FIUME TEVERE							
6.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTI ELETTRICI							
6.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTI CONDIZIONAMENTO ED IDRAULICI							
6.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTI ELETTROMECCANICI							
6.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INFRASTRUTTURE CIVILI							
6.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTI SPECIALI E VARIE							
6.2 INTERVENTI PER L'ENERGY SAVING E FONTI ALTERNATIVE							
6.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PISTE DI VOLO NUOVA RETE ELETTRICA							
6.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CABINE AT/MT							

PROGETTO		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
		G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	
6.1	PARCO AMBIENTALE								
6.2/6.3	SVILUPPO SISTEMI OPERATIVI DI SCALO								
6.2/6.3	EVOLUZIONE E RINNOVO TECNOLOGICO INFRASTRUTTURE ICT								
6.2/6.3	SVILUPPO SISTEMI GESTIONALI								

LEGENDA

Fincatura larga = pianificazione originaria

Fincatura stretta = avanzamento effettivo

= Progettazione = Approvazione = Appalto = Realizzazione = Collaudo

AEROPORTO LEONARDO DA VINCI



SCHEDE C e D

DIRETTORE INFRASTRUTTURE
GIORGIO GREGORI

*Il Direttore Infrastrutture
(Ing. Giorgio Gregori)*

POST HOLDER PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E SISTEMI
PAOLO CAMBULA

*Post Holder Progettazione
Infrastrutture e Sistemi*

Paolo Cambula



Riunione: Scheda C
 Data monitoraggio:
AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA	OPERE PROPEDEUTICHE UTILIZZO AREE DI ESPANSIONE FIUMICINO					N° 1.1
P.E.	da definire	P.M.	da definire	A.S.	da definire	

ATTIVITA'	2011					2012					2013					2014					2015					2016					2017																																								
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
PREVISTA PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO REALIZZAZIONE COLLAUDI																																																																							
																€ 1.000.000					€ 1.010.500					€ 1.021.110																																													

Legenda = Progettazione = Approvazione = Appalto = Realizzazione = Collaudi

Riunione:												Scheda C																																																																																					
Data monitoraggio:																																																																																																	
AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA																																																																																																	
OPERA		MASTERPLAN + STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE																						N° 1.2																																																																									
P.E.		da definire						P.M.		da definire						A.S.		da definire																																																																															
ATTIVITA'		2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017																																																																							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
PREVISTA	MASTERPLAN E SIA* APPROVAZIONE E PROCEDURA VIA																																																																																																
		€ 2.208.000						€ 400.000						€ 1.805.000						€ 853.000						€ 400.000																																																																							

Legenda

= Progettazione = Approvazione = Appalto = Realizzazione = Collaudi

*da agosto del 2012 a febbraio 2013 le attività di elaborazione dello studio di impatto ambientale e di approvazione tecnica saranno svolte in parallelo prima dell'avvio della procedura VIA

Riunione: Scheda C
 Data monitoraggio:
AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA	ESPROPRI PER L'ESPANSIONE DI FIUMICINO				N° 1.3
P.E.	da definire	P.M.	da definire	A.S.	da definire

ATTIVITA'	2011					2012					2013					2014					2015					2016					2017								
	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																						
	APPROVAZIONE																																						
	APPALTO																																						
REALIZZAZIONE																																							
COLLAUDI																																							
	€ 1.000.000					€ 2.000.000					€ 1.010.500					€ 1.021.110																							

Legenda = Progettazione = Approvazione = Appalto = Realizzazione = Collaudi

Riunione:
Data monitoraggio:

Scheda C

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA		AREA OVEST - ISOLA SERAM, NUOVO VARCO DOGANALE												N° 2.1																																																																							
P.E.		da definire				P.M.		MARCO IOVACCHINI				A.S.		da definire																																																																							
ATTIVITA'		2011			2012			2013			2014			2015			2016			2017																																																																	
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
PREVISTA	PROGETTAZIONE							■																																																																													
	APPROVAZIONE										■																																																																										
	APPALTO													■																																																																							
	REALIZZAZIONE													■			■																																																																				
	COLLAUDI																			■																																																																	
		€ 28.320						€ 204.080						€ 2.115.000			€ 3.956.108																																																																				

Legenda

■ = Progettazione

■ = Approvazione

■ = Appalto


■ = Realizzazione

■ = Collaudi

Riunione: Scheda C
 Data monitoraggio:

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA	AREA OVEST - AMPLIAMENTO PIAZZALI AEROMOBILI 1^ FASE					N° 2.2
P.E.	da definire	P.M.	NUNZIO D'AURIA	A.S.	da definire	

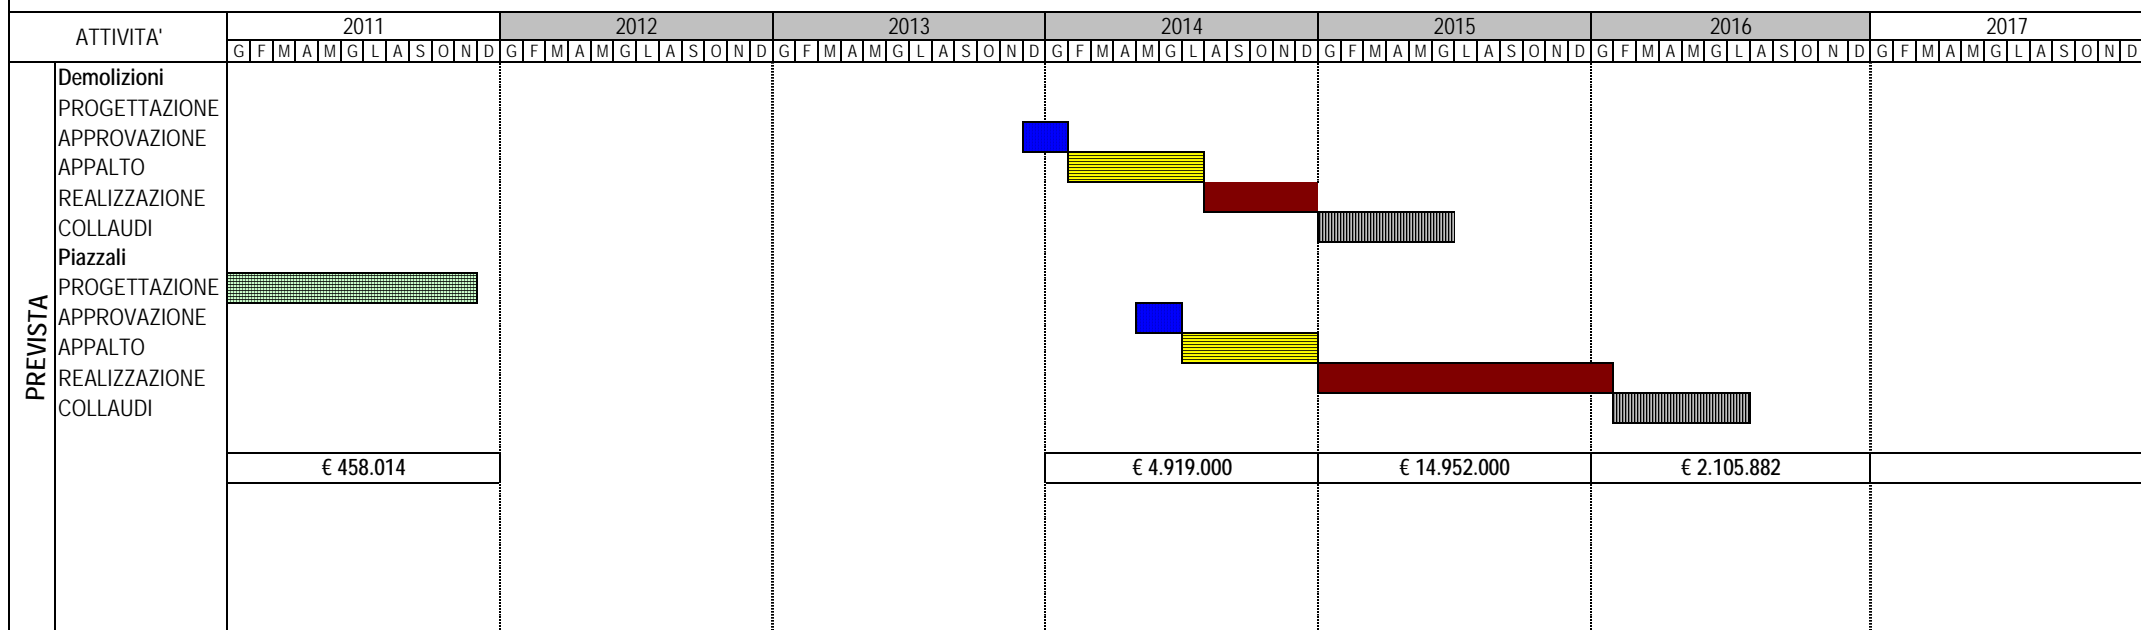

Legenda ■■■■■ = Progettazione ■ = Approvazione ■■■■■ = Appalto ■ = Realizzazione ■■■■■ = Collaudi

Riunione: Scheda C
 Data monitoraggio:
 AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA	AREA OVEST - AMPLIAMENTO PIAZZALI AEROMOBILI 2^ FASE				N° 2.2
P.E.	da definire	P.M.	NUNZIO D'AURIA	A.S.	da definire


	ATTIVITA'	2011					2012					2013					2014					2015					2016					2017																																																			
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O
PREVISTA	PROGETTAZIONE																									■																																																									
	APPROVAZIONE																														■																																																				
	APPALTO																																			■																																															
	REALIZZAZIONE																																								■																																										
	COLLAUDI																																													■																																					
																	€ 1.800.000					€ 2.308.000					€ 11.266.065					€ 14.910.252																																																			

Legenda ■ = Progettazione ■ = Approvazione ■ = Appalto ■ = Realizzazione ■ = Collaudi

Riunione: Scheda C
 Data monitoraggio:

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA	4^ PISTA - VIA DI RULLAGGIO - PERIMETRALE - RETI PRIMARIE				N° 2.3
P.E.	da definire	P.M.	NUNZIO D'AURIA	A.S.	da definire

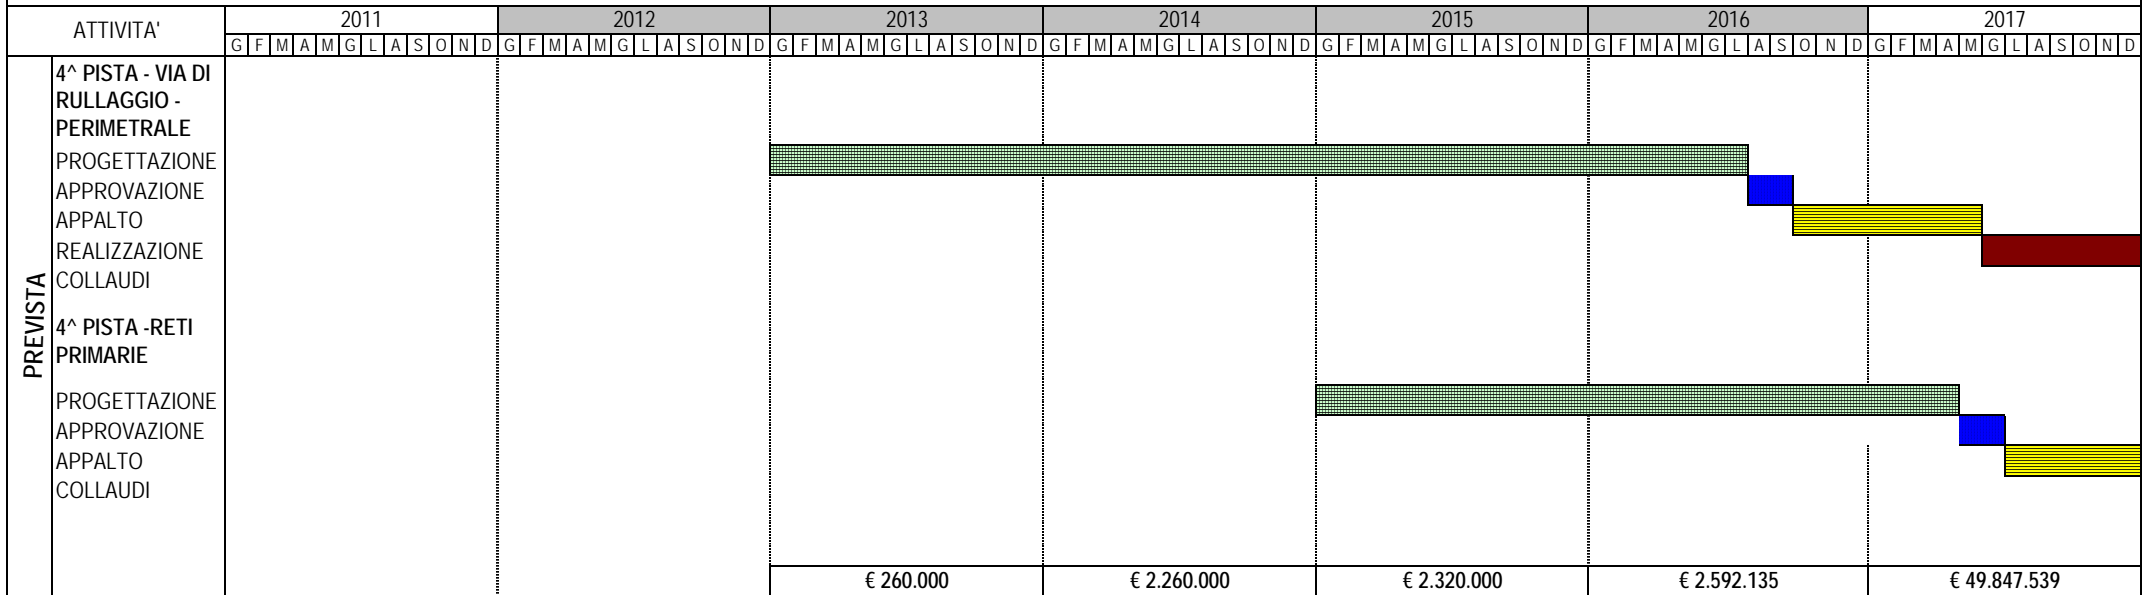

Legenda

= Progettazione

= Approvazione

= Appalto

= Realizzazione


= Collaudi

Riunione:												Scheda C																																																																									
Data monitoraggio:																																																																																					
AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA																																																																																					
OPERA		ESTENSIONE PIAZZALI ZONA CARGO																						N° 2.4																																																													
P.E.		da definire						P.M.		NUNZIO D'AURIA						A.S.		da definire																																																																			
ATTIVITA'		2011					2012					2013					2014					2015					2016					2017																																																					
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																																				
	APPROVAZIONE																																																																																				
APPALTO																																																																																					
REALIZZAZIONE																																																																																					
COLLAUDI																																																																																					
																						€ 127.000					€ 505.250					€ 4.702.213																																																					


Legenda

 = Progettazione

 = Approvazione


 = Appalto

 = Realizzazione

 = Collaudi

Riunione: Scheda C
 Data monitoraggio:
AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA


OPERA	COMPLETAMENTO RADDOPPIO BRAVO				N° 2.5
P.E.	da definire	P.M.	NUNZIO D'AURIA	A.S.	da definire

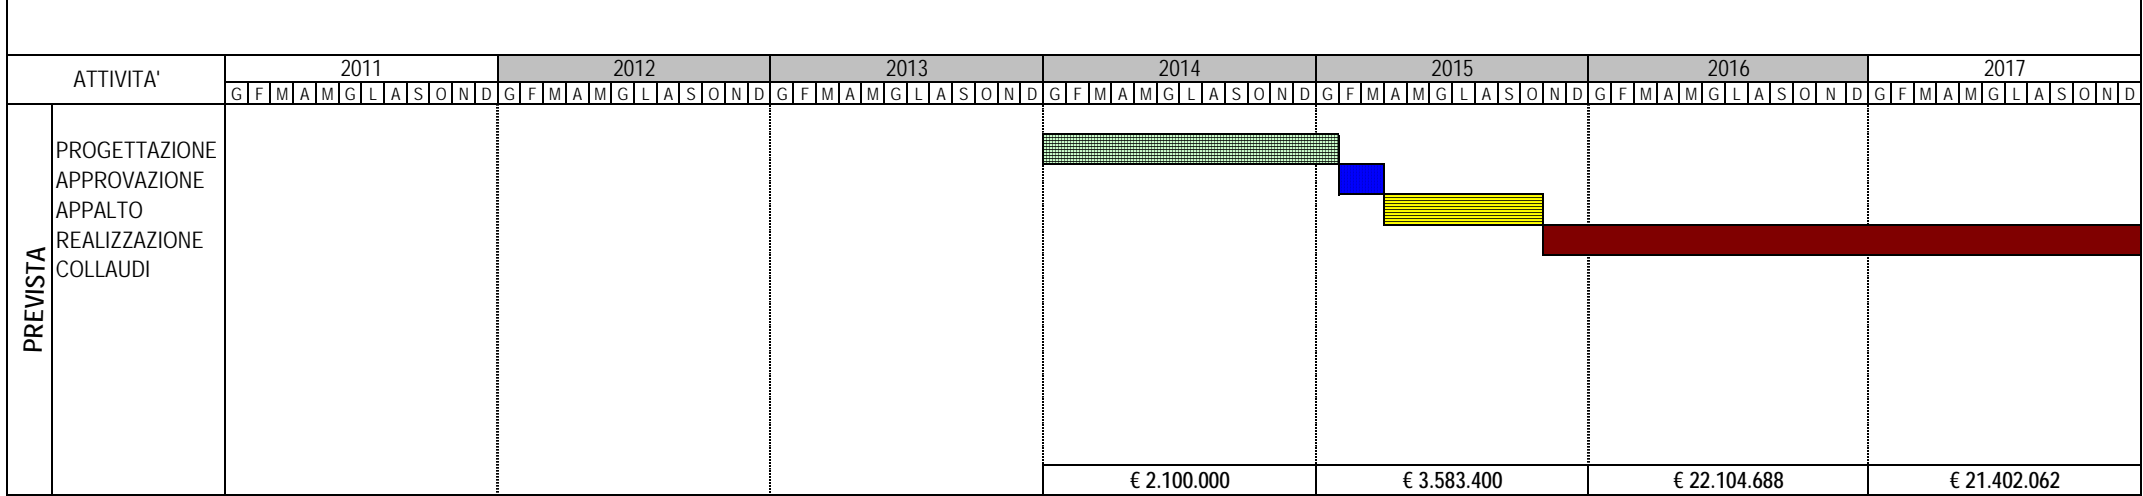

Legenda = Progettazione = Approvazione = Appalto = Realizzazione = Collaudi

Riunione: Schema C
 Data monitoraggio:
AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA


OPERA	ESTENSIONE PIAZZALI EX AREA TECNICA AZ				N° 2.6
P.E.	da definire	P.M.	NUNZIO D'AURIA	A.S.	da definire

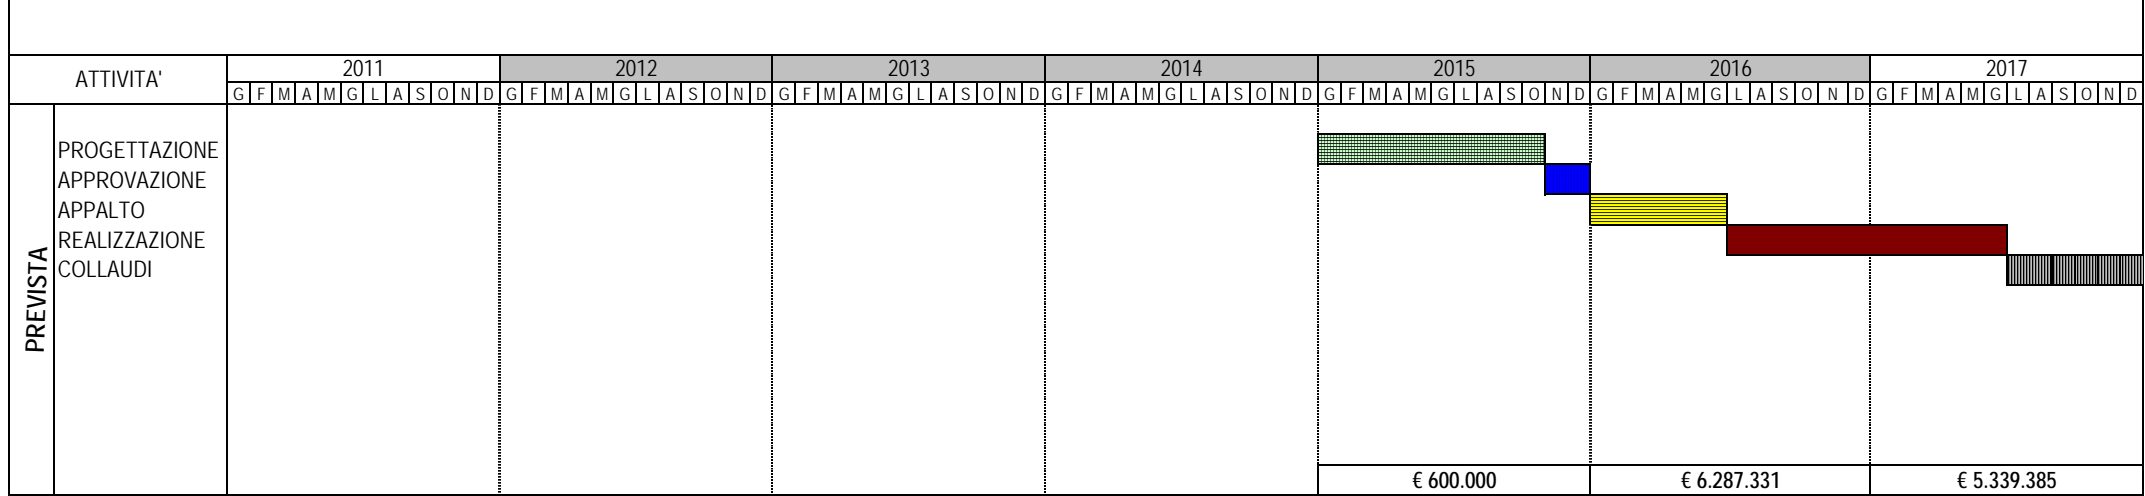

Legenda = Progettazione = Approvazione = Appalto = Realizzazione = Collaudi

Riunione: Scheda C
 Data monitoraggio:
AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA


OPERA	RIPROTEZIONE PIAZZOLA PROVA MOTORI					N° 2.7
P.E.	da definire	P.M.	NUNZIO D'AURIA	A.S.	da definire	

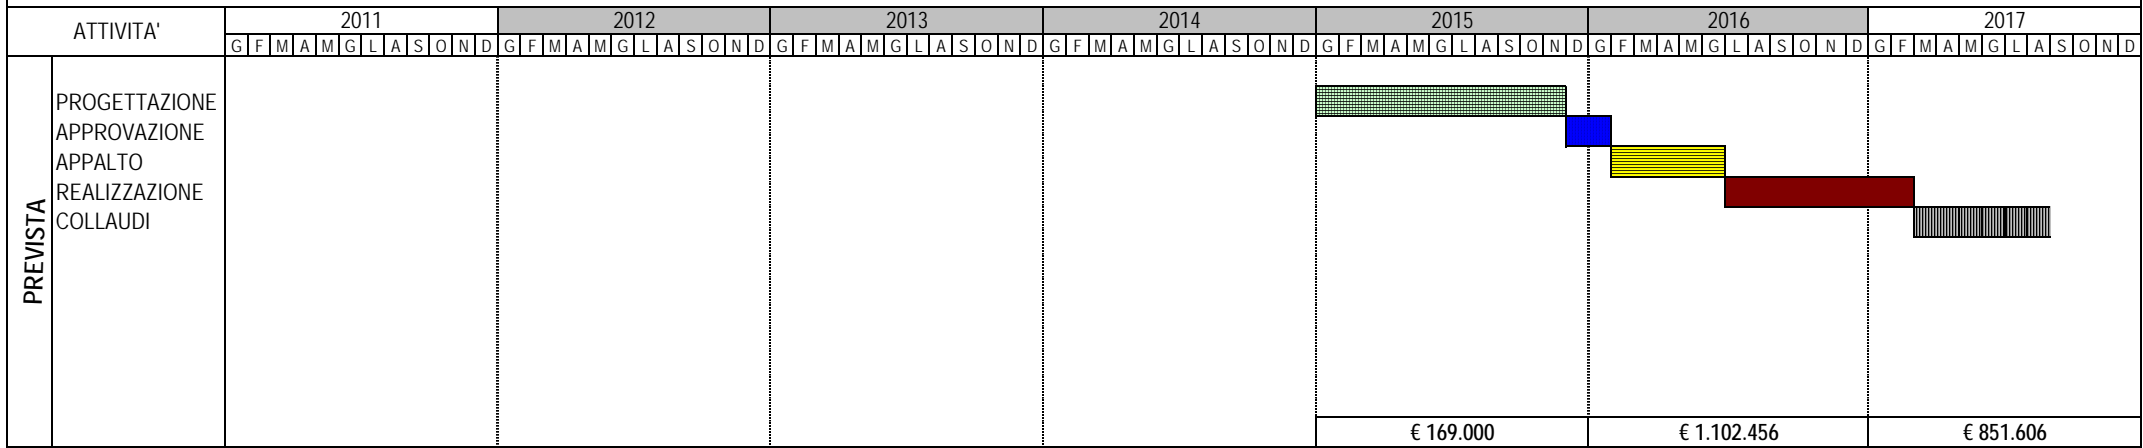

Legenda ▒ = Progettazione ■ = Approvazione ▨ = Appalto ■ = Realizzazione ▨ = Collaudi

Riunione: Scheda C
 Data monitoraggio:
AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA


OPERA PISTA 2/TWY INDIA - RIQUALIFICA E NORMATIVA N° 2.8
P.E. da definire **P.M.** NUNZIO D'AURIA **A.S.** da definire

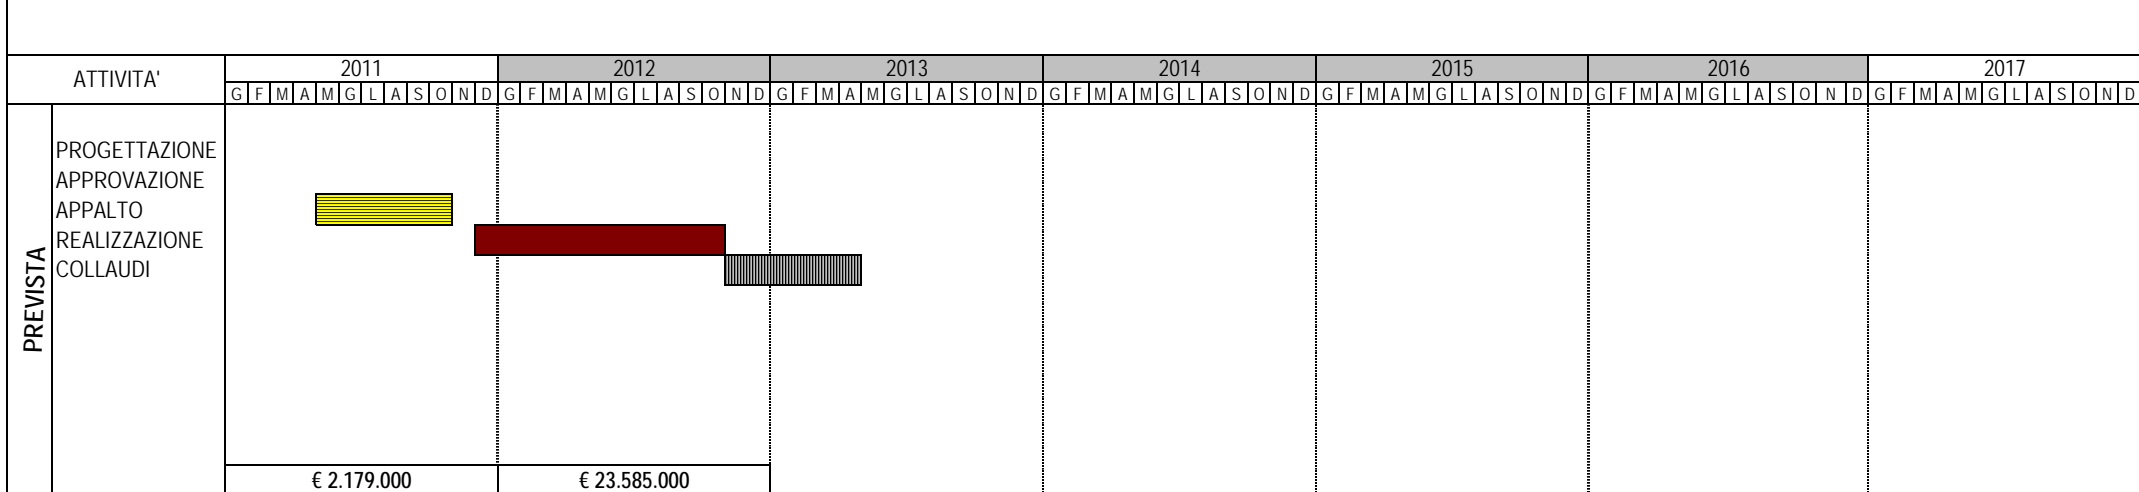

Legenda = Progettazione = Approvazione = Appalto = Realizzazione = Collaudi

Riunione: Scheda C
 Data monitoraggio:
AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA


OPERA	RIQUALIFICA TWY CHARLIE				N° 2.9
P.E.	da definire	P.M.	NUNZIO D'AURIA	A.S.	da definire

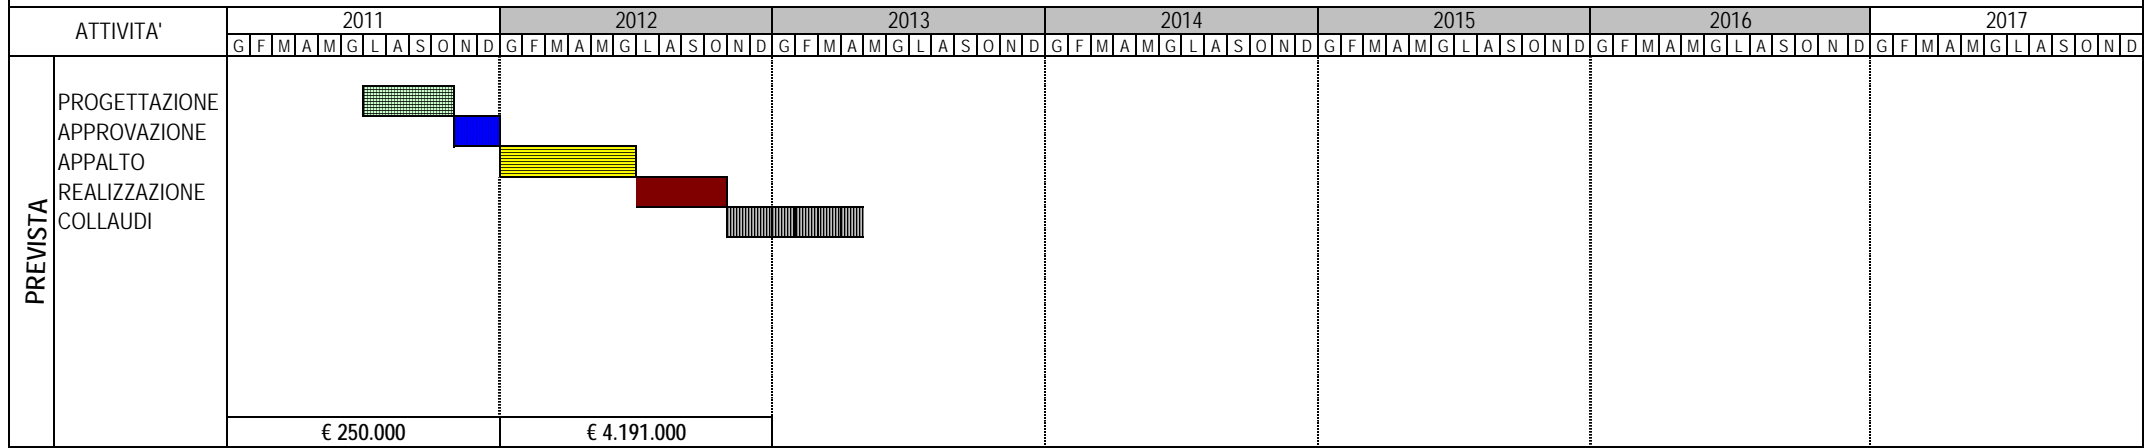

Legenda ▒ = Progettazione ■ = Approvazione ▨ = Appalto ■ = Realizzazione ▤ = Collaudi

Riunione: Scheda C
 Data monitoraggio:
AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA	RIQUALIFICA PISTA 3				N° 2.10
P.E.	da definire	P.M.	NUNZIO D'AURIA	A.S.	da definire

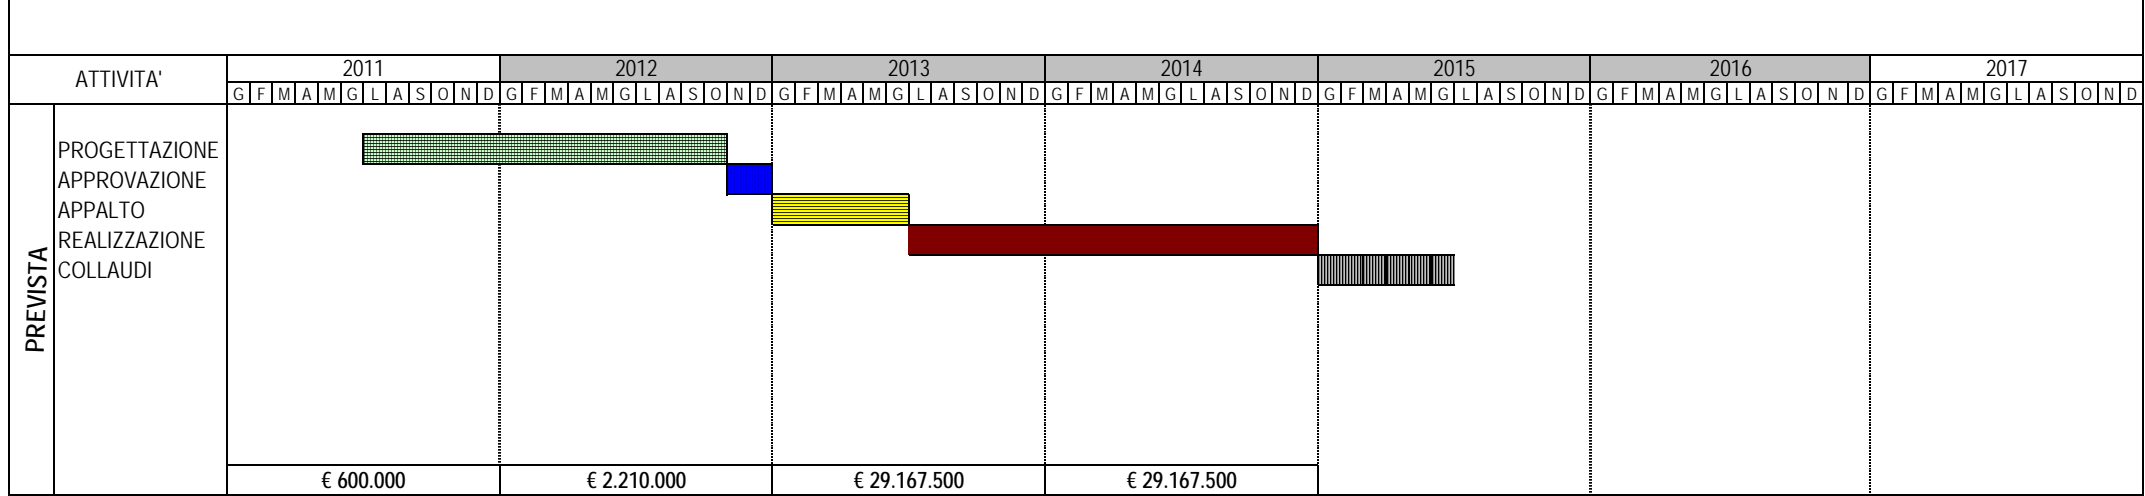

Legenda ▒ = Progettazione ■ = Approvazione ▨ = Appalto ■ = Realizzazione ▤ = Collaudi

Riunione: Scheda C
 Data monitoraggio:
AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA	NUOVI PIAZZALI IN AREA PIANABELLA				N° 2.11
P.E.	da definire	P.M.	NUNZIO D'AURIA	A.S.	da definire

ATTIVITA'	2011					2012					2013					2014					2015					2016					2017								
	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A
PREVISTA																																							
PROGETTAZIONE																																							
APPROVAZIONE																																							
APPALTO																																							
REALIZZAZIONE																																							
COLLAUDI																																							
																										€ 252.625					€ 1.225.332								

Legenda = Progettazione = Approvazione = Appalto = Realizzazione = Collaudi

Riunione: Schema C
 Data monitoraggio:
AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA	ESTENSIONE PIAZZALI AA/MM IN AREA EX POSTE - QUADRANTE 200					N° 2.12
P.E.	da definire	P.M.	NUNZIO D'AURIA	A.S.	da definire	

ATTIVITA'	2011					2012					2013					2014					2015					2016					2017								
	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A
PREVISTA PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO REALIZZAZIONE COLLAUDI																																							
																					€ 381.000					€ 587.101					€ 6.565.739								

Legenda = Progettazione = Approvazione = Appalto = Realizzazione = Collaudi

Riunione: Scheda C
 Data monitoraggio:
 AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA ADEGUAMENTO STRIP 16C/34C N° 2.13
P.E. da definire **P.M.** NUNZIO D'AURIA **A.S.** da definire

ATTIVITA'	2011					2012					2013					2014					2015					2016					2017								
	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A
PREVISTA PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO REALIZZAZIONE COLLAUDI	[Gantt bars for 2011]					[Gantt bars for 2012]					[Gantt bars for 2013]																												
	€ 250.000					€ 2.620.000					€ 3.875.000																												

Legenda [Stippled] = Progettazione [Blue] = Approvazione [Yellow] = Appalto [Red] = Realizzazione [Hatched] = Collaudi

Riunione:												Scheda C																																																																																					
Data monitoraggio:																																																																																																	
AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA																																																																																																	
OPERA		NUOVA IDROVORA DI FOCENE																				N° 2.17																																																																											
P.E.		da definire						P.M.		da definire						A.S.		da definire																																																																															
ATTIVITA'		2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017																																																																							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																																																
	APPROVAZIONE																																																																																																
	APPALTO																																																																																																
REALIZZAZIONE																																																																																																	
COLLAUDI																																																																																																	
														€ 416.629												€ 540.167																																																																							

Legenda

	= Progettazione		= Approvazione		= Appalto		= Realizzazione		= Collaudi
--	-----------------	--	----------------	--	-----------	--	-----------------	--	------------

Riunione: Scheda C
 Data monitoraggio:
AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA	RIPROTEZIONE PALAZZINE MU E DEMOLIZIONI					N° 3.1
P.E.	da definire	P.M.	LUCIANO VALENTE	A.S.	da definire	

ATTIVITA'	2011					2012					2013					2014					2015					2016					2017																																																				
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
PREVISTA	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 15%; text-align: left;"> PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO REALIZZAZIONE COLLAUDI </div> <div style="width: 85%; text-align: center;"> </div> </div>																																																																																		
															€ 621.887														€ 11.040.678																																																						

Legenda = Progettazione = Approvazione = Appalto = Realizzazione = Collaudi

Riunione: Scheda C
 Data monitoraggio:
AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA	AEROSTAZIONE T4 ED AREA DI IMBARCO J				N° 3.2
P.E.	da definire	P.M.	LUCIANO VALENTE	A.S.	da definire

	ATTIVITA'	2011					2012					2013					2014					2015					2016					2017																																																			
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																																		
	APPROVAZIONE																																																																																		
	APPALTO																																																																																		
REALIZZAZIONE																																																																																			
COLLAUDI																																																																																			
																	€ 6.000.000					€ 2.752.097																																																													

Legenda = Progettazione = Approvazione = Appalto = Realizzazione = Collaudi

Riunione: Scheda C
 Data monitoraggio:
AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA


OPERA	T3 AMPLIAMENTO ZONA ARRIVI E RICONSEGNA BAGAGLI				N° 3.3
P.E.	da definire	P.M.	LUCIANO VALENTE	A.S.	da definire

	ATTIVITA'	2011					2012					2013					2014					2015					2016					2017																																							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																						
	APPROVAZIONE																																																																						
	APPALTO																																																																						
	REALIZZAZIONE																																																																						
	COLLAUDI																																																																						
																	€ 370.000					€ 500.000					€ 3.179.134					€ 5.354.192																																							

Legenda = Progettazione = Approvazione = Appalto = Realizzazione = Collaudi

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA	HUB EST - AREA IMBARCO A, AMPLIAMENTO T1 ED AVANCORPO T1, ESTENSIONE PIAZZALI 200	N° 3.4
P.E.	P.M. LUCIANO VALENTE	A.S.

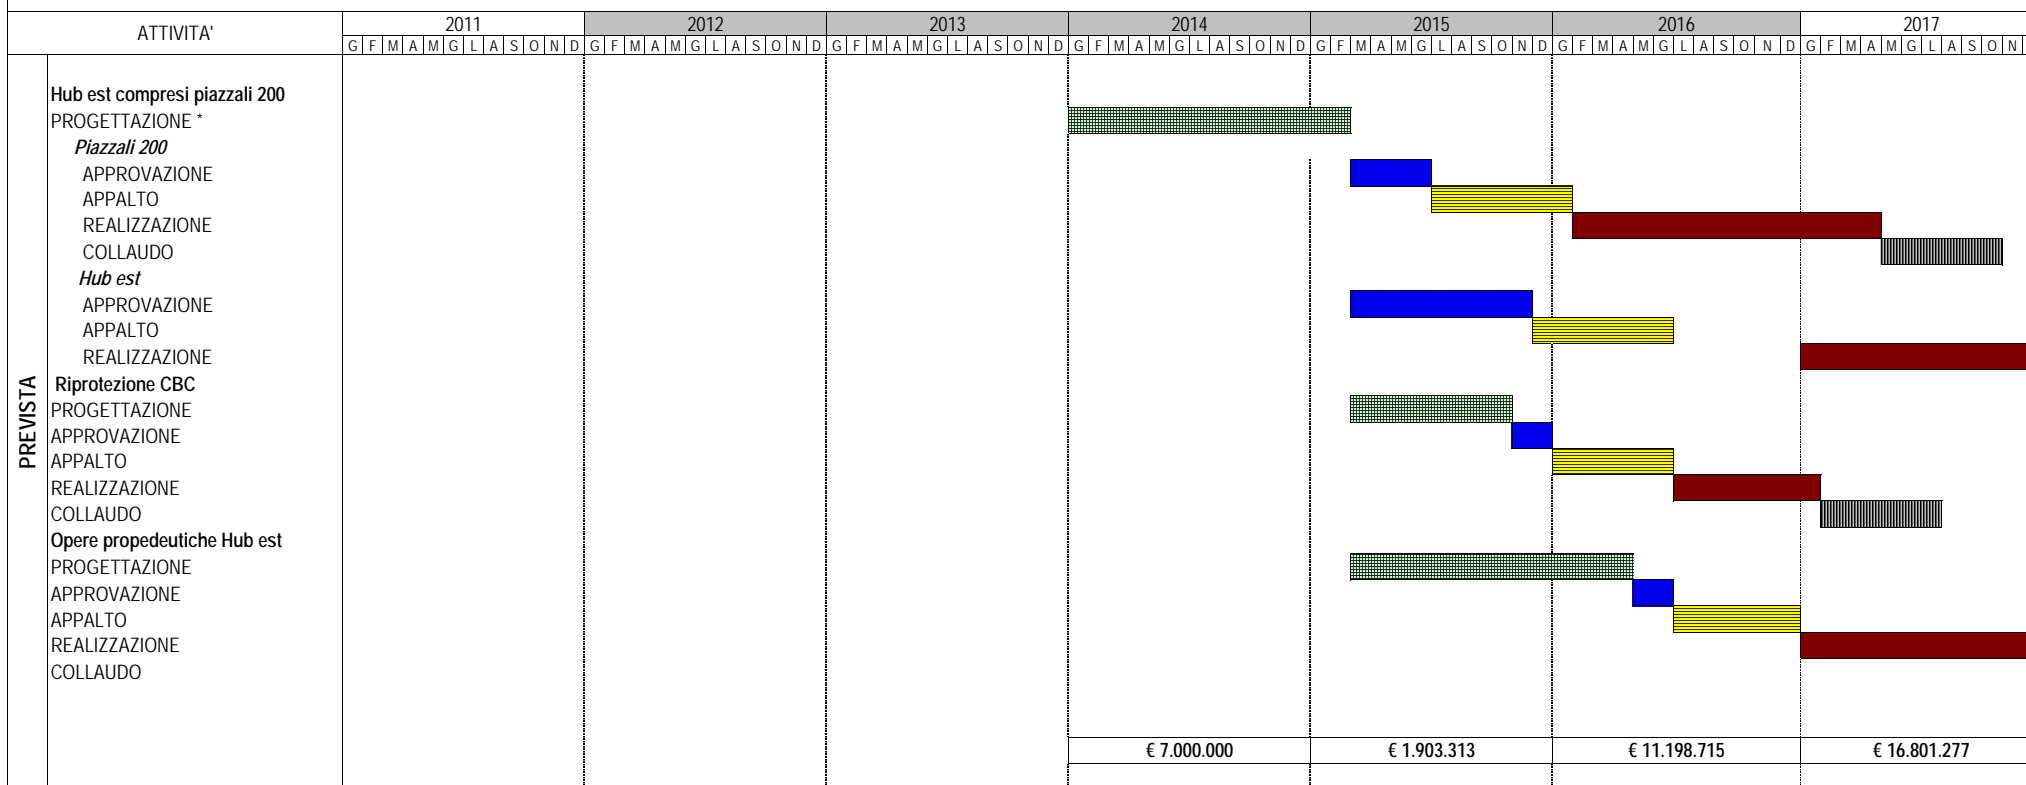

Legenda ▒ = Progettazione ■ = Approvazione ▨ = Appalto ■ = Realizzazione ▤ = Collaudi

Note * Progettazione Hub Est compresi Piazzali settore 200; ad oggi è conclusa la progettazione preliminare

Riunione: Data monitoraggio:		Scheda C																																																																							
AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA																																																																									
OPERA		SISTEMA BAGAGLI HBS BHS EX CARGO AZ											N° 3.6																																																												
P.E.		da definire				P.M.		MARCO IOVACCHINI				A.S.		da definire																																																											
ATTIVITA'		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017																																																											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																								
	APPROVAZIONE																																																																								
	APPALTO																																																																								
	REALIZZAZIONE																																																																								
	COLLAUDI																																																																								
		€ 1.088.927				€ 5.200.000		€ 25.900.000		€ 17.780.356																																																															

Legenda
  = Progettazione
  = Approvazione
  = Appalto
  = Realizzazione
  = Collaudi

NOTA: La progettazione è stata completata nell'anno 2010

Riunione: Scheda C
 Data monitoraggio:

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA	AREA IMBARCO F E AVANCORPO T3 (compresa quota finanziata dallo Stato, escluse opere minori)					N° 3.7-3.8
P.E.	da definire	P.M.	LUCIANO VALENTE	A.S.	DOMENICO MELE	

	ATTIVITA'	2011					2012					2013					2014					2015					2016					2017																																							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																						
	APPROVAZIONE																																																																						
	APPALTO																																																																						
	REALIZZAZIONE																																																																						
	COLLAUDI																																																																						
		€ 11.906.582					€ 19.160.256					€ 41.900.499					€ 53.514.879					€ 73.911.740					€ 29.581.219																																												

Legenda = Progettazione = Approvazione = Appalto = Realizzazione = Collaudi


AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA	AREA IMBARCO F E AVANCORPO T3 - OPERE MINORI (compresa quota finanziata dallo Stato)	N° 3.7-3.8
P.E.	da definire	P.M. LUCIANO VALENTE A.S. DOMENICO MELE

ATTIVITA'	2011					2012					2013					2014					2015					2016					2017																																																																									
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D																																												
PREVISTA Opere di Completamento/ arredi / terminalerie	PROGETTAZIONE																																																																																																							
	APPROVAZIONE																																																																																																							
	APPALTO																																																																																																							
	REALIZZAZIONE																																																																																																							
COLLAUDI																																																																																																								
															€ 0															€ 0															€ 208.000															€ 1.064.000															€ 1.583.000															€ 527.000														
Attività commerciali q.ta 6 (comprese pareti d'ambito)	PROGETTAZIONE																																																																																																							
	APPROVAZIONE																																																																																																							
	APPALTO																																																																																																							
	REALIZZAZIONE																																																																																																							
COLLAUDI																																																																																																								
															€ 0															€ 0															€ 186.000															€ 2.287.000															€ 3.167.000															€ 5.865.000														
Opere di riprotezione / propedeutiche *	PROGETTAZIONE																																																																																																							
	APPROVAZIONE																																																																																																							
	REALIZZAZIONE																																																																																																							
	COLLAUDI																																																																																																							
															€ 0															€ 0															€ 1.717.000															€ 2.444.000															€ 2.221.000															€ 1.060.000														

* i lavori saranno gestiti con contratti quadro (quindi la fase di appalto e collaudo non è evidenziata)

Legenda



Riunione: Data monitoraggio:		Scheda C																																																																																			
AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA																																																																																					
OPERA		FIUMICINO NORD - AEROSTAZIONI PASSEGGERI											N° 3.9																																																																								
P.E.		da definire				P.M.		da definire				A.S.		da definire																																																																							
ATTIVITA'		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017																																																																							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
PREVISTA	PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO REALIZZAZIONE COLLAUDI																																																																																				
		€ 1.000.000						€ 1.010.500						€ 1.021.110																																																																							

Legenda



= Progettazione



= Approvazione



= Appalto



= Realizzazione



= Collaudi

Riunione: Scheda C
 Data monitoraggio:
AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA	INTERVENTI DI RIASETTO IDROGEOLOGICO SEDIME - 1^ FASE					N° 4.2
P.E.	da definire	P.M.	MARCO IOVACCHINI	A.S.	da definire	

ATTIVITA'	2011					2012					2013					2014					2015					2016					2017								
	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A
PREVISTA																																							
											€ 219.000					€ 382.000					€ 273.000																		

Legenda

- = Progettazione
- = Approvazione
- = Appalto Quadro
- = Realizzazione
- = Collaudi

Riunione: Scheda C
 Data monitoraggio:
AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA	VIABILITA' - SVINCOLO AREA EST CARGO CITY				N° 4.3
P.E.	da definire	P.M.	MARCO IOVACCHINI	A.S.	da definire

	ATTIVITA'	2011					2012					2013					2014					2015					2016					2017							
		G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																						
	APPROVAZIONE																																						
	APPALTO																																						
	REALIZZAZIONE																																						
	COLLAUDI																																						
							€ 130.000					€ 100.000					€ 2.095.000					€ 2.116.998																	

Legenda

= Progettazione

= Approvazione

= Appalto

= Realizzazione

= Collaudi

Riunione: Scheda C
 Data monitoraggio:
AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA	PALAZZINA DIREZIONALE - NUOVA SEDE ADR					N° 4.4
P.E.	da definire	P.M.	MARCO IOVACCHINI	A.S.	da definire	

ATTIVITA'	2011					2012					2013					2014					2015					2016					2017								
	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A
PREVISTA	PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO REALIZZAZIONE COLLAUDI																																						
																€ 200.000					€ 789.201					€ 7.431.640													

Legenda

= Progettazione

= Approvazione


= Appalto

= Realizzazione

= Collaudi

Riunione: Scheda C
 Data monitoraggio:
AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA	AMPLIAMENTO PARK A RASO PER ADDETTI AREA CENTRALE					N° 4.5
P.E.	da definire	P.M.	MARCO IOVACCHINI	A.S.	da definire	

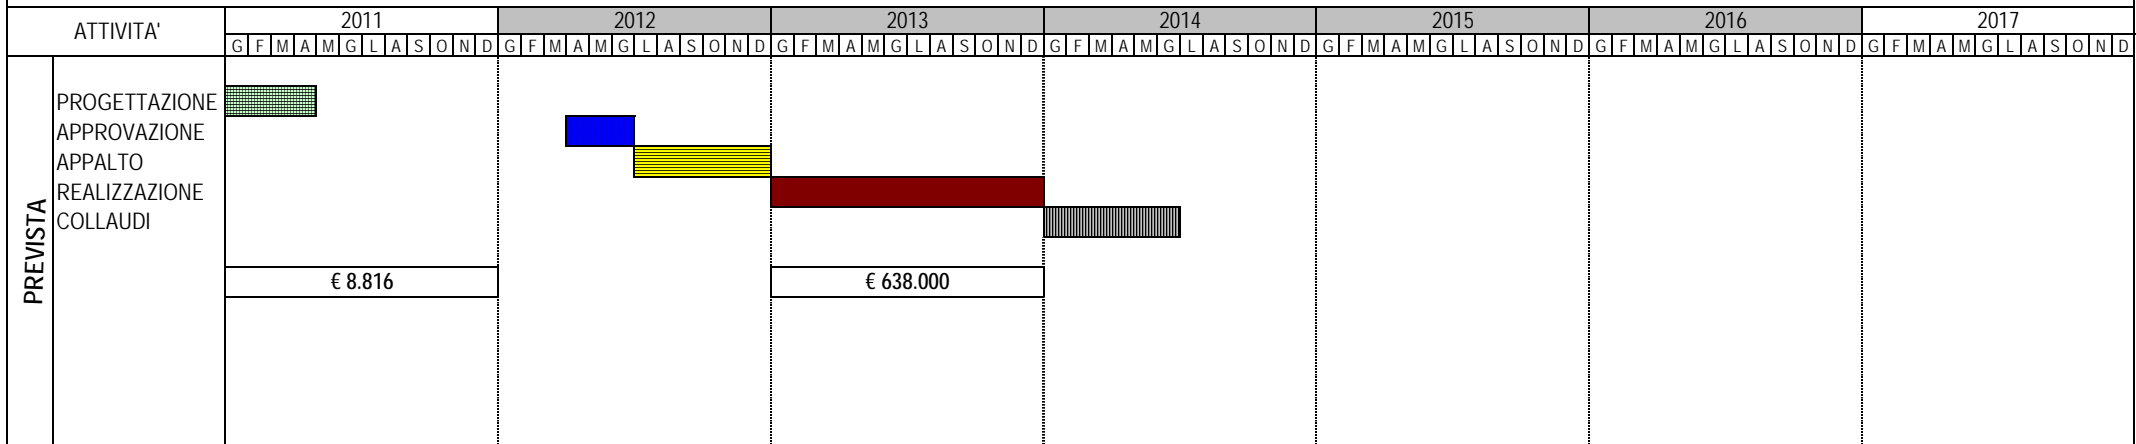

Legenda █ = Progettazione █ = Approvazione █ = Appalto █ = Realizzazione █ = Collaudi

Riunione: Scheda C
 Data monitoraggio:
AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA






OPERA	PEOPLE MOVER - GRTS - 1^ Fase				N° 4.6
P.E.	da definire	P.M.	da definire	A.S.	da definire

	ATTIVITA'	2011					2012					2013					2014					2015					2016					2017							
		G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																						
	APPROVAZIONE																																						
	APPALTO																																						
	REALIZZAZIONE																																						
	COLLAUDI																																						
												€ 50.000					€ 500.000					€ 1.500.000					€ 1.515.750					€ 10.262.158							

Legenda = Progettazione = Approvazione = Appalto = Realizzazione = Collaudi

Riunione: Scheda C
 Data monitoraggio:
AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA


OPERA	PARCHEGGI A RASO AREA EST					N° 5.1
P.E.	da definire		P.M.	MARCO IOVACCHINI	A.S.	da definire


ATTIVITA'	2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017																						
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
PREVISTA																																															
									€ 138.750				€ 2.116.000																																		


Legenda

 = Progettazione

 = Approvazione

 = Appalto

 = Realizzazione

 = Collaudi

Riunione: Scheda C
 Data monitoraggio:
AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA


OPERA	AREA CENTRALE - PARK MULTIPIANO MODULO "F"	N° 5.2
P.E.	da definire	P.M. MARCO IOVACCHINI A.S. da definire

ATTIVITA'	2011					2012					2013					2014					2015					2016					2017																			
	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M										
PREVISTA																																																		
																					€ 200.000										€ 6.019.498										€ 5.462.940									

Legenda = Progettazione = Approvazione = Appalto = Realizzazione = Collaudi

Riunione: Scheda C
 Data monitoraggio:
AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA	P.LI QUADRANTE 700/800				N° 6.2
P.E.	da definire	P.M.	NUNZIO D'AURIA	A.S.	da definire

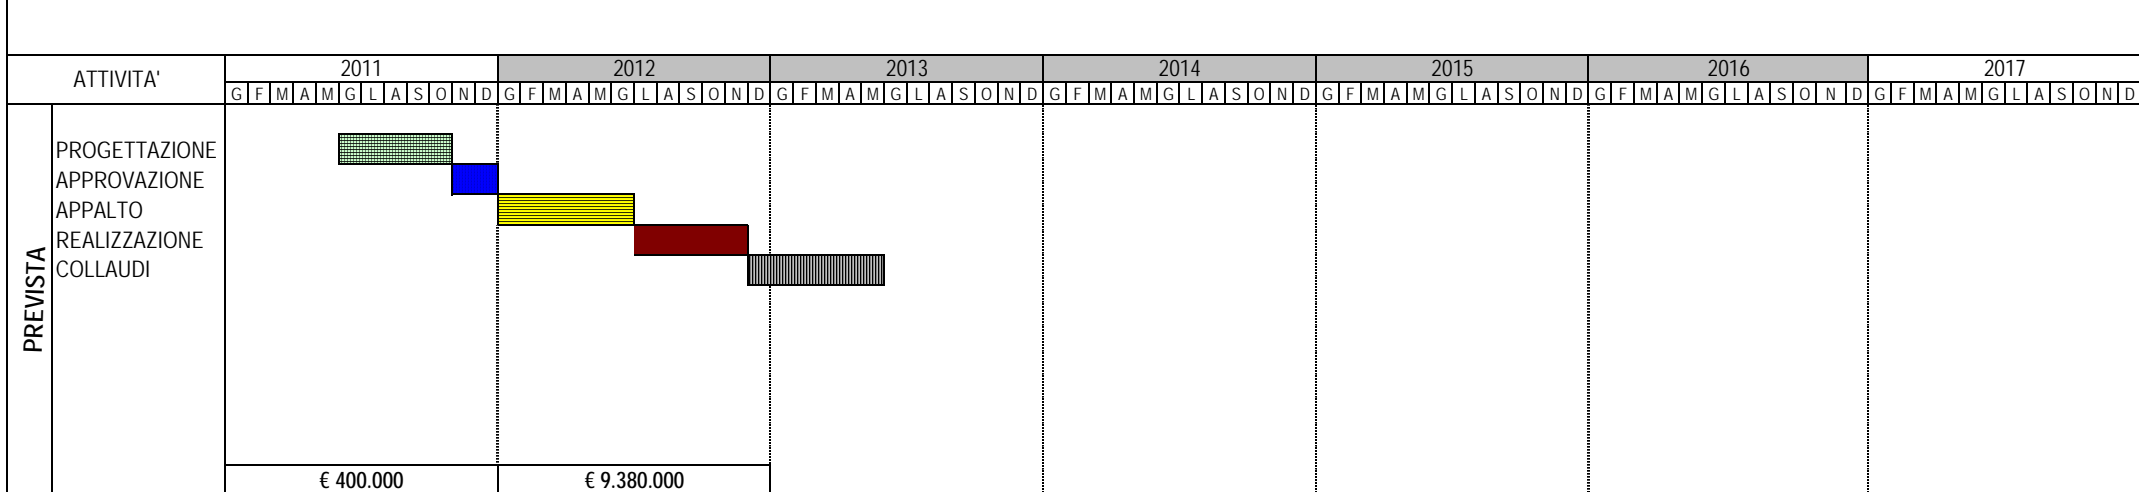

Legenda █ = Progettazione █ = Approvazione █ = Appalto █ = Realizzazione █ = Collaudi


Riunione:											Scheda C																																																																																						
Data monitoraggio:																																																																																																	
AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA																																																																																																	
OPERA		RIQUALIFICA RULLAGGIO A																		N° 6.2																																																																													
P.E.		da definire						P.M.			NUNZIO D'AURIA				A.S.		da definire																																																																																
ATTIVITA'		2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017																																																																							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																																																
	APPROVAZIONE																																																																																																
	APPALTO																																																																																																
	REALIZZAZIONE																																																																																																
	COLLAUDI																																																																																																
						€ 3.122.000																																																																																											

Legenda

- = Progettazione
- = Approvazione
- = Appalto
- = Realizzazione
- = Collaudi

Riunione: Scheda C
 Data monitoraggio:
AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA


OPERA	RIQUALIFICA RULLAGGIO BRAVO E DELTA					N° 6.2
P.E.	da definire		P.M.	NUNZIO D'AURIA	A.S.	da definire

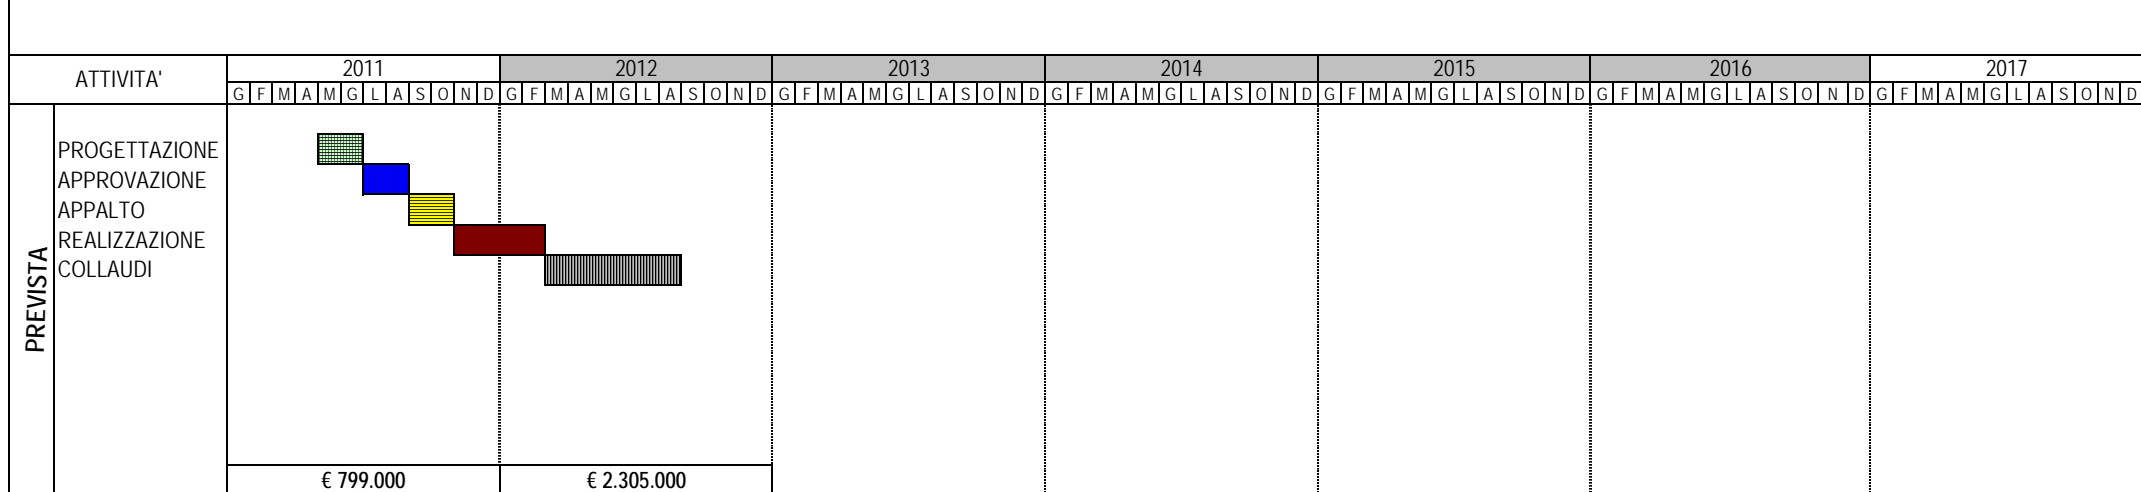

Legenda █ = Progettazione █ = Approvazione █ = Appalto █ = Realizzazione █ = Collaudi

Riunione: Schema C
 Data monitoraggio:
AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA	T3 ARRIVI - ADEGUAMENTI INTERNI AEROSTAZIONE					N° 6.1-6.2
P.E.	CLAUDIO BARBETTA	P.M.	LUCIANO VALENTE	A.S.	da definire	

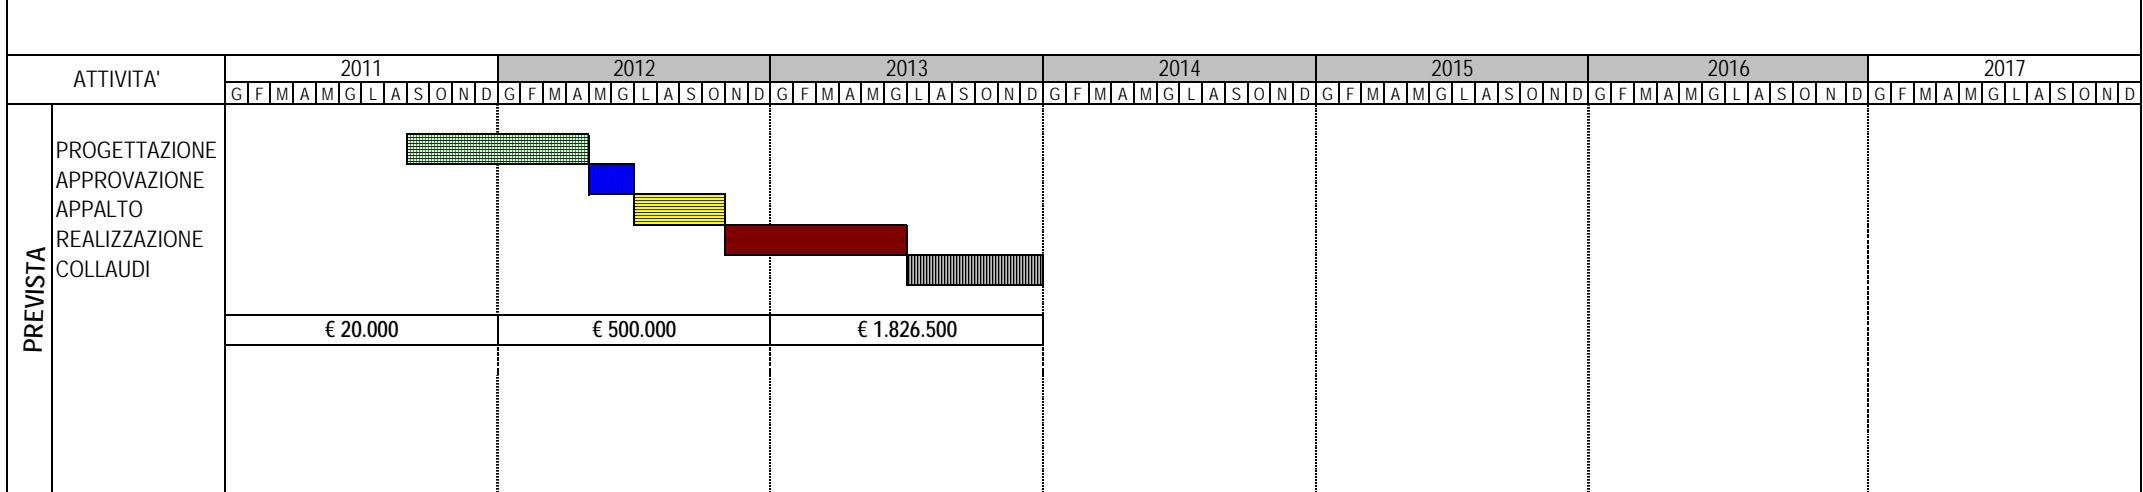

Legenda █ = Progettazione █ = Approvazione █ = Appalto █ = Realizzazione █ = Collaudi

Riunione: Scheda C
 Data monitoraggio:
AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA


OPERA T1 e T3 - RISTRUTTURAZIONI SERVIZI IGIENICI E AREE COMUNI N° 6.1-6.2
P.E. CLAUDIO BARBETTA **P.M.** LUCIANO VALENTE **A.S.** da definire

ATTIVITA'	2011					2012					2013					2014					2015					2016					2017																																																				
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																																		
	APPROVAZIONE																																																																																		
	APPALTO																																																																																		
	REALIZZAZIONE																																																																																		
COLLAUDI																																																																																			
	€ 1.088.261					€ 1.297.000					€ 1.242.070					€ 548.000					€ 698.000					€ 1.586.687																																																									

Legenda = Progettazione = Approvazione = Appalto = Realizzazione = Collaudi

Riunione: Scheda C
 Data monitoraggio:
AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA	REALIZZAZIONE PRESA DI ACQUA INDUSTRIALE DA FIUME TEVERE					N° 6.1
P.E.	CLAUDIO BARBETTA	P.M.	FABRIZIO BELLEI	A.S.	da definire	

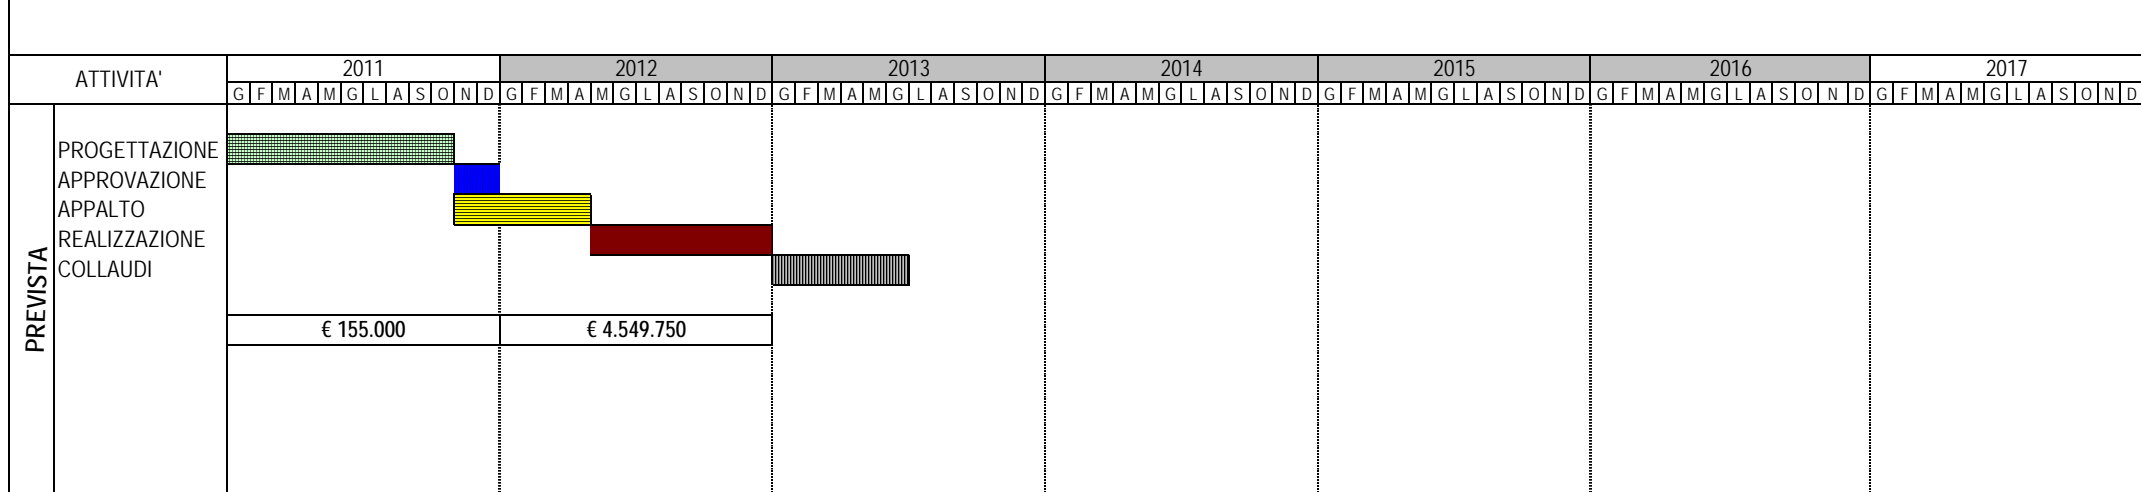


Legenda ██████████ = Progettazione ██████████ = Approvazione ██████████ = Appalto ██████████ = Realizzazione ██████████ = Collaudi

Riunione: Data monitoraggio:														Scheda C																																																																							
AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA																																																																																					
OPERA		MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTI ELETTRICI												N° 6.2																																																																							
P.E.		da definire				P.M.		da definire				A.S.		da definire																																																																							
ATTIVITA'		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017																																																																							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																																				
	APPROVAZIONE																																																																																				
	APPALTO																																																																																				
	REALIZZAZIONE																																																																																				
	COLLAUDI																																																																																				
		€ 8.520.000				€ 14.470.000				€ 12.590.000				€ 6.790.000				€ 8.860.000				€ 3.070.000																																																															


Legenda

 = Progettazione

 = Approvazione

 = Appalto

 = Realizzazione


 = Collaudi

Riunione: Data monitoraggio:												Scheda C																																																																																					
AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA																																																																																																	
OPERA		MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTI CONDIZIONAMENTO ED IDRAULICI																				N° 6.2																																																																											
P.E.		da definire					P.M.		da definire					A.S.		da definire																																																																																	
ATTIVITA'		2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017																																																																							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																																																
	APPROVAZIONE																																																																																																
	APPALTO																																																																																																
	REALIZZAZIONE																																																																																																
	COLLAUDI																																																																																																
		€ 10.440.000					€ 16.005.000					€ 7.325.000					€ 7.365.000					€ 7.690.000					€ 4.235.000																																																																						


Legenda

 = Progettazione

 = Approvazione

 = Appalto

 = Realizzazione


 = Collaudi


Riunione: Data monitoraggio:												Scheda C																																																																									
AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA																																																																																					
OPERA		MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTI ELETTROMECCANICI																				N° 6.2																																																															
P.E.		da definire						P.M.		da definire						A.S.		da definire																																																																			
ATTIVITA'		2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017																																																											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																																				
	APPROVAZIONE																																																																																				
	APPALTO																																																																																				
	REALIZZAZIONE																																																																																				
COLLAUDI																																																																																					
						€ 8.511.000				€ 9.875.000				€ 7.530.000				€ 6.230.000				€ 3.020.000				€ 2.550.000																																																											


Legenda

 = Progettazione

 = Approvazione

 = Appalto

 = Realizzazione

 = Collaudi

Riunione: Scheda C
 Data monitoraggio:
AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INFRASTRUTTURE CIVILI					N° 6.2
P.E.	da definire	P.M.	da definire	A.S.	da definire	

	ATTIVITA'	2011					2012					2013					2014					2015					2016					2017																																																			
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																																		
	APPROVAZIONE																																																																																		
	APPALTO																																																																																		
	REALIZZAZIONE																																																																																		
	COLLAUDI																																																																																		
							€ 4.154.150					€ 2.600.000					€ 2.475.000					€ 2.475.000					€ 2.375.000					€ 2.375.000																																																			


Legenda = Progettazione = Approvazione = Appalto = Realizzazione = Collaudi

Riunione: Data monitoraggio:												Scheda C																																																																																					
AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA																																																																																																	
OPERA		MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTI SPECIALI E VARIE																						N° 6.2																																																																									
P.E.		da definire						P.M.		da definire						A.S.		da definire																																																																															
ATTIVITA'		2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017																																																																							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																																																
	APPROVAZIONE																																																																																																
	APPALTO																																																																																																
	REALIZZAZIONE																																																																																																
	COLLAUDI																																																																																																
		€ 2.960.000						€ 8.825.000						€ 13.845.000						€ 2.555.000						€ 3.300.000						€ 3.155.000																																																																	


Legenda

 = Progettazione

 = Approvazione

 = Appalto

 = Realizzazione


 = Collaudi

Riunione: Data monitoraggio:												Scheda C																																																																																					
AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA																																																																																																	
OPERA		INTERVENTI PER L'ENERGY SAVING E FONTI ALTERNATIVE																						N° 6.2																																																																									
P.E.		da definire						P.M.		da definire						A.S.		da definire																																																																															
ATTIVITA'		2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017																																																																							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																																																
	APPROVAZIONE																																																																																																
	APPALTO																																																																																																
REALIZZAZIONE																																																																																																	
COLLAUDI																																																																																																	
		€ 60.000						€ 8.932.800						€ 3.550.000						€ 2.300.000						€ 1.620.000						€ 2.100.000																																																																	


Legenda

 = Progettazione

 = Approvazione

 = Appalto

 = Realizzazione

 = Collaudi

Riunione: Data monitoraggio:												Scheda C																																																																									
AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA																																																																																					
OPERA		MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PISTE DI VOLO NUOVA RETE ELETTRICA																						N° 6.2																																																													
P.E.		da definire						P.M.		da definire						A.S.		da definire																																																																			
ATTIVITA'		2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017																																																											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																																				
	APPROVAZIONE																																																																																				
	APPALTO																																																																																				
REALIZZAZIONE																																																																																					
COLLAUDI																																																																																					
		€ 1.100.000				€ 1.400.000				€ 6.770.000				€ 9.500.000				€ 8.400.000																																																																			

Legenda

= Progettazione

= Approvazione

= Appalto

= Realizzazione


= Collaudi

Riunione: Data monitoraggio:												Scheda C																																																																									
AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA																																																																																					
OPERA		MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CABINA AT/MT																				N° 6.2																																																															
P.E.		da definire				P.M.		da definire				A.S.		da definire																																																																							
ATTIVITA'		2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017																																																											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																																				
	APPROVAZIONE																																																																																				
	APPALTO																																																																																				
REALIZZAZIONE																																																																																					
COLLAUDI																																																																																					
						€ 1.000.000				€ 5.000.000				€ 4.000.000				€ 2.500.000																																																																			


Legenda

 = Progettazione

 = Approvazione


 = Appalto

 = Realizzazione

 = Collaudi

Riunione: Scheda C
 Data monitoraggio:
AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA	PARCO AMBIENTALE					N° 6.1		
P.E.	da definire		P.M.	da definire		A.S.	da definire	

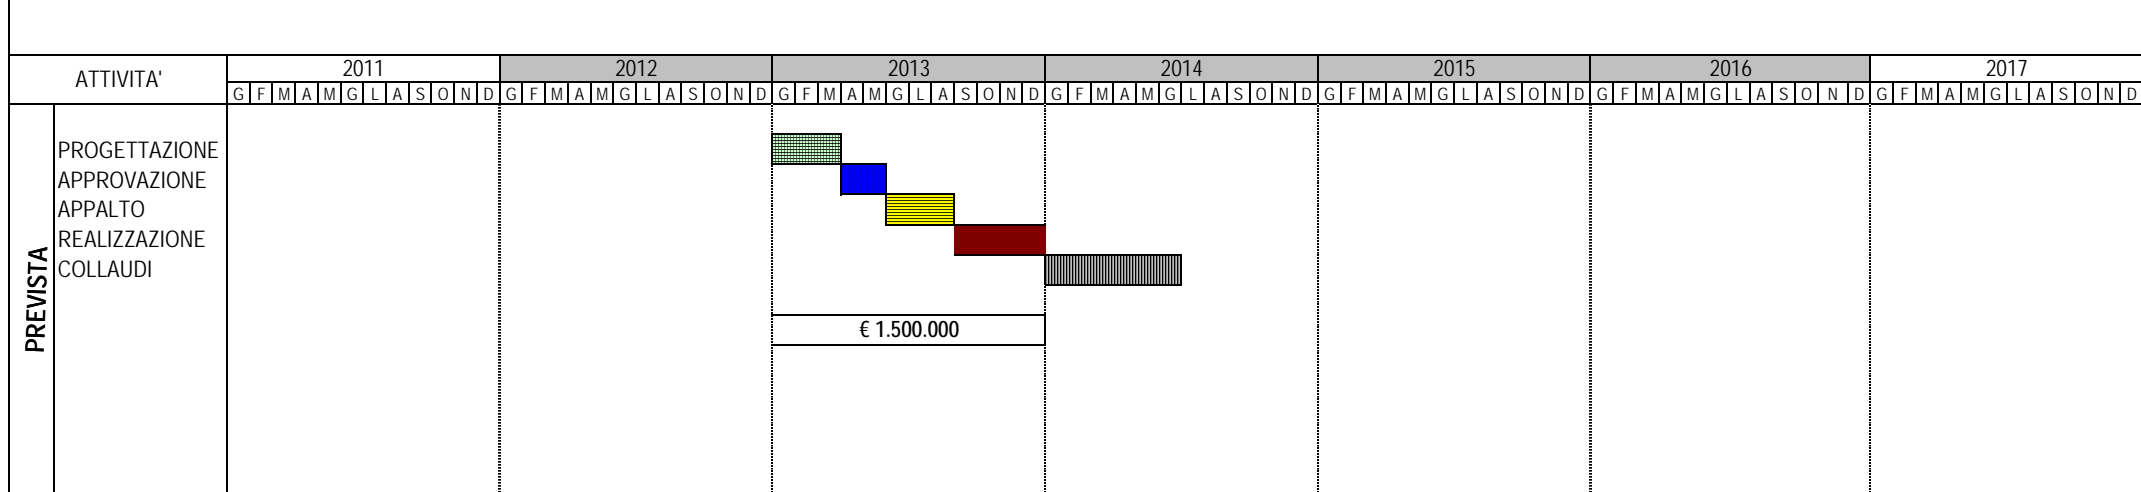

Legenda ■ = Progettazione ■ = Approvazione ■ = Appalto ■ = Realizzazione ■ = Collaudi

Riunione: Scheda C
 Data monitoraggio:

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA	Sviluppo sistemi operativi di scalo : a) controllo accessi; b) evoluzione applicazioni CDM Land side/Air side; c) Evoluzione sistema di informativa al pubblico; d) Evoluzione applicazioni ed infrastrutture Fids/Banchi check in/Gates ESECUZIONE CONTINUATIVA	N° 6.2-6.3
--------------	--	------------

P.E.	da definire	P.M.	Andrea Pontecorvo	A.S.	da definire
-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------

	ATTIVITA'	2011					2012					2013					2014					2015					2016					2017																											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																										
	APPROVAZIONE																																																										
	APPALTO																																																										
	REALIZZAZIONE																																																										
	COLLAUDI																																																										
		€ 662.000					€ 519.000					€ 740.000					€ 1.285.000					€ 917.000					€ 1.140.000					€ 1.180.000																											

Legenda = Progettazione = Approvazione = Appalto = Realizzazione = Collaudi

Riunione: Scheda C
 Data monitoraggio:

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA	Infrastrutture tecnologiche ICT (reti TLC/Ced/Licenze) : a) Rete TLC - eliminazione "single point of failure"; b) Evoluzioni ed upgrading infrastrutturali ed applicativi; c) Evoluzione architettura infrastrutturale ed applicativa CUTE; d) Evoluzione architettura infrastrutturale ed applicativa (SOA) ESECUZIONE CONTINUATIVA	N° 6.2-6.3
--------------	---	------------

P.E.	da definire	P.M.	Andrea Pontecorvo	A.S.	da definire
-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
--	------	------	------	------	------	------	------

	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

	ATTIVITA'	2011												2012												2013												2014												2015												2016												2017											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																																				
	APPROVAZIONE																																																																																				
	APPALTO																																																																																				
	REALIZZAZIONE																																																																																				
	COLLAUDI																																																																																				
		€ 1.600.000												€ 1.241.000												€ 800.000												€ 920.000												€ 1.305.000												€ 1.385.000												€ 1.436.000											

Legenda = Progettazione = Approvazione = Appalto = Realizzazione = Collaudi

Riunione: Scheda C
 Data monitoraggio:

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA	Sviluppo sistemi gestionali : a) Integrazione e revisione sistemi a supporto dei processi; b) Evoluzione sistema parcheggi; c) Piattaforma esercizio ICT e monitoraggio applicativo; d) Sviluppo sistemi gestionali; e) Evoluzione sistemi gestionali ESECUZIONE CONTINUATIVA	N° 6.2-6.3
--------------	---	------------

P.E.	da definire	P.M.	Andrea Pontecorvo	A.S.	da definire
-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------

	ATTIVITA'	2011					2012					2013					2014					2015					2016					2017																																																			
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																																		
	APPROVAZIONE																																																																																		
	APPALTO																																																																																		
	REALIZZAZIONE																																																																																		
	COLLAUDI																																																																																		
		€ 1.790.000					€ 790.000					€ 1.820.000					€ 1.885.000					€ 1.975.000					€ 1.670.000					€ 1.730.000																																																			

Legenda = Progettazione = Approvazione = Appalto = Realizzazione = Collaudi

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		OPERE PROPEDEUTICHE UTILIZZO AREE DI ESPANSIONE FIUMICINO				N° 1.1	
P.E.	da definire	P.M.	da definire	A.S.	da definire		
SCHEDA PROGETTO							
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 30/09/2015	Entro il 01/04/2016		Entro il 31/12/2020		
	PRE	DEF	ES				
DATI DI AVANZAMENTO							

STANZIAMENTO PREVISTO €	41.927.977
-------------------------	-------------------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
----------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA:		MASTERPLAN + STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE				N° 1.2
P.E.	da definire	P.M.	da definire	A.S.	da definire	
SCHEDA PROGETTO						
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 31/12/2015				
	PRE	DEF	ES			
DATI DI AVANZAMENTO						

STANZIAMENTO PREVISTO €	6.016.000
STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
IMPORTO APPALTATO €	
IMPRESA APPALTATRICE	

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		ESPROPRI PER L'ESPANSIONE DI FIUMICINO				N° 1.3
P.E.	da definire	P.M.	da definire	A.S.	da definire	
SCHEDA PROGETTO						
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)					Entro il 31/12/2033	La data fa riferimento all' ultimazione dell'attività degli espropri.
	PRE	DEF	ES			
DATI DI AVANZAMENTO						

STANZIAMENTO PREVISTO €	425.000.370
-------------------------	--------------------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
----------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		AREA OVEST - ISOLA SERAM, NUOVO VARCO DOGANALE			N° 2.1	
P.E.	da definire	P.M.	MARCO IOVACCHINI	A.S.		
SCHEDA PROGETTO						
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 31/03/2014	Entro il 01/09/2015		Entro il 30/06/2016	
	PRE	DEF	ES			
DATI DI AVANZAMENTO						

STANZIAMENTO PREVISTO € 7.248.301

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €

IMPORTO APPALTATO €

IMPRESA APPALTATRICE

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA:		AREA OVEST - AMPLIAMENTO PIAZZALI SOSTA AEROMOBILI 1^ FASE				N° 2.2	
P.E.	da definire	P.M.	NUNZIO D'AURIA		A.S.	da definire	
SCHEDA PROGETTO							
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 31/01/2014 Entro il 30/06/2014	Entro il 01/08/2014 Entro il 01/01/2015		Entro il 31/12/2014 Entro il 31/01/2016	Fase 1 di 2	
	PRE	DEF	ES				
DATI DI AVANZAMENTO							

STANZIAMENTO PREVISTO € 23.529.882

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €

IMPORTO APPALTATO €

IMPRESA APPALTATRICE

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		AREA OVEST - AMPLIAMENTO PIAZZALI SOSTA AEROMOBILI 2^ FASE				N° 2.2
P.E.	da definire	P.M.	NUNZIO D'AURIA	A.S.	da definire	
SCHEDA PROGETTO						
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 30/04/2015	Entro il 01/11/2015		Entro il 30/06/2017	Fase 2 di 2
	PRE	DEF	ES			
DATI DI AVANZAMENTO						

STANZIAMENTO PREVISTO €	30.284.317
-------------------------	-------------------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
----------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA:		4^ PISTA-VIA DI RULLAGGIO-PERIMETRALE-RETI PRIMARIE				N° 2.3	
P.E.	da definire	P.M.	NUNZIO D'AURIA		A.S.	da definire	
SCHEDA PROGETTO							
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 30/09/2016 Entro il 30/06/2017	Entro il 01/06/2017 Entro il 01/02/2018		Entro il 31/03/2019 Entro il 31/08/2019	N3 - 4^ Pista -via di rullaggio+perimetrale N4 - 4^ Pista-reti primarie	
	PRE	DEF	ES				
DATI DI AVANZAMENTO							

STANZIAMENTO PREVISTO € 155.451.025

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €

IMPORTO APPALTATO €

IMPRESA APPALTATRICE

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		ESTENSIONE PIAZZALI ZONA CARGO					N° 2.4	
P.E.	da definire	P.M.	NUNZIO D'AURIA		A.S.	da definire		
SCHEDA PROGETTO								
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE		
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 30/09/2016	Entro il 01/04/2017		Entro il 31/03/2018			
	PRE	DEF	ES					
DATI DI AVANZAMENTO								

STANZIAMENTO PREVISTO €	7.501.310
-------------------------	------------------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
----------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		COMPLETAMENTO RADDOPPIO TWY BRAVO					N° 2.5	
P.E.	da definire	P.M.	NUNZIO D'AURIA		A.S.	da definire		
SCHEDA PROGETTO								
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE		
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 31/03/2015	Entro il 01/11/2015		Entro il 31/12/2017			
	PRE	DEF	ES					
DATI DI AVANZAMENTO								

STANZIAMENTO PREVISTO €	49.190.150
STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
IMPORTO APPALTATO €	
IMPRESA APPALTATRICE	

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		ESTENSIONE PIAZZALI EX AREA TECNICA AZ					N° 2.6	
P.E.	da definire	P.M.	NUNZIO D'AURIA		A.S.	da definire		
SCHEDA PROGETTO								
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE		
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 31/12/2015	Entro il 01/07/2016		Entro il 30/06/2017			
	PRE	DEF	ES					
DATI DI AVANZAMENTO								

STANZIAMENTO PREVISTO €	12.226.716
-------------------------	-------------------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
----------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		RIPROTEZIONE PIAZZOLA PROVA MOTORI					N° 2.7	
P.E.	da definire	P.M.	NUNZIO D'AURIA		A.S.	da definire		
SCHEDA PROGETTO								
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE		
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 31/01/2016	Entro il 01/07/2016		Entro il 28/02/2017			
	PRE	DEF	ES					
DATI DI AVANZAMENTO								

STANZIAMENTO PREVISTO €	2.123.061
-------------------------	-----------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
----------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		PISTA 2/TWY INDIA - RIQUALIFICA E NORMATIVA					N° 2.8	
P.E.	da definire	P.M.	NUNZIO D'AURIA		A.S.	da definire		
SCHEDA PROGETTO								
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE		
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 07/05/2009	Entro il 01/12/2011		Entro il 31/10/2012			
	PRE	DEF	ES					
DATI DI AVANZAMENTO								

STANZIAMENTO PREVISTO €	26.864.000
STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
IMPORTO APPALTATO €	
IMPRESA APPALTATRICE	

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		RIQUALIFICA TWY CHARLIE					N° 2.9	
P.E.	da definire	P.M.	NUNZIO D'AURIA		A.S.	da definire		
SCHEDA PROGETTO								
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE		
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 31/12/2011	Entro il 01/07/2012		Entro il 31/10/2012			
	PRE	DEF	ES					
DATI DI AVANZAMENTO								

STANZIAMENTO PREVISTO €	4.441.000
STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
IMPORTO APPALTATO €	
IMPRESA APPALTATRICE	

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		RIQUALIFICA PISTA 3					N° 2.10	
P.E.	da definire	P.M.	NUNZIO D'AURIA		A.S.	da definire		
SCHEDA PROGETTO								
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE		
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 31/12/2012	Entro il 01/07/2013		Entro il 31/12/2014			
	PRE	DEF	ES					
DATI DI AVANZAMENTO								

STANZIAMENTO PREVISTO €	61.145.000
-------------------------	------------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
----------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		NUOVI PIAZZALI IN AREA PIANABELLA					N° 2.11	
P.E.	da definire	P.M.	NUNZIO D'AURIA		A.S.	da definire		
SCHEDA PROGETTO								
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE		
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 29/06/2018	Entro il 01/01/2019		Entro il 31/12/2020			
	PRE	DEF	ES					
DATI DI AVANZAMENTO								

STANZIAMENTO PREVISTO €	28.850.345
-------------------------	------------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
----------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		ESTENSIONE PIAZZALI AA/MM IN AREA EX POSTE - QUADRANTE 200				N° 2.12	
P.E.	da definire	P.M.	NUNZIO D'AURIA		A.S.	da definire	
SCHEDA PROGETTO							
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 30/06/2016	Entro il 01/02/2017		Entro il 30/11/2018		
	PRE	DEF	ES				
DATI DI AVANZAMENTO							

STANZIAMENTO PREVISTO €	12.899.365
STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
IMPORTO APPALTATO €	
IMPRESA APPALTATRICE	

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		ADEGUAMENTO STRIP 16C/34C					N° 2.13	
P.E.	da definire	P.M.	NUNZIO D'AURIA		A.S.	da definire		
SCHEMA PROGETTO								
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE		
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 28/02/2012	Entro il 01/09/2012		Entro il 31/03/2013			
	PRE	DEF	ES					
DATI DI AVANZAMENTO								

STANZIAMENTO PREVISTO €	6.745.000
-------------------------	------------------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
----------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		NUOVA IDROVORA DI FOCENE				N° 2.17
P.E.	da definire	P.M.	da definire	A.S.	da definire	
SCHEDA PROGETTO						
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 31/03/2017	Entro il 01/10/2017		Entro il 31/12/2019	
	PRE	DEF	ES			
DATI DI AVANZAMENTO						

STANZIAMENTO PREVISTO €	6.938.273
-------------------------	-----------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
----------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		RIPROTEZIONE PALAZZINE MU E DEMOLIZIONI					N° 3.1	
P.E.	da definire	P.M.	LUCIANO VALENTE		A.S.	da definire		
SCHEDA PROGETTO								
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE		
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 31/08/2016	Entro il 01/02/2017		Entro il 31/12/2017			
	PRE	DEF	ES					
DATI DI AVANZAMENTO								

STANZIAMENTO PREVISTO €	11.662.565
STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
IMPORTO APPALTATO €	
IMPRESA APPALTATRICE	

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		AEROSTAZIONE T4 ED AREA DI IMBARCO J					N° 3.2	
P.E.	da definire	P.M.	LUCIANO VALENTE		A.S.	da definire		
SCHEDA PROGETTO								
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE		
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 31/05/2017	Entro il 01/01/2018		Entro il 30/06/2021			
	PRE	DEF	ES					
DATI DI AVANZAMENTO								

STANZIAMENTO PREVISTO €	178.056.342
-------------------------	--------------------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
----------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		T3 AMPLIAMENTO ZONA ARRIVI E RICONSEGNA BAGAGLI					N° 3.3	
P.E.	da definire	P.M.	LUCIANO VALENTE	A.S.	da definire			
SCHEDA PROGETTO								
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE		
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 30/11/2015	Entro il 01/05/2016		Entro il 31/12/2018			
	PRE	DEF	ES					
DATI DI AVANZAMENTO								

STANZIAMENTO PREVISTO €	16.545.563
-------------------------	-------------------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
----------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA:		HUB EST - AREA IMBARCO, AMPLIAMENTO T1 ED AVANCORPO T1, ESTENSIONE PIAZZALI 200				N° 3.4
P.E.		P.M.	LUCIANO VALENTE		A.S.	
SCHEDA PROGETTO						
Piazzali Settore 200		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 30/06/2015	Entro il 01/02/2016		Entro il 30/04/2017	
	PRE	DEF	ES			
DATI DI AVANZAMENTO	X					
Hub Est		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 30/11/2015	Entro il 01/01/2017		Entro il 30/06/2024	
	PRE	DEF	ES			
DATI DI AVANZAMENTO	X					
Riprotezione CBC AZ		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 31/12/2015	Entro il 01/07/2016		Entro il 31/01/2017	
	PRE	DEF	ES			
DATI DI AVANZAMENTO						
Opere propedeutiche Hub Est		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 30/06/2016	Entro il 01/01/2017		Entro il 31/12/2018	
	PRE	DEF	ES			
DATI DI AVANZAMENTO						

STANZIAMENTO PREVISTO €	196.608.457
STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
IMPORTO APPALTATO €	
IMPRESA APPALTATRICE	

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		SISTEMA BAGAGLI HBS BHS EX CARGO AZ - 3° LOTTO			N° 3.6	
P.E.	da definire	P.M.	MARCO IOVACCHINI	A.S.		
SCHEDA PROGETTO						
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 31/03/2013	Entro il 01/10/2013		Entro il 31/10/2015	
	PRE	DEF	ES			
DATI DI AVANZAMENTO						

STANZIAMENTO PREVISTO €	59.396.422
-------------------------	------------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
----------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA:		AREA IMBARCO F E AVANCORPO T3 (compresa quota finanziata dallo Stato)				N° 3.7-3.8
P.E.	da definire	P.M.	LUCIANO VALENTE	A.S.	DOMENICO MELE	
SCHEDA PROGETTO						
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		26/08/2003 *	12/03/2008	18%	30/06/2016	
	PRE	DEF	ES			
DATI DI AVANZAMENTO		X	X **			

STANZIAMENTO PREVISTO	€ 300.117.896
STANZIAMENTO AUTORIZZATO ****	€ 165.333.213,18
IMPORTO APPALTATO	€ 165.333.213,18
IMPRESA APPALTATRICE	A.T.I. Cimolai

Note * Data approvazione Progetto Definitivo da parte di Enac

** Progettazione redatta dall'Impresa Appaltatrice successivamente all'aggiudicazione dell'appalto

*** Percentuale di avanzamento lavori stimata a fine settembre c.a., comprensiva delle spese di progettazione definitiva, progettazione esecutiva redatta dall'Impresa e D.L.

**** Importo contrattuale più perizie di variante (ultimo atto aggiuntivo n° 4 del 21/09/2010)

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		FIUMICINO NORD - AEROSTAZIONE PASSEGGERI				N° 3.9	
P.E.	da definire	P.M.	da definire	A.S.	da definire		
SCHEMA PROGETTO							
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 31/07/2022	Entro il 01/03/2020		Entro il 31/03/2026		
	PRE	DEF	ES				
DATI DI AVANZAMENTO							

STANZIAMENTO PREVISTO €	2.980.243.514
-------------------------	----------------------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
----------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		INTERVENTI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO DEL SEDIME - 1^ FASE			N° 4.2	
P.E.	da definire	P.M.	MARCO IOVACCHINI	A.S.		
SCHEDA PROGETTO						
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 30/09/2013	Entro il 01/11/2013		Entro il 30/06/2015	
	PRE	DEF	ES			
DATI DI AVANZAMENTO						

STANZIAMENTO PREVISTO €	962.536
-------------------------	---------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
----------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		VIABILITA' - SVINCOLO AREA EST CARGO CITY				N° 4.3
P.E.	da definire	P.M.	MARCO IOVACCHINI	A.S.		
SCHEDA PROGETTO						
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 30/10/2014	Entro il 01/05/2015		Entro il 30/06/2016	
	PRE	DEF	ES			
DATI DI AVANZAMENTO						

STANZIAMENTO PREVISTO € 4.441.998

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €

IMPORTO APPALTATO €

IMPRESA APPALTATRICE

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		PALAZZINA DIREZIONALE - NUOVA SEDE ADR				N° 4.4
P.E.	da definire	P.M.	MARCO IOVACCHINI	A.S.		
SCHEDA PROGETTO						
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 30/06/2016	Entro il 01/01/2017		Entro il 31/12/2019	
	PRE	DEF	ES			
DATI DI AVANZAMENTO						

STANZIAMENTO PREVISTO € 23.132.149

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €

IMPORTO APPALTATO €

IMPRESA APPALTATRICE

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		AMPLIAMENTO PARK A RASO PER ADDETTI AREA CENTRALE			N° 4.5	
P.E.	da definire	P.M.	MARCO IOVACCHINI	A.S.		
SCHEDA PROGETTO						
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 30/06/2012	Entro il 01/01/2013		Entro il 31/12/2013	
	PRE	DEF	ES			
DATI DI AVANZAMENTO						

STANZIAMENTO PREVISTO €	658.450
-------------------------	---------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
----------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		PEOPLE MOVER - GRTS				N° 4.6
P.E.	da definire	P.M.	da definire	A.S.	da definire	
SCHEMA PROGETTO						
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 30/11/2014	Entro il 01/07/2015		Entro il 28/02/2020	I DATI SI RIFERISCONO ALLA FASE 1
	PRE	DEF	ES			
DATI DI AVANZAMENTO						

STANZIAMENTO PREVISTO €	215.911.043
-------------------------	--------------------

Valore complessivo della 1^ e 2^ Fase
2^ Fase: DATA CONSEGNA LAVORI - 1/03/2020, DATA PREV. ULTIMAZIONE - 31/03/2026

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
----------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		PARCHEGGI A RASO AREA EST				N° 5.1
P.E.	da definire	P.M.	MARCO IOVACCHINI	A.S.		
SCHEDA PROGETTO						
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 31/01/2014	Entro il 01/07/2014		Entro il 31/12/2014	
	PRE	DEF	ES			
DATI DI AVANZAMENTO						

STANZIAMENTO PREVISTO € 2.254.750

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €

IMPORTO APPALTATO €

IMPRESA APPALTATRICE

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		AREA CENTRALE - PARK MULTIPIANO MODULO "F"				N° 5.2
P.E.	da definire	P.M.	MARCO IOVACCHINI	A.S.		
SCHEDA PROGETTO						
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 31/05/2016	Entro il 01/11/2016		Entro il 30/06/2018	
	PRE	DEF	ES			
DATI DI AVANZAMENTO						

STANZIAMENTO PREVISTO €	17.210.426
-------------------------	------------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
----------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		P.LI QUADRANTE 700/800					N° 6.2	
P.E.	da definire	P.M.	NUNZIO D'AURIA		A.S.	da definire		
SCHEDA PROGETTO								
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE		
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 31/12/2011	Entro il 01/07/2012		Entro il 30/11/2012			
	PRE	DEF	ES					
DATI DI AVANZAMENTO								

STANZIAMENTO PREVISTO €	9.780.000
-------------------------	------------------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
----------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		RIQUALIFICA RULLAGGIO A					N° 6.2	
P.E.	da definire	P.M.	NUNZIO D'AURIA		A.S.	da definire		
SCHEDA PROGETTO								
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE		
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 31/10/2011	Entro il 01/05/2012		Entro il 31/10/2012			
	PRE	DEF	ES					
DATI DI AVANZAMENTO								

STANZIAMENTO PREVISTO €	3.122.000
-------------------------	------------------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
----------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		RIQUALIFICA RULLAGGIO BRAVO E DELTA					N° 6.2	
P.E.	da definire	P.M.	NUNZIO D'AURIA		A.S.	da definire		
SCHEDA PROGETTO								
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE		
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 31/08/2011	Entro il 01/11/2011		Entro il 28/02/2012			
	PRE	DEF	ES					
DATI DI AVANZAMENTO								

STANZIAMENTO PREVISTO €	3.104.000
STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
IMPORTO APPALTATO €	
IMPRESA APPALTATRICE	

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		T3 ARRIVI - ADEGUAMENTI INTERNI AEROSTAZIONE					N° 6.1-6.2	
P.E.	CLAUDIO BARBETTA	P.M.	LUCIANO VALENTE	A.S.	da definire			
SCHEDA PROGETTO								
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE		
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 30/06/2012	Entro il 01/11/2012		Entro il 30/06/2013			
	PRE	DEF	ES					
DATI DI AVANZAMENTO	X							

STANZIAMENTO PREVISTO €	2.346.500
STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
IMPORTO APPALTATO €	
IMPRESA APPALTATRICE	

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		T1 e T3 - RISTRUTTURAZIONI SERVIZI IGIENICI E AREE COMUNI					N° 6.1-6.2	
P.E.	CLAUDIO BARBETTA	P.M.	LUCIANO VALENTE	A.S.	da definire			
SCHEDA PROGETTO								
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE		
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)			Entro il 01/01/2008		Entro il 31/12/2016			
	PRE	DEF	ES					
DATI DI AVANZAMENTO								

STANZIAMENTO PREVISTO €	6.460.018
-------------------------	------------------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
----------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		REALIZZAZIONE PRESA DI ACQUA INDUSTRIALE DA FIUME TEVERE				N° 6.1	
P.E.	CLAUDIO BARBETTA	P.M.	FABRIZIO BELLEI	A.S.	da definire		
SCHEDA PROGETTO							
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 31/12/2011	Entro il 01/05/2012		Entro il 31/12/2012		
	PRE	DEF	ES				
DATI DI AVANZAMENTO							

STANZIAMENTO PREVISTO €	4.909.350
STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
IMPORTO APPALTATO €	
IMPRESA APPALTATRICE	

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTI ELETTRICI				N° 6.2	
P.E.	da definire	P.M.	da definire	A.S.	da definire		
SCHEDA PROGETTO							
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il __/__/__	Entro il __/__/__		Entro il __/__/__	Rifacimento e ristrutturazioni impianti elettrici e relative cabine di trasformazione al fine di ottenere una diminuzione del numero di microinterruzioni e del numero di black out; questo implica un minor impatto delle conseguenze operative dovute ai guasti sull'intero sistema aeroportuale.	
	PRE	DEF	ES				
DATI DI AVANZAMENTO				CONTINUATIVO			

STANZIAMENTO PREVISTO anno 2012 €	8.520.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2013 €	14.470.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2014 €	12.590.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2015 €	6.790.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2016 €	8.860.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2017 €	3.070.000

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
----------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA:		MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTI CONDIZIONAMENTO ED IDRAULICI				N° 6.2	
P.E.	da definire	P.M.	da definire	A.S.	da definire		
SCHEDA PROGETTO							
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il __/__/__	Entro il __/__/__		Entro il __/__/__	Manutenzione straordinaria e nuove realizzazioni sulla rete idraulica atte a migliorare la qualità e disponibilità dell'acqua industriale e potabile; manutenzioni e ristrutturazioni degli impianti di condizionamento per migliorare il comfort ambientale dei clienti aeroportuali.	
	PRE	DEF	ES				
DATI DI AVANZAMENTO				CONTINUATIVO			

STANZIAMENTO PREVISTO anno 2012 €	10.440.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2013 €	16.005.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2014 €	7.325.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2015 €	7.365.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2016 €	7.690.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2017 €	4.235.000

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
----------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA:		MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTI ELETTROMECCANICI				N° 6.2	
P.E.	da definire	P.M.	da definire	A.S.	da definire		
SCHEDA PROGETTO							
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il __/__/__	Entro il __/__/__		Entro il __/__/__	Interventi di modifica e sostituzione degli impianti di trattamento dei bagagli al fine di aumentare i livelli di servizio e la disponibilità; questo al fine di ottimizzare il servizio ai passeggeri ed alle compagnie aeree.	
	PRE	DEF	ES				
DATI DI AVANZAMENTO				CONTINUATIVO			

STANZIAMENTO PREVISTO anno 2012 €	8.511.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2013 €	9.875.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2014 €	7.530.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2015 €	6.230.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2016 €	3.020.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2017 €	2.550.000

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
----------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA:		MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INFRASTRUTTURE CIVILI				N° 6.2	
P.E.	da definire	P.M.	da definire	A.S.	da definire		
SCHEDA PROGETTO							
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il __/__/__	Entro il __/__/__		Entro il __/__/__	Ristrutturazioni architettoniche e riqualifica di natura civile degli edifici, al fine di rendere gli ambienti più gradevoli per i passeggeri e per gli utenti; interventi mirati a ridurre drasticamente i fenomeni di infiltrazioni da acqua piovana.	
	PRE	DEF	ES				
DATI DI AVANZAMENTO				CONTINUATIVO			

STANZIAMENTO PREVISTO anno 2012 €	4.154.150
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2013 €	2.600.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2014 €	2.475.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2015 €	2.475.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2016 €	2.375.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2017 €	2.375.000

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
----------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTI SPECIALI E VARIE				N° 6.2	
P.E.	da definire	P.M.	da definire	A.S.	da definire		
SCHEDA PROGETTO							
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il __/__/__	Entro il __/__/__		Entro il __/__/__	Integrazione degli impianti TVCC esistenti sotto un'unica piattaforma ed implementazione e razionalizzazione degli impianti speciali esistenti al fine di ottimizzare la qualità dei servizi resi a passeggeri, vettori ed Enti di Stato.	
	PRE	DEF	ES				
DATI DI AVANZAMENTO				CONTINUATIVO			

STANZIAMENTO PREVISTO anno 2012 €	2.960.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2013 €	8.825.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2014 €	13.845.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2015 €	2.555.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2016 €	3.300.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2017 €	3.155.000

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
----------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		INTERVENTI PER L'ENERGY SAVING E FONTI ALTERNATIVE				N° 6.2	
P.E.	da definire	P.M.	da definire	A.S.	da definire		
SCHEDA PROGETTO							
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il __/__/__	Entro il __/__/__		Entro il __/__/__	Adozione di sistemi di risparmio energetico e realizzazione di fonti di energia alterantiva al fine di diminuire gli impatti ambientali.	
	PRE	DEF	ES				
DATI DI AVANZAMENTO				CONTINUATIVO			

STANZIAMENTO PREVISTO anno 2012 €	60.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2013 €	8.932.800
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2014 €	3.550.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2015 €	2.300.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2016 €	1.620.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2017 €	2.100.000

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
----------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA:		MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PISTE DI VOLO NUOVA RETE ELETTRICA				N° 6.2
P.E.	da definire	P.M.	da definire	A.S.	da definire	
SCHEDA PROGETTO						
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il __/__/__	Entro il __/__/__		Entro il __/__/__	L'intervento prevede il rifacimento della rete di distribuzione in Media Tensione relativa agli Impianti Aiuti Visivi Luminosi. Attualmente esistono 19 cabina di MT che alimentano gli AVL, ognuna dotata di gruppi di continuità locali; è prevista la realizzazione di due cabine centralizzate e ridondate ai fini di aumentare i livelli di servizio e diminuire i consumi energetici ed i costi manutentivi. Inoltre verranno sostituiti i quadri elettrici ed i cavi di MT.
	PRE	DEF	ES			
DATI DI AVANZAMENTO				CONTINUATIVO		

STANZIAMENTO PREVISTO anno 2011 €	1.100.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2012 €	1.400.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2013 €	6.770.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2014 €	9.500.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2015 €	8.400.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2016 €	
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2017 €	

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
----------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA:		MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CABINE AT/MT				N° 6.2
P.E.	da definire	P.M.	da definire	A.S.	da definire	
SCHEDA PROGETTO						
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il __/__/__	Entro il __/__/__		Entro il __/__/__	L'intervento prevede il completo rifacimento della stazione di trasformazione Alta Tensione - Media Tensione dell'aeroporto di Fiumicino e la sostituzione dei principali quadri di smistamento in Media Tensione. Gli attuali 2 trasformatori AT-MT verranno sostituiti con 8 trasformatori AT-MT al fine di segregare gli effetti dei guasti sulla Media Tensione a zone limitate dell'aeroporto, aumentando l'affidabilità complessiva della rete ed i livelli di servizio agli utenti.
	PRE	DEF	ES			
DATI DI AVANZAMENTO				CONTINUATIVO		

STANZIAMENTO PREVISTO anno 2012 €	1.000.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2013 €	5.000.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2014 €	4.000.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2015 €	2.500.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2016 €	
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2017 €	

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
----------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		PARCO AMBIENTALE					N° 6.1	
P.E.	da definire	P.M.	da definire	A.S.	da definire			
SCHEDA PROGETTO								
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE		
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 31/05/2013	Entro il 01/09/2013		Entro il 31/12/2013			
	PRE	DEF	ES					
DATI DI AVANZAMENTO								

STANZIAMENTO PREVISTO €	1.500.000
-------------------------	------------------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
----------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA:		SVILUPPO SISTEMI OPERATIVI DI SCALO				N° 6.2-6.3	
P.E.	da definire	P.M.	ANDREA PONTECORVO	A.S.	da definire		
SCHEDA PROGETTO							
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il __/__/__	Entro il __/__/__		Entro il __/__/__		
	PRE	DEF	ES				
DATI DI AVANZAMENTO			X	CONTINUATIVO			

STANZIAMENTO PREVISTO anno 2011 €	662.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2012 €	519.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2013 €	740.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2014 €	1.285.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2015 €	917.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2016 €	1.140.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2017 €	1.180.000

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
----------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA:		EVOLUZIONE E RINNOVO TECNOLOGICO INFRASTRUTTURE ICT				N° 6.2-6.3
P.E.	da definire	P.M.	ANDREA PONTECORVO	A.S.	da definire	
SCHEDA PROGETTO						
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il __/__/__	Entro il __/__/__		Entro il __/__/__	
	PRE	DEF	ES			
DATI DI AVANZAMENTO			X	CONTINUATIVO		

STANZIAMENTO PREVISTO anno 2011 €	1.600.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2012 €	1.241.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2013 €	800.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2014 €	920.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2015 €	1.305.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2016 €	1.385.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2017 €	1.436.000
STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
IMPORTO APPALTATO €	
IMPRESA APPALTATRICE	

AEROPORTO L. DA VINCI - FIUMICINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA


OPERA:		SVILUPPO SISTEMI GESTIONALI				N° 6.2-6.3	
P.E.	da definire	P.M.	ANDREA PONTECORVO	A.S.	da definire		
SCHEDA PROGETTO							
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il __/__/__	Entro il __/__/__		Entro il __/__/__		
	PRE	DEF	ES				
DATI DI AVANZAMENTO			X	CONTINUATIVO			

STANZIAMENTO PREVISTO anno 2011 €	1.790.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2012 €	790.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2013 €	1.820.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2014 €	1.885.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2015 €	1.975.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2016 €	1.670.000
STANZIAMENTO PREVISTO anno 2017 €	1.730.000
STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
IMPORTO APPALTATO €	
IMPRESA APPALTATRICE	

CRONOPROGRAMMA


PROGETTO		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D
	INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO							
C.1	CIA - RIQUALIFICA SISTEMA AIR SIDE							
C.2	CIA-MANUTENZ.STRAORD.RULLAGGIO SB							
C.3	CIA-MANUTENZ.STRAORD.SUPERFICI PISTA 15/33							
	INTERVENTI TERMINAL							
C.5	CIA - TERMINAL AVIAZIONE COMMERCIALE E GENERALE							
	ALTRI INTERVENTI							
C.6/C.9	REVISIONE NASTRI ARRIVI E PARTENZE							
C.6/C.9	RIQUALIFICA SERVIZI IGENICI							
C.6/C.9	RIQUALIFICA VIABILITÀ ESTERNA							
C.7	CIA - RICONFIGURAZIONE AEROP. DA MILITARE A CIVILE							

LEGENDA


 Fincatura larga = pianificazione originaria

 = Progettazione

 = Approvazione

 = Appalto


 = Realizzazione

 = Collaudo

 Fincatura stretta = avanzamento effettivo

CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC - ADR 2012/2021

AEROPORTO DI CIAMPINO

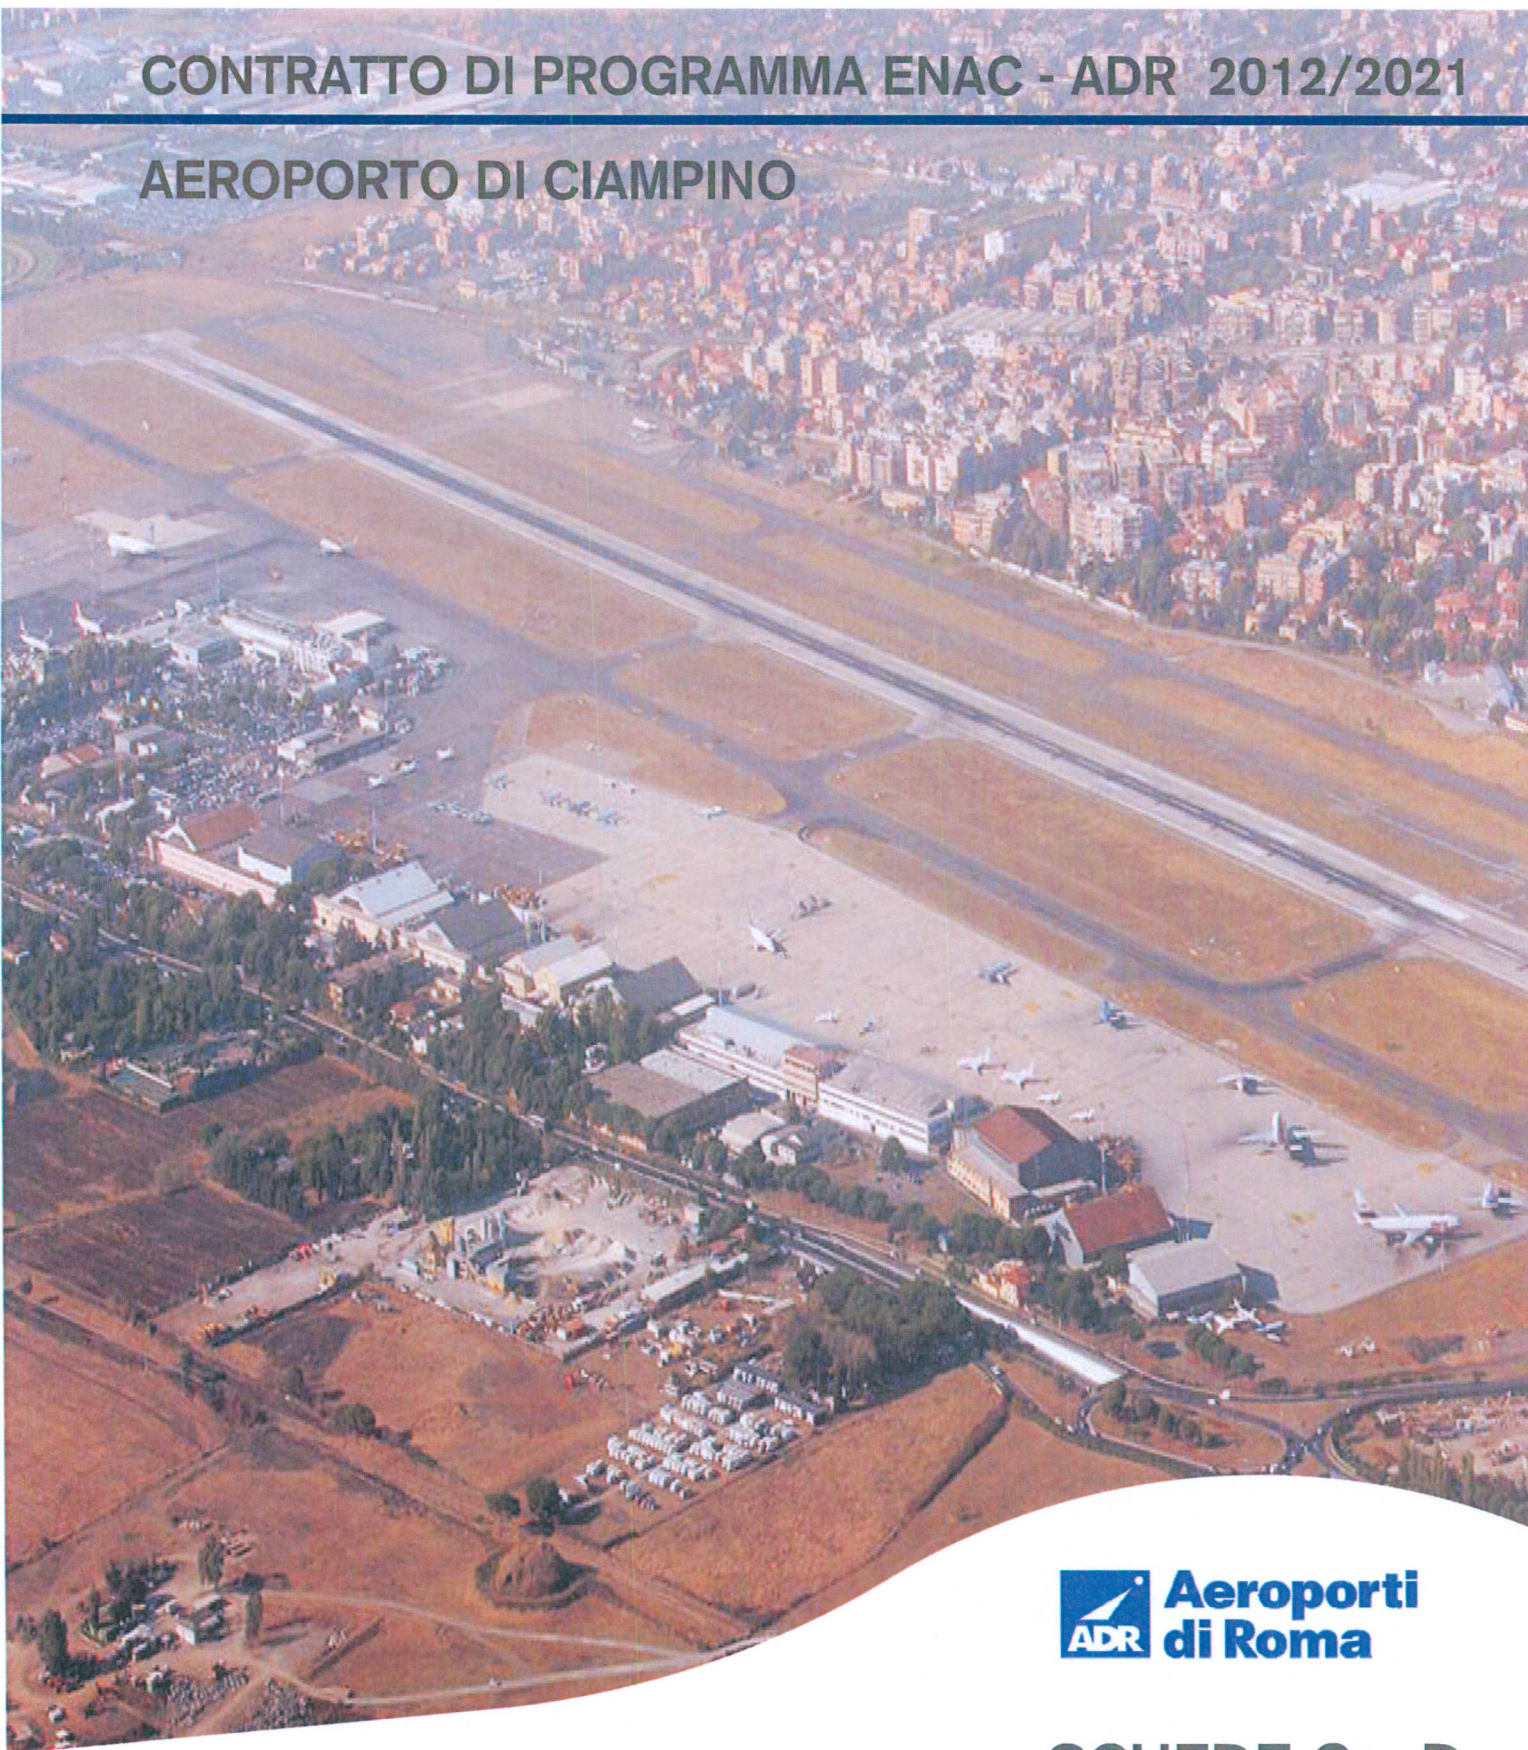

 **Aeroporti
di Roma**

SCHEDE C e D

DIRETTORE INFRASTRUTTURE
GIORGIO GREGORI

Il Direttore Infrastrutture
(Ing. Giorgio Gregori)

 **ENAC**

POST HOLDER PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E SISTEMI
PAOLO CAMBULA

**Post Holder Progettazione
Infrastrutture e Sistemi**

Paolo Cambula

 **MIT**

Novembre 2011

Riunione:												Scheda C																																																																																					
Data monitoraggio:												AEROPORTO G. B. PASTINE - CIAMPINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA																																																																																					
OPERA		RIQUALIFICA SISTEMA AIRSIDE																		N° C.1																																																																													
P.E.		da definire						P.M.			NUNZIO D'AURIA			A.S.			da definire																																																																																
ATTIVITA'		2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017																																																																							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																																																
	APPROVAZIONE																																																																																																
	APPALTO																																																																																																
	REALIZZAZIONE																																																																																																
	COLLAUDI																																																																																																
		€ 531.523																																																																																															

Legenda



= Progettazione



= Approvazione



= Appalto



= Realizzazione



= Collaudi

Nota

La fasizzazione dei lavori sarà integrata e correlata alla disponibilità delle altre infrastrutture del sistema aeroportuale romano atte ad ospitare il traffico di Aviazione Commerciale operante su Ciampino. Pertanto i lavori sulle infrastrutture avranno inizio contestualmente all'attivazione del nuovo scalo di Viterbo (2019). Alla riapertura dello scalo sarà attuata la riconversione come City airport.

Riunione: Scheda C
 Data monitoraggio:
AEROPORTO G. B. PASTINE - CIAMPINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA


OPERA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RULLAGGIO SB					N° C.2
P.E.	da definire	P.M.	NUNZIO D'AURIA	A.S.	da definire	

	ATTIVITA'	2011					2012					2013					2014					2015					2016					2017																																																			
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O
PREVISTA	PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO REALIZZAZIONE COLLAUDI																																																																																		
		€ 1.005.025																																																																																	

Legenda = Progettazione = Approvazione = Appalto = Realizzazione = Collaudi

Riunione: Scheda C
 Data monitoraggio:
AEROPORTO G. B. PASTINE - CIAMPINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUPERFICI PISTA 15/33					N° C.3
P.E.	da definire	P.M.	NUNZIO D'AURIA	A.S.	da definire	

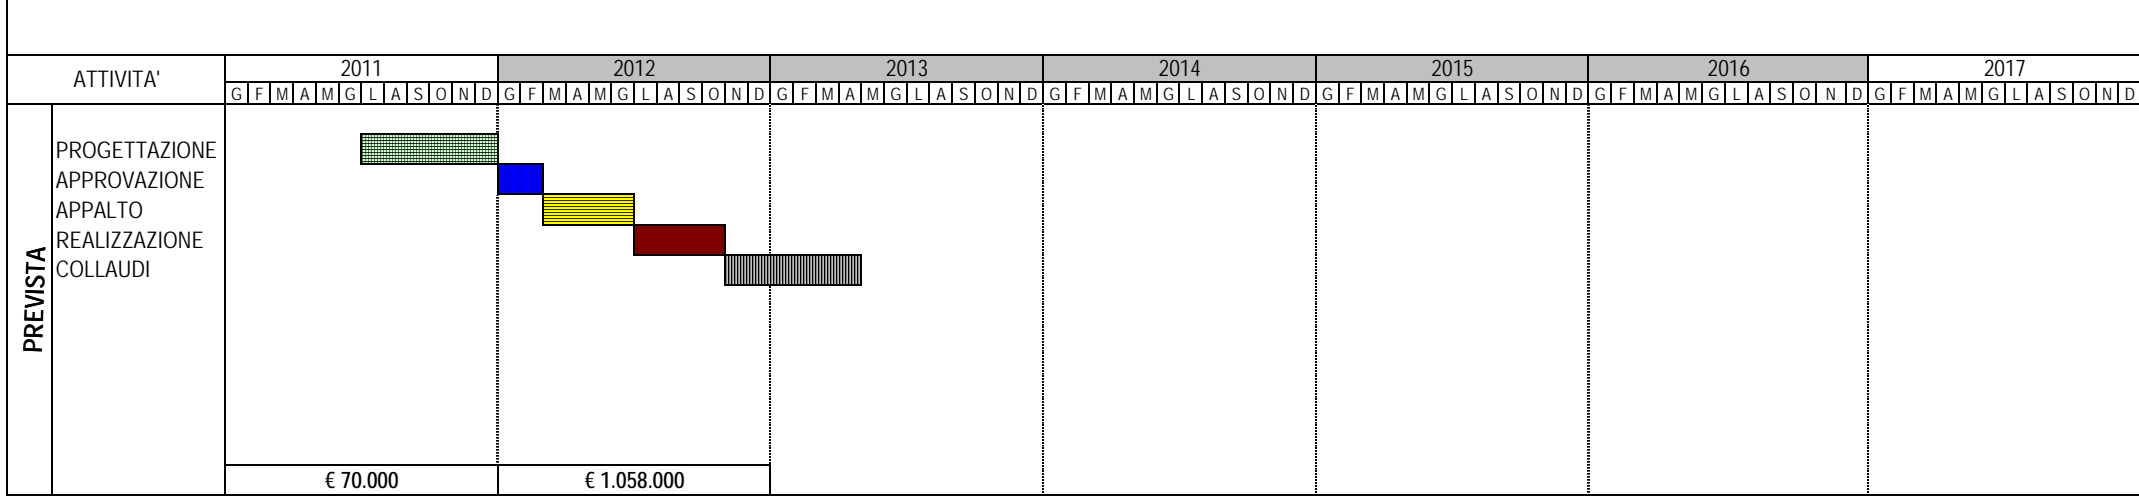

Legenda ▒ = Progettazione ■ = Approvazione ▨ = Appalto ■ = Realizzazione ▤ = Collaudi

Riunione:
Data monitoraggio:

Scheda C

AEROPORTO G. B. PASTINE - CIAMPINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA		TERMINAL AVIAZIONE COMMERCIALE E GENERALE												N° C.5																																																																					
P.E.		da definire				P.M.				da definire				A.S.				da definire																																																																	
ATTIVITA'	2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017																																																										
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
PREVISTA	PROGETTAZIONE																	■																																																																	
	APPROVAZIONE																					■																																																													
	APPALTO																					■																																																													
	REALIZZAZIONE																									■				■																																																					
	COLLAUDI																													■																																																					
																		€ 1.000.000				€ 7.544.393				€ 15.316.654																																																									

Legenda ■ = Progettazione ■ = Approvazione ■ = Appalto ■ = Realizzazione ■ = Collaudi

Nota La fasizzazione dei lavori sarà integrata e correlata alla disponibilità delle altre infrastrutture del sistema aeroportuale romano atte ad ospitare il traffico di Aviazione Commerciale operante su Ciampino. Pertanto i lavori sulle infrastrutture saranno strettamente correlati all'attivazione del nuovo scalo di Viterbo (2019). Alla riapertura dello scalo sarà attuata la riconversione come City airport.

Riunione: Scheda C
 Data monitoraggio:
AEROPORTO G. B. PASTINE - CIAMPINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA


OPERA	RICONFIGURAZIONE AEROPORTO DA MILITARE A CIVILE					N° C.7
P.E.	da definire	P.M.	CLAUDIO PEDE	A.S.	da definire	

	ATTIVITA'	2011					2012					2013					2014					2015					2016					2017																																							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																						
	APPROVAZIONE																																																																						
	APPALTO																																																																						
	REALIZZAZIONE																																																																						
	COLLAUDI																																																																						
												€ 2.500.000					€ 2.500.000					€ 3.000.000																																																	

Legenda = Progettazione = Approvazione = Appalto = Realizzazione = Collaudi

Riunione: Scheda C
 Data monitoraggio:
AEROPORTO G. B. PASTINE - CIAMPINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA	REVISIONE NASTRI ARRIVI E PARTENZE					N° C.6/C.9
P.E.	da definire	P.M.	CLAUDIO PEDE	A.S.	da definire	

	ATTIVITA'	2011					2012					2013					2014					2015					2016					2017																																																			
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																																		
	APPROVAZIONE																																																																																		
	APPALTO																																																																																		
	REALIZZAZIONE																																																																																		
	COLLAUDI																																																																																		
		€ 150.000					€ 150.000					€ 150.000					€ 150.000																																																																		

Legenda  = Progettazione  = Approvazione  = Appalto  = Realizzazione  = Collaudi

Riunione: Scheda C
 Data monitoraggio:
AEROPORTO G. B. PASTINE - CIAMPINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA	RIQUALIFICA SERVIZI IGENICI				N° C.6/C.9
P.E.	da definire	P.M.	CLAUDIO PEDE	A.S.	da definire

	ATTIVITA'	2011					2012					2013					2014					2015					2016					2017																																							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																						
	APPROVAZIONE																																																																						
	APPALTO																																																																						
	REALIZZAZIONE																																																																						
	COLLAUDI																																																																						
		Fase 1					Fase 2					Fase 3					Fase 4																																																						
		€ 150.000					€ 100.000					€ 75.000					€ 75.000																																																						

Legenda = Progettazione = Approvazione = Appalto = Realizzazione = Collaudi

Riunione: Scheda C
 Data monitoraggio:
AEROPORTO G. B. PASTINE - CIAMPINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA	RIQUALIFICA VIABILITÀ ESTERNA					N° C.6/C.9
P.E.	da definire		P.M.	CLAUDIO PEDE	A.S.	da definire

	ATTIVITA'	2011					2012					2013					2014					2015					2016					2017							
		G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M	A	M	G	F	M
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																						
	APPROVAZIONE																																						
	APPALTO																																						
	REALIZZAZIONE																																						
	COLLAUDI																																						
		€ 100.000					€ 200.000																																

Legenda = Progettazione = Approvazione = Appalto = Realizzazione = Collaudi

AEROPORTO G. B. PASTINE - CIAMPINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		RIQUALIFICA SISTEMA AIRSIDE					N° C.1	
P.E.	da definire	P.M.	NUNZIO D'AURIA		A.S.	da definire		
SCHEDA PROGETTO								
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE		
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 28/02/2017	Entro il 01/11/2019		Entro il 31/03/2020			
	PRE	DEF	ES					
DATI DI AVANZAMENTO								

STANZIAMENTO PREVISTO €	11.268.219
-------------------------	------------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
----------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

AEROPORTO G. B. PASTINE - CIAMPINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		MANUTENZIONE STRAORD. RULLAGGIO SB				N° C.2	
P.E.	da definire	P.M.	NUNZIO D'AURIA	A.S.	da definire		
SCHEDA PROGETTO							
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 23/12/2009	Entro il 01/12/2010		Entro il 30/04/2011		
	PRE	DEF	ES				
DATI DI AVANZAMENTO							

STANZIAMENTO PREVISTO €	1.051.052
-------------------------	-----------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
----------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

AEROPORTO G. B. PASTINE - CIAMPINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		MANUTENZIONE STRAORD. SUPERFICI PISTA 15/33				N° C.3	
P.E.	da definire	P.M.	NUNZIO D'AURIA	A.S.	da definire		
SCHEDA PROGETTO							
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 28/02/2012	Entro il 01/07/2012		Entro il 31/10/2012		
	PRE	DEF	ES				
DATI DI AVANZAMENTO							

STANZIAMENTO PREVISTO €	1.128.000
-------------------------	-----------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
----------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

AEROPORTO G. B. PASTINE - CIAMPINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		TERMINAL AVIAZIONE COMMERCIALE E GENERALE				N° C.5	
P.E.	da definire	P.M.	da definire	A.S.	da definire		
SCHEDA PROGETTO							
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il 30/04/2016	01/11/2016		Entro il 31/12/2020		
	PRE	DEF	ES				
DATI DI AVANZAMENTO							

STANZIAMENTO PREVISTO €	51.519.193
-------------------------	------------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
----------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

AEROPORTO G. B. PASTINE - CIAMPINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		RICONFIGURAZIONE AEROPORTO DA MILITARE A CIVILE				N° C.7	
P.E.	da definire	P.M.	CLAUDIO PEDE	A.S.	da definire		
SCHEDA PROGETTO							
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)			Entro il 01/10/2013		Entro il 31/12/2015		
	PRE	DEF	ES				
DATI DI AVANZAMENTO							

STANZIAMENTO PREVISTO €	8.000.000
-------------------------	-----------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
----------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

AEROPORTO G. B. PASTINE - CIAMPINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		REVISIONE NASTRI ARRIVI E PARTENZE				N° C.6/C.9
P.E.	da definire	P.M.	CLAUDIO PEDE	A.S.	da definire	
SCHEDA PROGETTO						
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)			Entro il 01/11/2012 Entro il 01/01/2013 Entro il 01/01/2014 Entro il 01/11/2015		Entro il 30/11/2012 Entro il 30/12/2013 Entro il 30/12/2014 Entro il 30/11/2015	
	PRE	DEF	ES			
DATI DI AVANZAMENTO						

STANZIAMENTO PREVISTO €	600.000
-------------------------	---------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
----------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

AEROPORTO G. B. PASTINE - CIAMPINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA:		RIQUALIFICA SERVIZI IGENICI				N° C.6/C.9
P.E.	da definire	P.M.	CLAUDIO PEDE	A.S.	da definire	
SCHEMA PROGETTO						
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)			Entro il 01/06/2011 Entro il 01/01/2013 Entro il 01/01/2014 Entro il 01/01/2015		Entro il 01/08/2011 Entro il 30/12/2013 Entro il 30/12/2014 Entro il 30/12/2015	Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4
	PRE	DEF	ES			
DATI DI AVANZAMENTO						

STANZIAMENTO PREVISTO €	400.000
-------------------------	---------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
----------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

AEROPORTO G. B. PASTINE - CIAMPINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

<i>OPERA:</i>		RIQUALIFICA VIABILITÀ ESTERNA				N° C.6/C.9	
P.E.	da definire	P.M.	CLAUDIO PEDE	A.S.	da definire		
SCHEDA PROGETTO							
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)			Entro il 01/05/2011 Entro il 01/10/2012		Entro il 30/05/2011 Entro il 30/12/2012		
	PRE	DEF	ES				
DATI DI AVANZAMENTO							

STANZIAMENTO PREVISTO €	300.000
-------------------------	---------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
----------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--
